

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 185/2023

PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REPRESA CLUBE DO POVO

ENDEREÇO: REPRESA CLUBE DO POVO

CONTRATADA: LD ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da represa Clube do Povo, no intuito de corroborar os valores apresentados no 6º (sexto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Em concordância com os serviços já executados e verificados no sexto Laudo de Medição referente ao objeto em questão, segue abaixo os serviços restantes:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 100% dos serviços relacionados a este grupo, concluindo totalmente este grupo de serviço.
- **Demolições:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo, como resultado, o total acumulado do grupo permanece em 99,74% já executado.
- **Calçadas externas:** No período referente a esta medição, foram executados 11,64% dos serviços relacionados a este grupo, referente à instalação de ladrilho hidráulico. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 71,55% já executado.
- **Calçadas internas:** Sem evolução.

- **Área de basquete:** No período referente a esta medição, foram executados 22,60% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao lastro de brita e ao suporte em tubo para tabela de basquete. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 30,45% já executado.
- **Quadra poliesportiva:** No período referente a esta medição, foram executados 8,06% dos serviços relacionados a este grupo, referente à locação de quadra, reatero com apiloamento mecânico, argila ou barro para aterro/reaterro e lastro de brita para piso. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 8,06% já executado.
- **Quadras de areia:** No período referente a esta medição, foram executados 9,56% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao lastro de pedra marroada e argila ou barro para aterro/reaterro. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 15,97% já executado.
- **Pista de skate:** Sem evolução.
- **Área de academia ao ar livre:** Sem evolução.
- **Pet place:** Sem evolução.
- **Playground:** Sem evolução.
- **Mobiliário urbano:** Sem evolução.
- **Área de contemplação (borda):** No período referente a esta medição, foram executados 15,56% dos serviços planejados, abrangendo a execução de piso em pedra portuguesa e argila ou barro para aterro/reaterro. Dessa forma, o total executado alcançou 59,73%.
- **Paisagismo:** Sem evolução.
- **Borda de CONTENÇÃO da Represa:** No período referente a esta medição, foram executados 4,26% dos serviços relacionados a este grupo, referente à pedra marroada forma de chapa compensado e concreto. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 8,49% já executado.

- **Iluminação:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo. Desta forma, o total executado deste grupo de serviço permanece em 68,28%.
- **Administração:** No período referente a esta medição, foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados, desta forma, o percentual medido foi de 6,3%. Assim, o acumulado total deste grupo de serviço, até o momento, é de 45,58%.
- **Diversos:** Sem evolução.

3. Relatório Fotográfico

Em anexo ao processo de medição, conferido pela fiscalização.

Imagem 01



Imagem 02

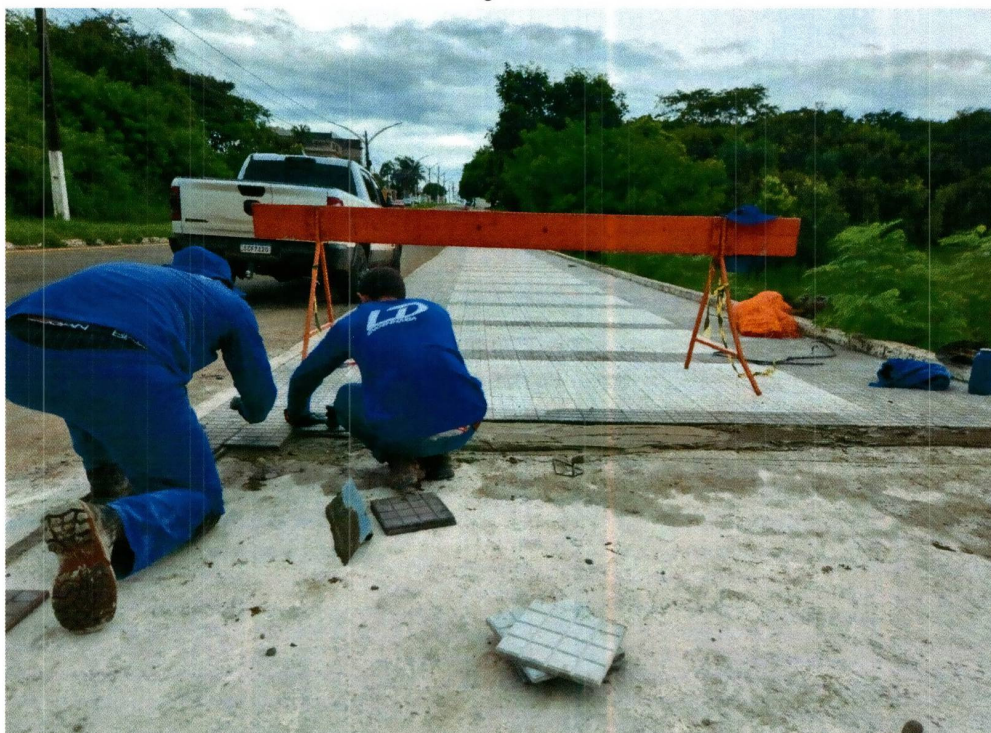


Imagem 03



Imagem 04



Imagem 05



Imagem 06



Imagem 07



Imagem 08



Imagem 09

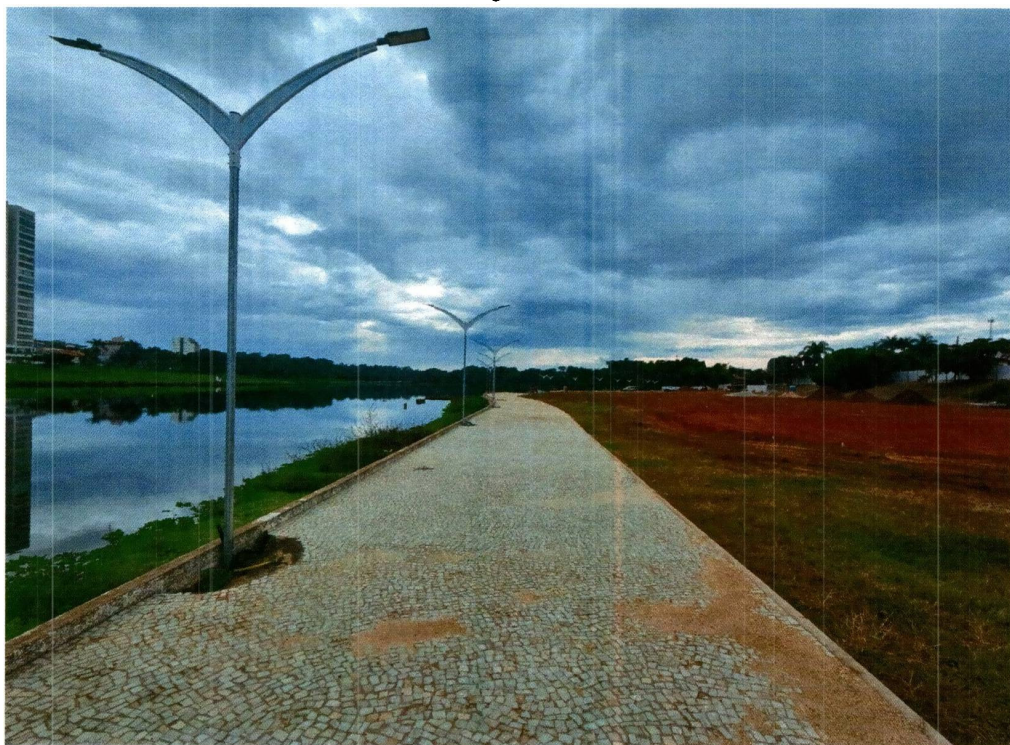


Imagem 10



Imagem 11



Imagem 12




Imagem 13



Imagem 14



Catalão, 03 de maio de 2024.



LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil
