
LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO Nº 141/2024

PROCESSO: Tomada de Preço nº 002/2022

OBJETO: Construção de Escola 6 Salas Padrão FNDE

ENDEREÇO: Ruas 01, nº 75 esquina com a rua 04 e rua 08. Bairro Flamboyant. CATALÃO/GO

CONTRATADA: Riviére Construtora e Incorporadora LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção da Escola 6 Salas Padrão FNDE no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 11º Boletim de Medição dos serviços realizados pela empresa contratada.

2. Laudo Técnico

2.1. Serviços Executados

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 11º Boletim de Medição analisado:

Serviços Preliminares: Fase concluída **100%**.

Movimento de Terra para Fundações: Fase concluída **100%**.

Fundações: Fase concluída **100%**.

Sistema de Vedação Vertical: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **91,8%** dos serviços de sistema de vedação vertical.

Superestrutura: Foram executados nesse período **97,1%** dos serviços relacionados a este grupo.

Esquadrias: Foram executados **4,9%** dos serviços relacionados a este grupo.



Sistema de Cobertura: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **5,3%** dos serviços de cobertura.

Impermeabilização: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **92,2%** dos serviços de impermeabilização.

Revestimento Interno e Externo: Foram executados **70,0%** dos serviços relacionados a este grupo.

Sistemas de Piso: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **18,1%** dos serviços de impermeabilização.

Serviços Complementares: Foram executados **44,8%** dos serviços relacionados a este grupo.

Instalações Elétricas e Telefônicas: Foram executados **24,8%** dos serviços relacionados a este grupo.

Serviços de proteção contra descargas elétricas: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **0,5%** dos serviços de impermeabilização.

Instalações de Gás Combustível: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Instalações Hidráulicas: Foram executados **4,5%** dos serviços relacionados a este grupo.

Instalações Sanitárias: Foram executados **67,7%** dos serviços relacionados a este grupo.

Louças acessórios e metais: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Sistema de Proteção Contra Incêndio: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Pintura e Acabamentos: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Serviços Complementares: Foram executados **44,8%** dos serviços relacionados a este grupo.

Serviços Finais: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Mensalista: Foram executados **8,0%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **51,90%**.

Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente ao 11º Boletim de Medição, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.

Relatório Fotográfico

Fotos 01 e 02: Delimitação do pátio central – baldrames, pilares e vigas superiores executados.






6

Fotos 03 e 04: Eletrodutos instalados.



Foto 05: Quadro instalado.

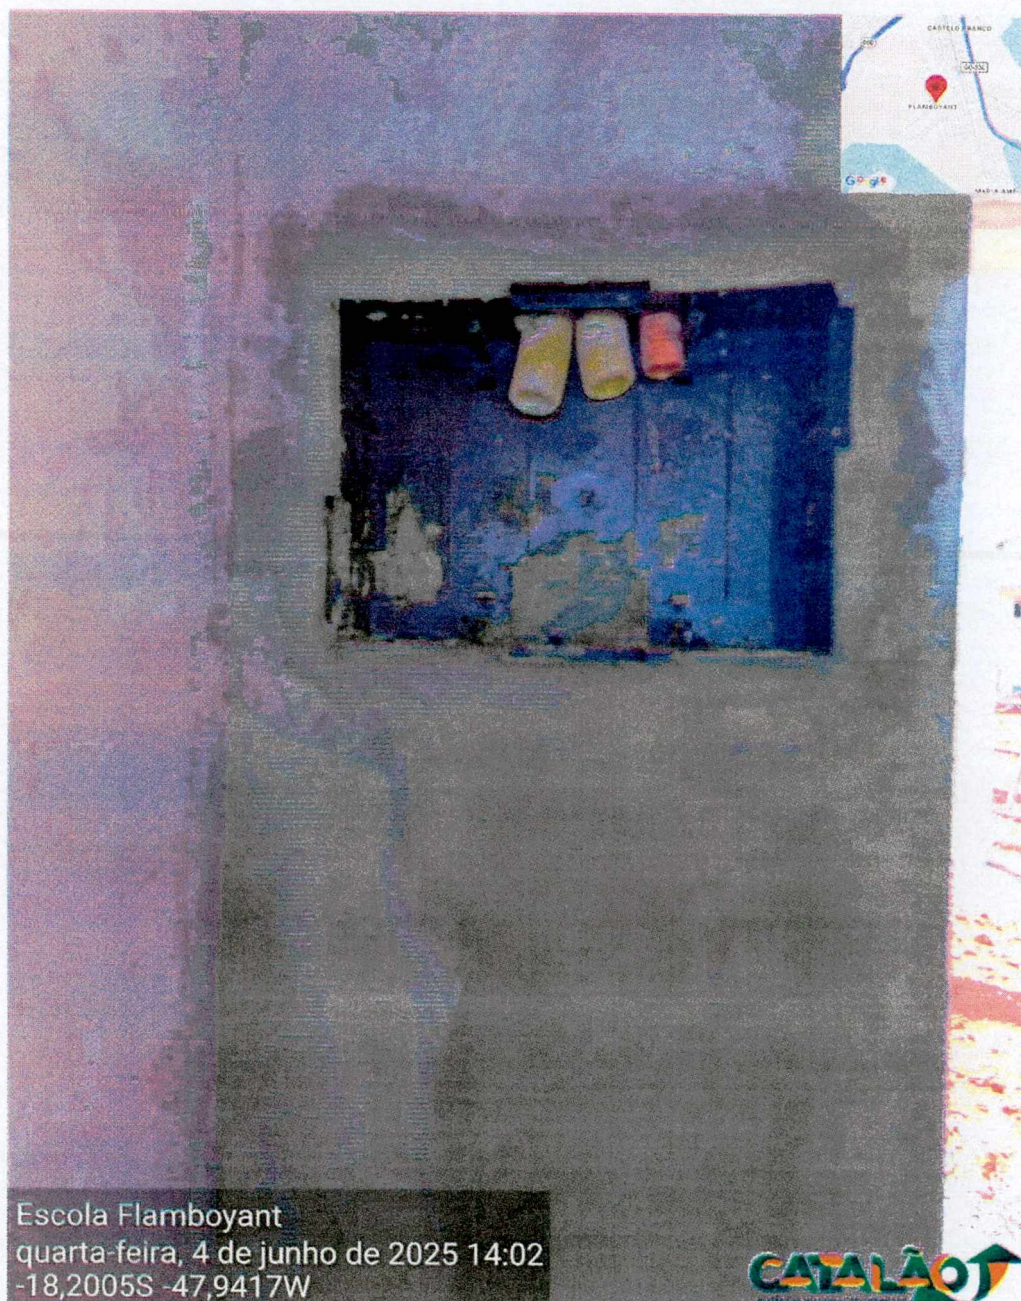



Escola Flamboyant
quarta-feira, 4 de junho de 2025 14:02
-18,2005S -47,9417W



6

Fotos 06, 07 e 08: Fossa séptica e sumidouros.

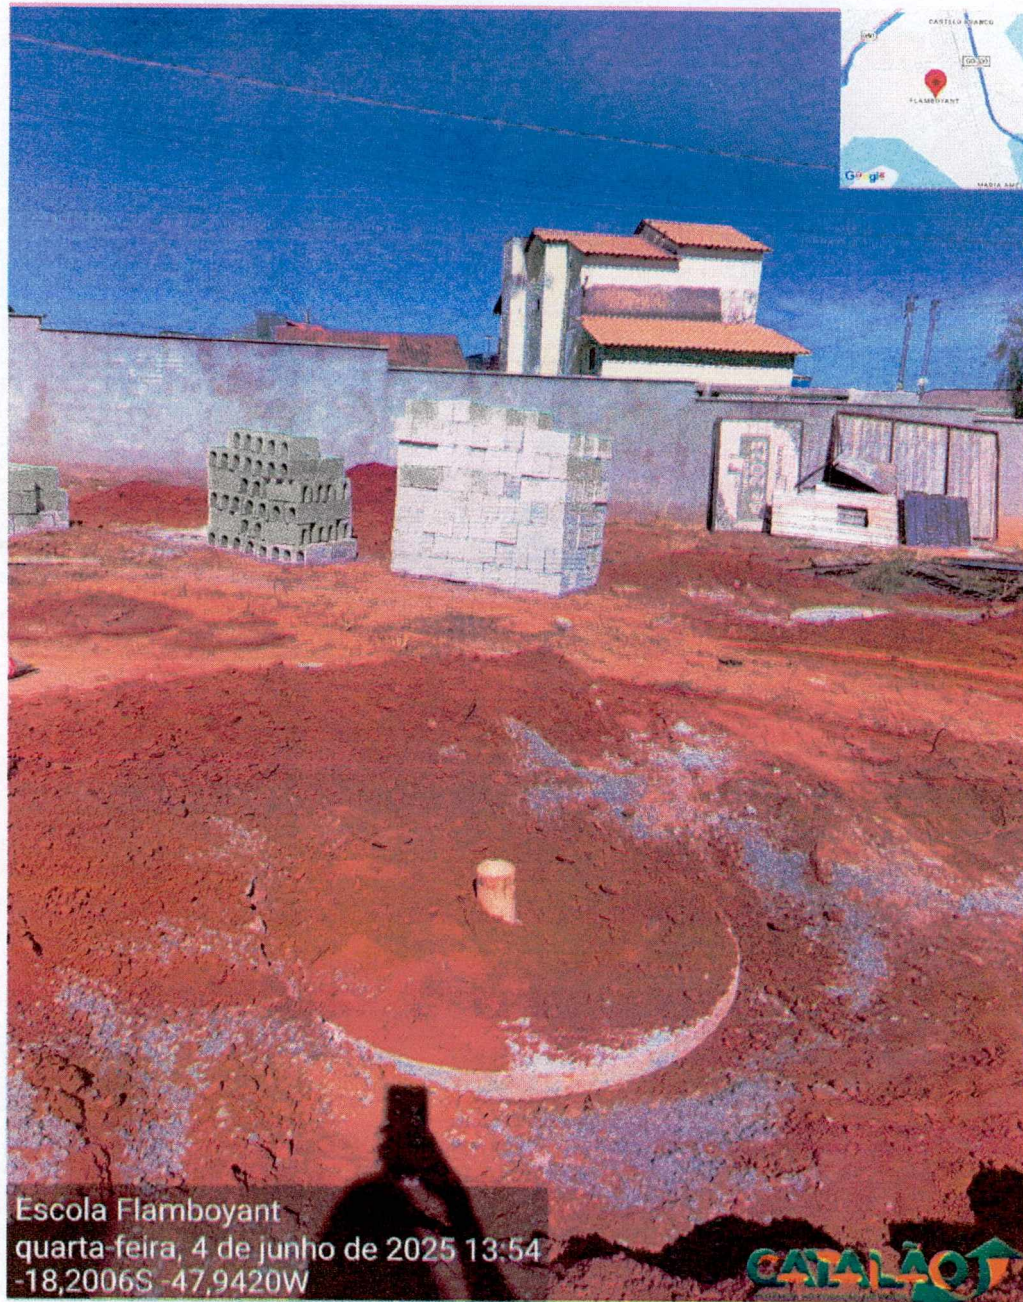

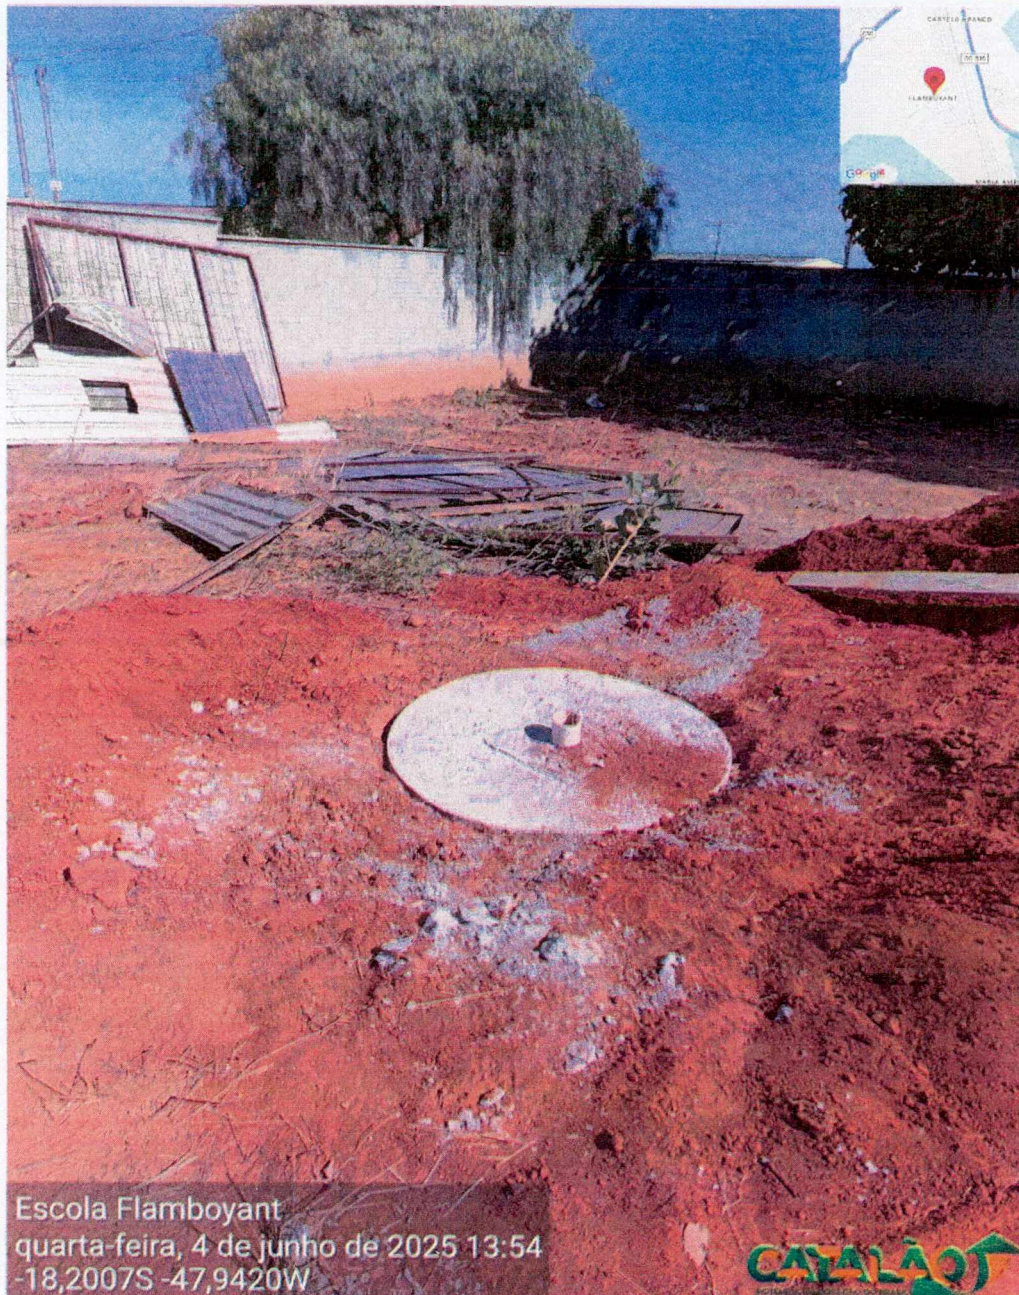



Beatriz Campos Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA: 1019920475D-GO
Secretaria de Obras

Beatriz C. Vasconcelos.

BEATRIZ CAMPOS VASCONCELOS

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 1019920475 D/GO
