
LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO N° 042/2022

PROCESSO: Tomada de Preço n° 002/2022

OBJETO: Construção de Escola 6 Salas Padrão FNDE

ENDEREÇO: Ruas 01, n° 75 esquina com a rua 04 e rua 08. Bairro Flamboyant. CATALÃO/GO

CONTRATADA: Riviére Construtora e Incorporadora LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção da Escola 6 Salas Padrão FNDE no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 15º Boletim de Medição dos serviços realizados pela empresa contratada.

2. Laudo Técnico

2.1. Serviços Executados

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 15º Boletim de Medição analisado:

Serviços Preliminares: Fase concluída **100%**.

Movimento de Terra para Fundações: Fase concluída **100%**.

Fundações: Fase concluída **100%**.

Sistema de Vedação Vertical: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **94,4%** dos serviços de sistema de vedação vertical.

Superestrutura: Fase concluída **100%**.



Esquadrias: Foram executados **8,0%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **12,5%**.

Sistema de Cobertura: Foram executados **17,0%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **99,5%**.

Impermeabilização: Fase concluída **100%**.

Revestimento Interno e Externo: Foram executados **7,0%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **83,8%**.

Sistemas de Piso: Foram executados **65,2%** dos serviços relacionados a este grupo.

Instalações Elétricas e Telefônicas: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **25,4%** dos serviços de revestimentos interno e externo.

Serviços de proteção contra descargas elétricas: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **0,5%** dos serviços de impermeabilização.

Instalações de Gás Combustível: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **8,2%** dos serviços de instalações de gás combustível.

Instalações Hidráulicas: Foram executados **100%** dos serviços relacionados a este grupo.

Instalações Sanitárias: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **96,5%** dos serviços de instalações de gás combustível.

Louças acessórios e metais: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Sistema de Proteção Contra Incêndio: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Pintura e Acabamentos: Foram executados **26,0%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **43,7%**.

Serviços Complementares: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **44,8%** de serviços complementares executados.

Serviços Finais: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.



Mensalista: Foram executados **6,0%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **76,9%**.

Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente ao 15º Boletim de Medição, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.

Relatório Fotográfico

Fotos 01, 02, 03 e 04: Revestimento do bloco de sala de aulas em andamento.



8




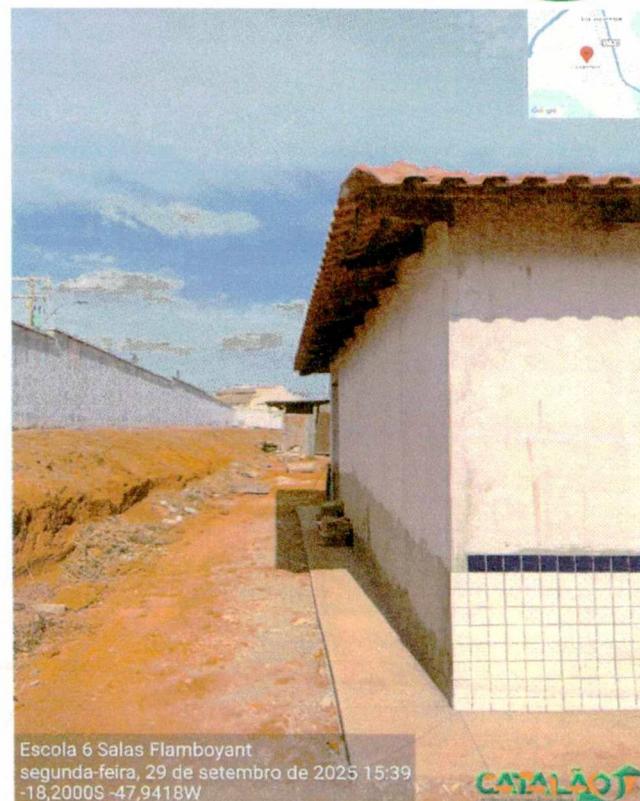




Foto 05: Telhamento praticamente finalizado.

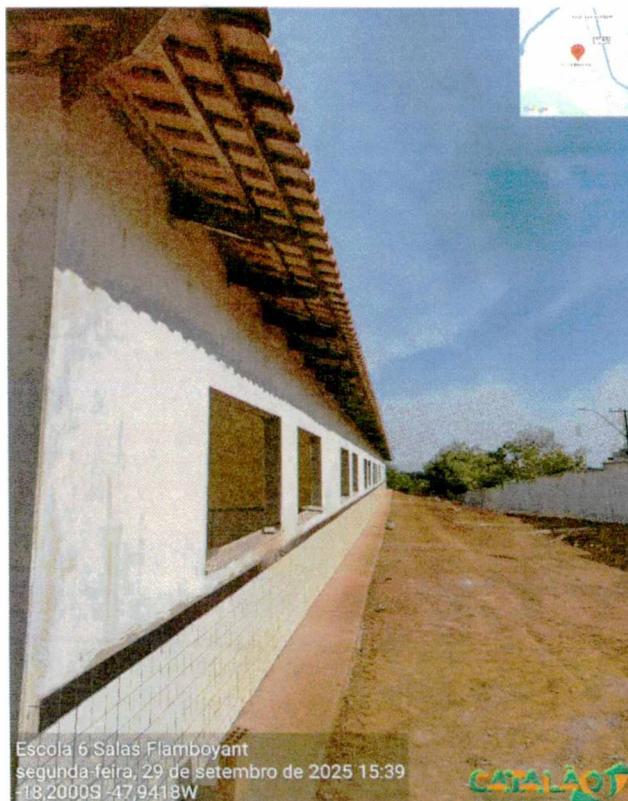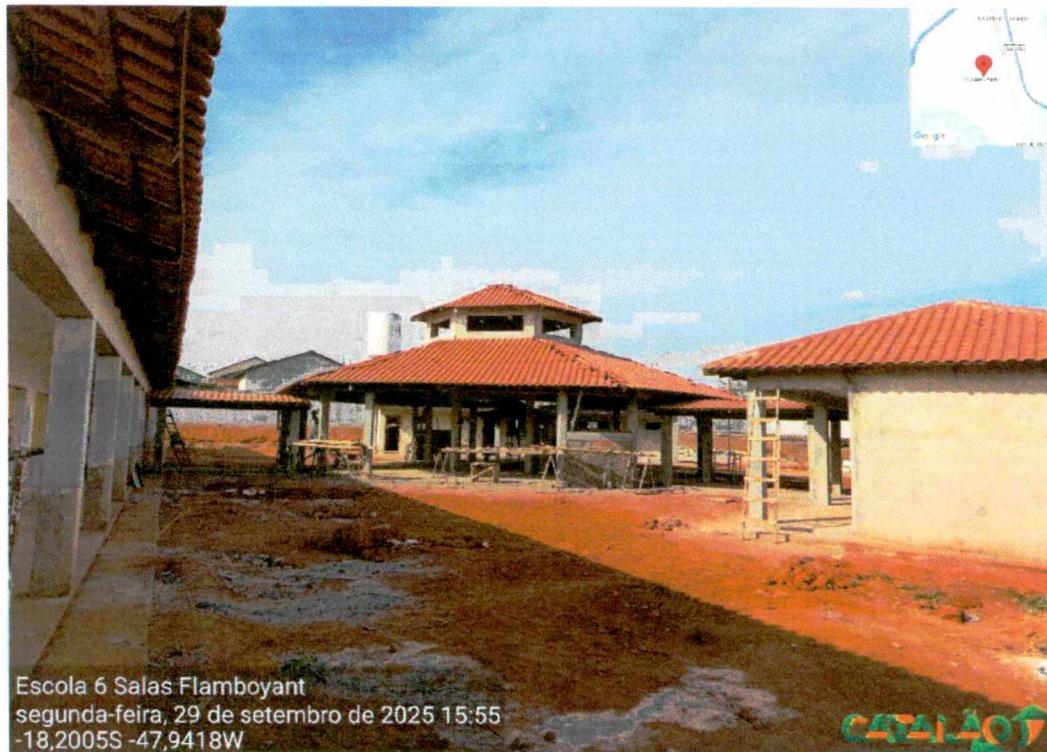


Fotos 06, 07 e 08: Peitoris instalados.

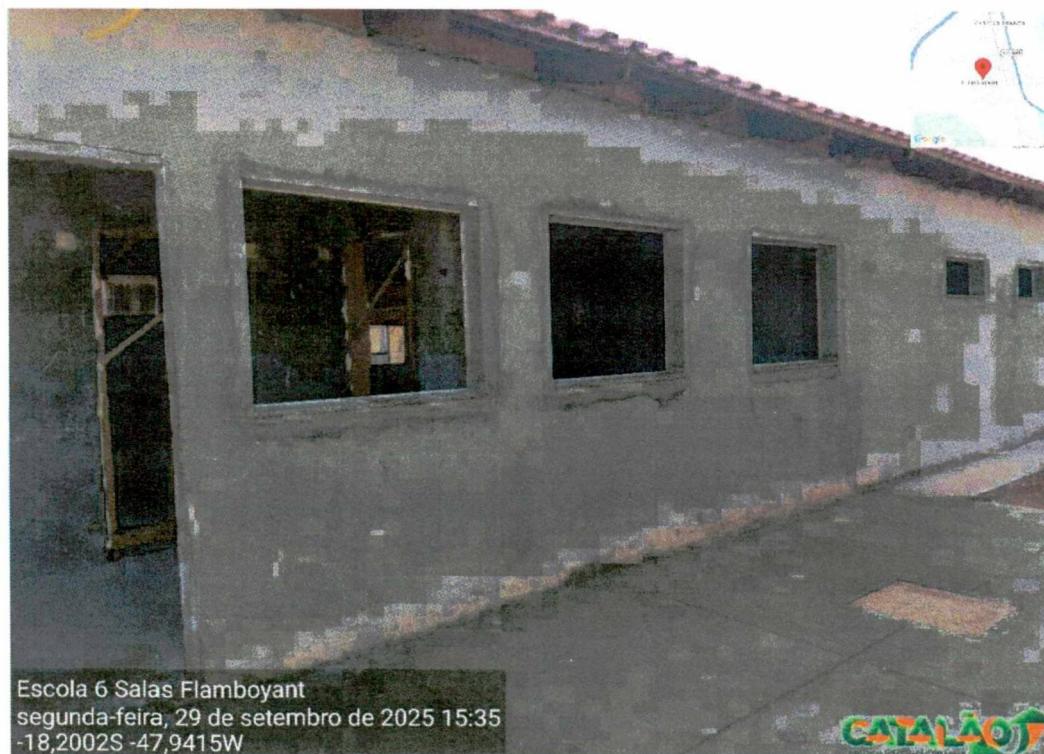

8

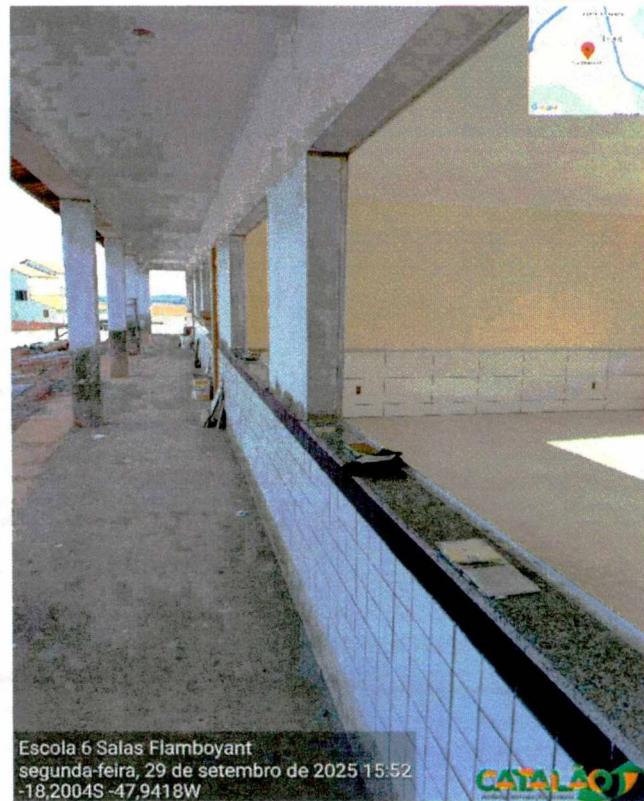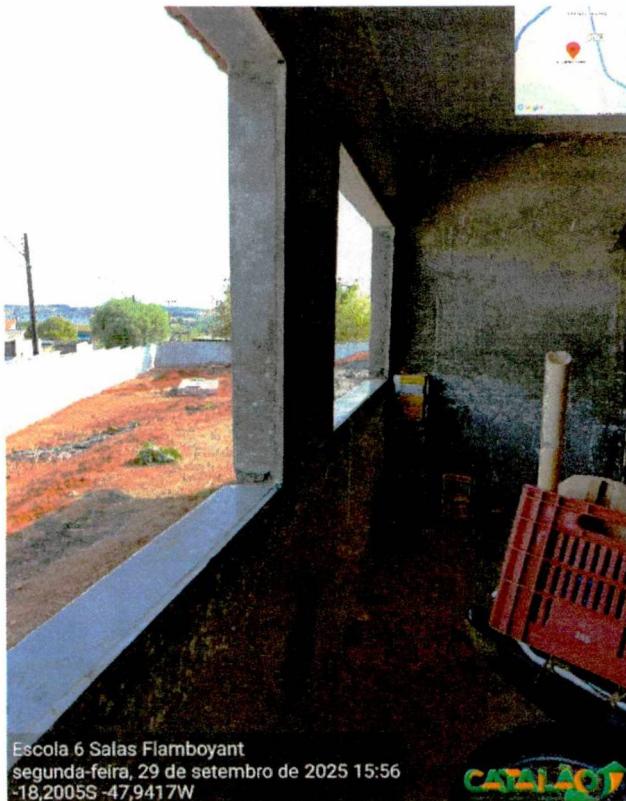

Fotos 09, 10, 11 e 12: Revestimento salas de aula.

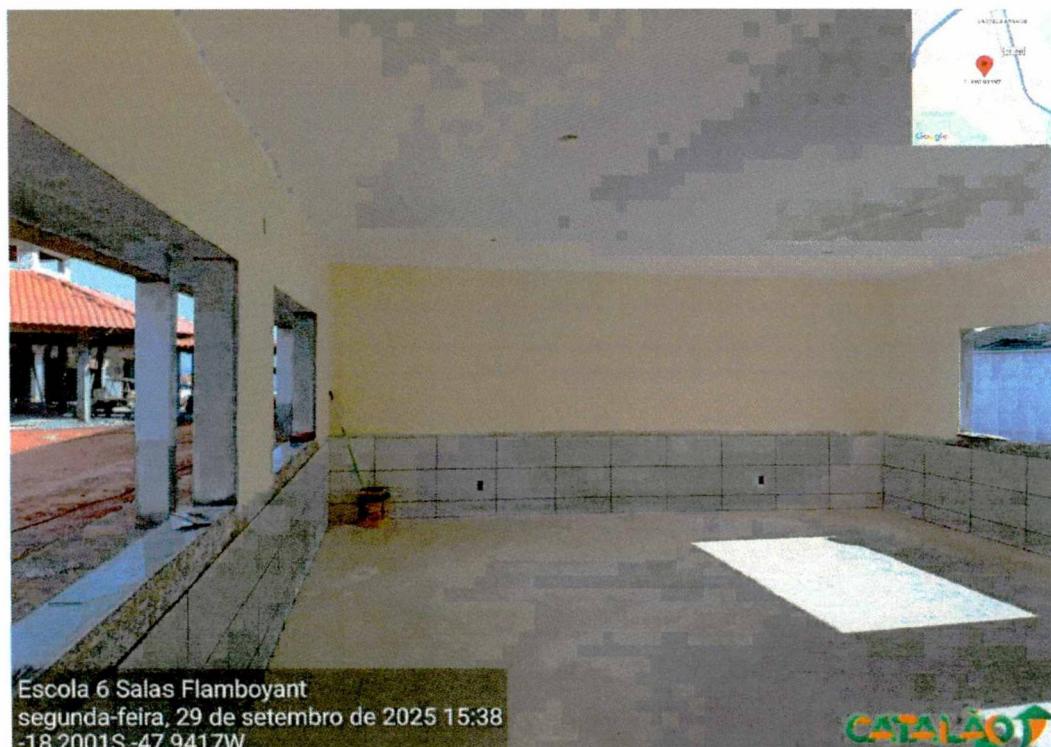



10



Beatriz Campos Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA: 1019920475D-GO
Secretaria de Obras

Beatriz L. Vasconcelos.

Beatriz Campos Vasconcelos

Engenheira Civil

CREA: 1019920475 D-GO

Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: ESCOLA FLAMBOYANT

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

MEDição: 15^a

CONTRATO DE EXECUÇÃO:

04/2022

CONTRATADA:

RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA

ORDEM DE SERVIÇO:

02/02/2025

PROCESSO LICITATÓRIO:

2022004161 - 002/2022

D. BASE PROPOSTA:

31/01/2025

ASS. CONTRATO:

31/01/2025

PRAZO DE VIGÊNCIA

31/12/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO:

31/12/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:

LUCAS VASCONCELOS DE LUCENA

Beatriz l. Vasconcelos
Beatriz Campos Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA: 1019920475D-GO
Secretaria de Obras
