

## LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO Nº 042/2022

**PROCESSO:** Tomada de Preço nº 002/2022

**OBJETO:** Construção de Escola 6 Salas Padrão FNDE

**ENDEREÇO:** Ruas 01, nº 75 esquina com a rua 04 e rua 08. Bairro Flamboyant. CATALÃO/GO

**CONTRATADA:** Riviére Construtora e Incorporadora LTDA

### 1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção da Escola 6 Salas Padrão FNDE no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 12º Boletim de Medição dos serviços realizados pela empresa contratada.

### 2. Laudo Técnico

#### 2.1. Serviços Executados

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 12º Boletim de Medição analisado:

**Serviços Preliminares:** Fase concluída **100%**.

**Movimento de Terra para Fundações:** Fase concluída **100%**.

**Fundações:** Fase concluída **100%**.

**Sistema de Vedação Vertical:** Foram executados **94,4%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Superestrutura:** Foram executados nesse período **100%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Esquadrias:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **4,9%** dos serviços de esquadrias.



**Sistema de Cobertura:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **5,3%** dos serviços de cobertura.

**Impermeabilização:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **92,2%** dos serviços de impermeabilização.

**Revestimento Interno e Externo:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **70,0%** dos serviços de revestimentos interno e externo.

**Sistemas de Piso:** Foram executados **65,2%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Instalações Elétricas e Telefônicas:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **24,8%** dos serviços de revestimentos interno e externo.

**Serviços de proteção contra descargas elétricas:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **0,5%** dos serviços de impermeabilização.

**Instalações de Gás Combustível:** Foram executados **8,2%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Instalações Hidráulicas:** Foram executados **95,8%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Instalações Sanitárias:** Foram executados **96,5%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Louças acessórios e metais:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Sistema de Proteção Contra Incêndio:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Pintura e Acabamentos:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Serviços Complementares:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **44,8%** de serviços complementares executados.

**Serviços Finais:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Mensalista:** Foram executados **8,0%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **59,90%**.



Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente ao 12º Boletim de Medição, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.




### Relatório Fotográfico

**Foto 01:** Delimitação do pátio central – baldrame, pilares e vigas superiores executados.







Fotos 02, 03, 04 e 05: Piso desempenado executado.

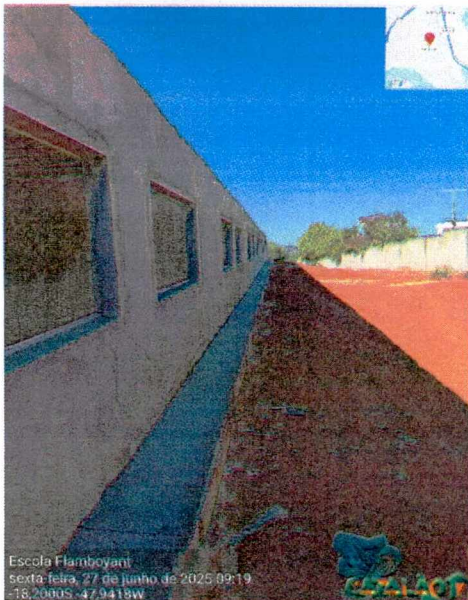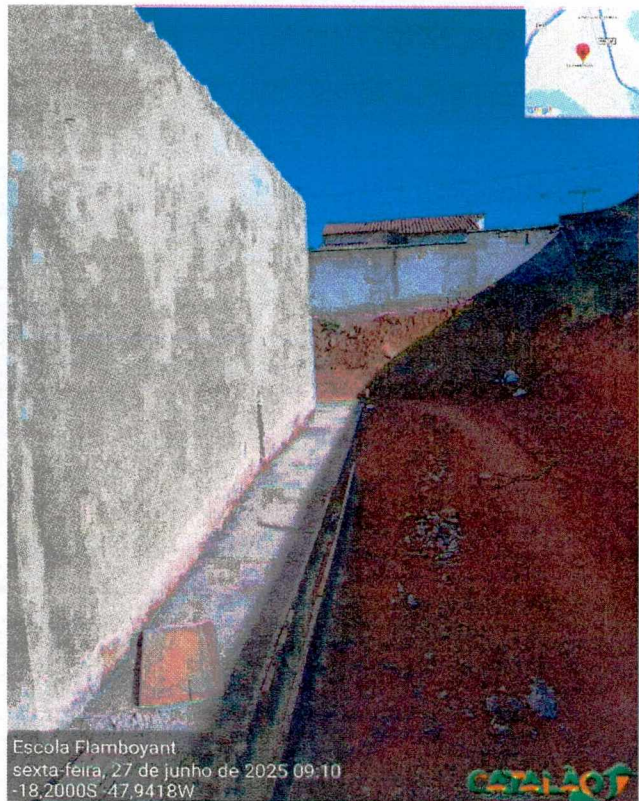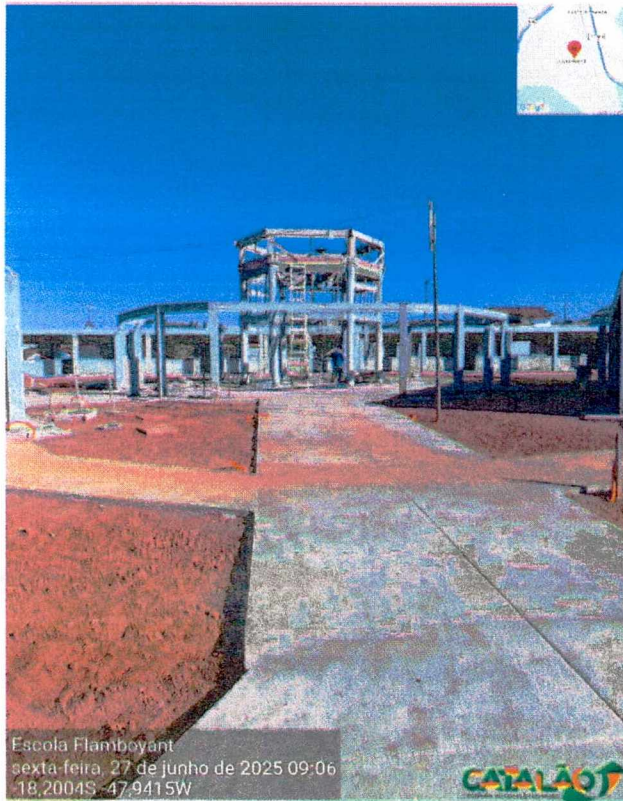

BP



Fotos 06 e 07: Levantamento da alvenaria da central de gás e instalação do reservatório.

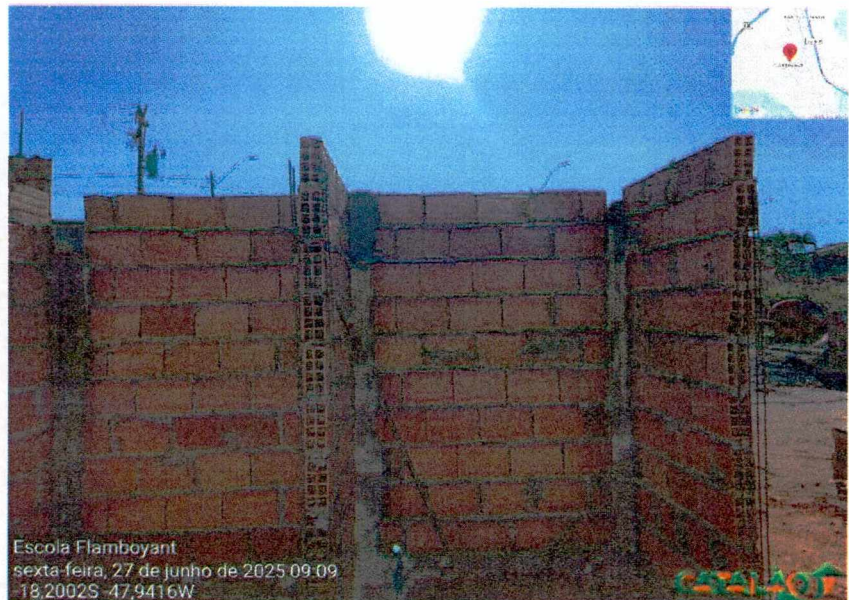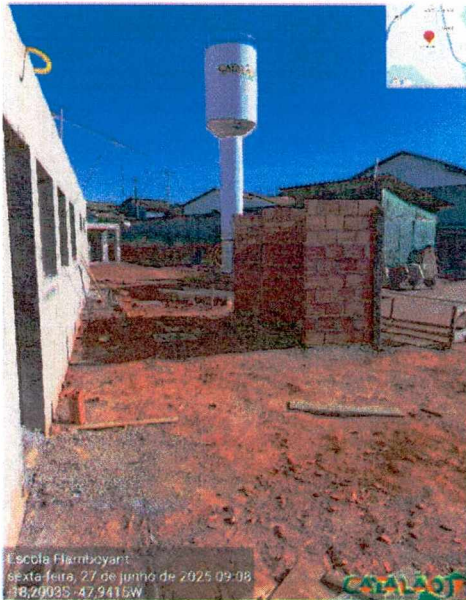

Fotos 08, 09, 10 e 11: Fossa séptica e sumidouros.



*(Assinatura)*





Escola Flamboyant  
sexta-feira, 27 de junho de 2025 09:21  
18,2007S -47,9420W



Escola Flamboyant  
sexta-feira, 27 de junho de 2025 09:20  
18,2006S -47,9420W

*Beatriz Campos Vasconcelos*  
Engenheira Civil  
CREA: 1019920475D-GO  
Secretaria de Obras

*Beatriz C. Vasconcelos.*

**BEATRIZ CAMPOS VASCONCELOS**

**ENGENHEIRA CIVIL**

**CREA: 1019920475 D/GO**
