

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO 089/2024

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MORRINHO DO SÃO JOÃO

ENDEREÇO: MORRINHO DO SÃO JOÃO

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA-ME

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização Do Morrinho do São João, localizado no Bairro Ipanema, no intuito de corroborar os valores apresentados no 2º (segundo) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 2º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 14,08% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange à raspagem e limpeza do terreno, demolição, caibro, tapume, tela plástica, locação de container e proporcionalmente os consumos de água e energia, chegando assim o grupo em um total de 82,73%.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, foram executados 7,21% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange o transporte de entulho em caçamba estacionária, chegando o grupo em um total de 67,32% já executado.
- **Serviços em terra:** No período referente a esta medição, foram executados 60,00% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao reaterro com apiloamento

mecânico e escavação manual de valas, chegando o grupo em um total de 79,74% já executado.

- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, não foram executados dos serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 34,43%
- Esquadrias metálicas: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Vidros: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Revestimento de paredes: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, foram executados 21,32% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange à execução de lastro de concreto e passeio de proteção em concreto desempenado. Diante do exposto, o total acumulado chega a 39,14% dos serviços previstos.
- Ferragens: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo
- Pintura: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo
- Diversos: No período referente a esta medição, foram executados 41,03% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange à execução de deck, balanço, plantio de grama e meio fio. Diante do exposto, o total acumulado chega a 46,52% dos serviços previstos.
- Administração – mensalistas: No período desta medição foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados. Desta forma, o percentual total medido é de 22,70% chegando a um acumulado de 40,10%.

Diante do exposto, encontra-se uma evolução de 24,62% da obra.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1

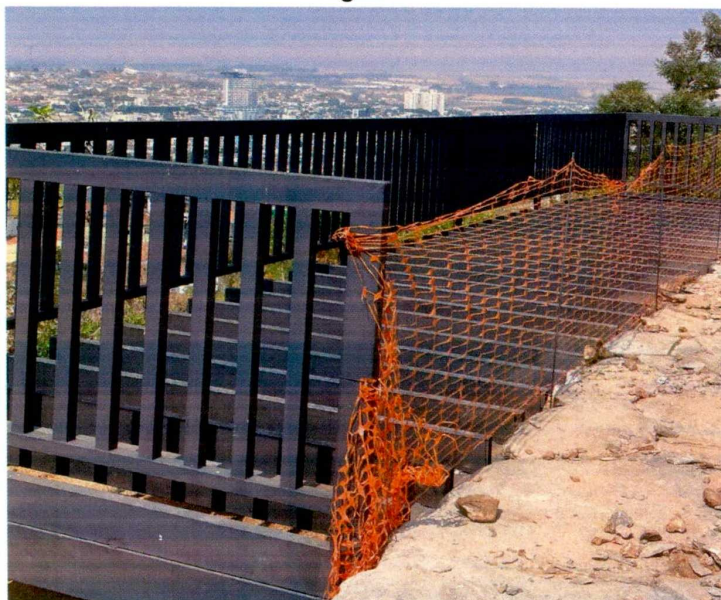


Figura 2

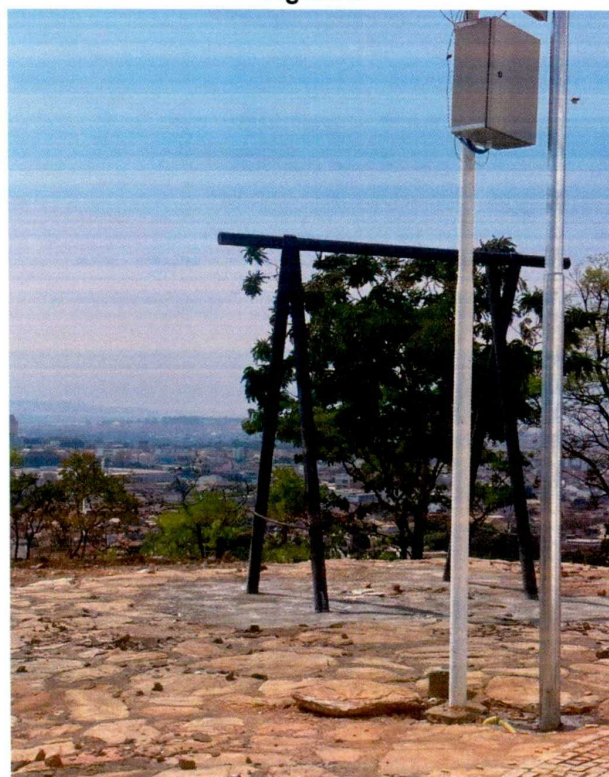


Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6




Figura 7



Figura 8



Figura 9

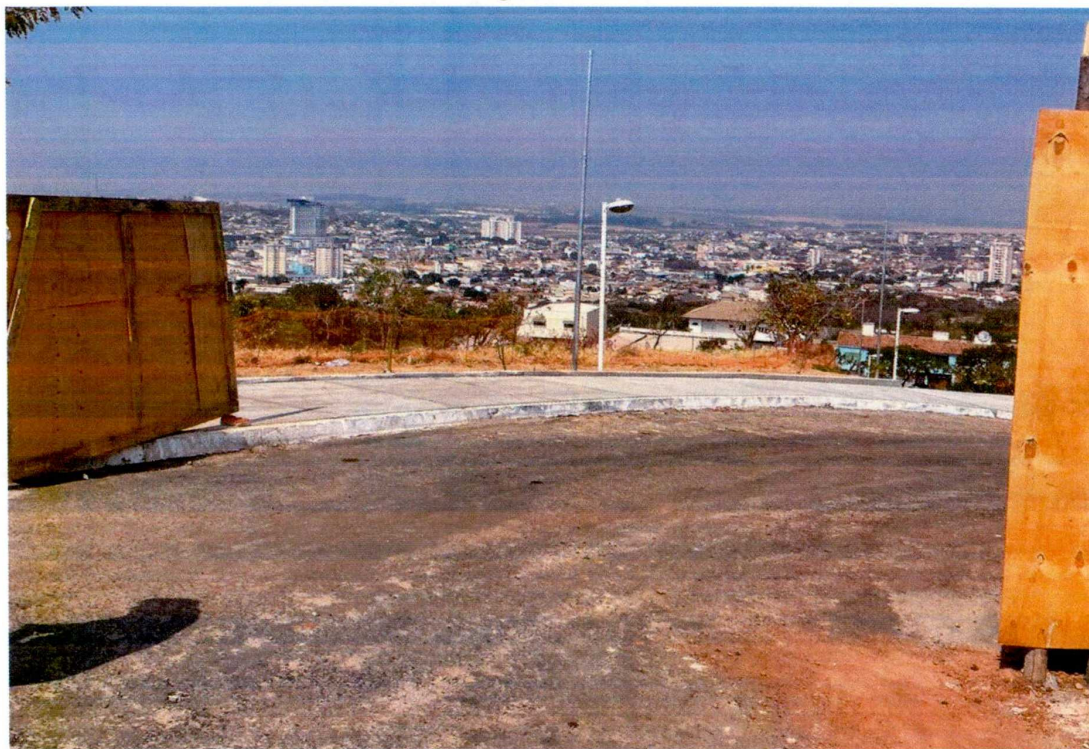

Catalão, 09 de setembro de 2024.

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil
