

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 060/2024

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 009/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA HOSPITALAR

ENDEREÇO: RUA ISRAEL DE ALMEIDA, S/N, QUADRA ÚNICA INSTITUCIONAL (AO LADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA), SETOR SANTA RITA, CATALÃO-GO.

CONTRATADA: TL ENGENHARIA E PROJETO EIRELI

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a construção da Lavanderia Hospitalar, localizada no município de Catalão, no intuito de corroborar os valores apresentados no 5º (quinto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 5º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** Durante o período de medição em questão, foi constatada a execução de 0,38% dos serviços pertencentes a este grupo. As atividades realizadas incluem os consumos proporcionais de água e energia. Desta forma, o total acumulado para este grupo de serviço chega a 100,00%.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, verificou-se a execução de 12,42% dos serviços programados, os quais compreendem o transporte recorrente de entulho por caçamba estacionária. Desta forma, este grupo de serviço chega a um total acumulado de 100,00%.
- **Serviços em terra:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Fundações e Sondagem:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Estrutura:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.

- **Instalações elétricas:** Durante o período de referência desta medição, não foram realizados serviços associados a este conjunto, desta forma, o total acumulado continua de 30,05%.
- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição, foram executados 2,57% dos serviços previstos para este grupo de serviços, desta forma, o total acumulado é de 21,38%.
- **Alvenaria e divisórias:** Durante o período de abrangência da medição, não foram constatados evolução na execução dos serviços previstos, com isso, o total acumulado permanece em 75,56%.
- **Impermeabilização:** Durante o período de abrangência da medição, foram constatados evolução de 32,53% na execução dos serviços previstos, sendo ele impermeabilização-rebaixo banheiro, com isso, o total acumulado chega em 100,00%.
- **Estrutura de madeira:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Coberturas:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Vidros:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Revestimento de parede:** Durante o período abarcado por esta medição, foram realizados 22,22% dos serviços associados a este conjunto, abrangendo a aplicação do reboco e revestimento com cerâmica. Desta forma, o total acumulado chega a 100,00%.
- **Forros:** No período referente a esta medição, foram iniciados e finalizado todo esse serviço de forro, tendo os itens forro de gesso e tabica para forro de gesso totalmente feitos nesta medição.
- **Revestimento de piso:** No período referente a esta medição, foram executados 33,18% dos serviços relacionados para este grupo, sendo eles, cerâmica antiderrapante, rodapé de cerâmica e piso em concreto. Com isso, o total acumulado chega a 99,07%.
- **Ferragens:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.

- **Administração - mensalistas:** No período referente a esta medição, foram constatados 16,50% de serviços executados, sendo ele referente a pagamento de mestre de obra e engenheiro. Com isso, o total acumulado chega a 91,00%.
- **Pintura:** No período referente a esta medição, não foram executados os serviços deste item, permanecendo assim 69,83%.
- **Diversos:** No período referente a esta medição, foram executados 1,76% serviços para este grupo, sendo este suporte para bancada. Desta forma, o total acumulado para este grupo de serviço totaliza 63,20%.

Diante do exposto, encontra-se uma evolução de 5,50% da obra, chegando a um total executado de 69,26%.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 2

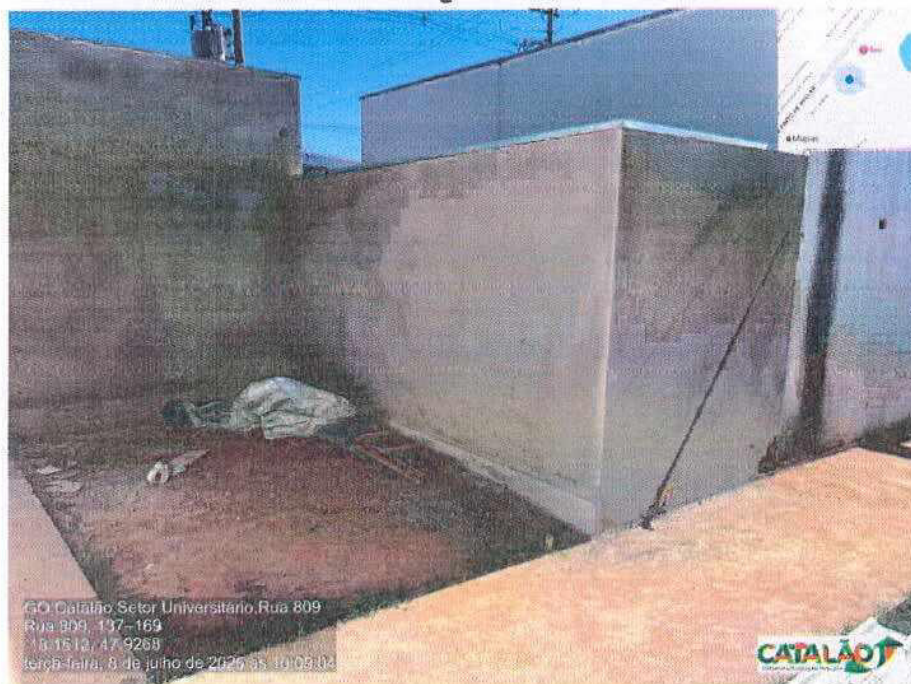


Figura 3



Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 4


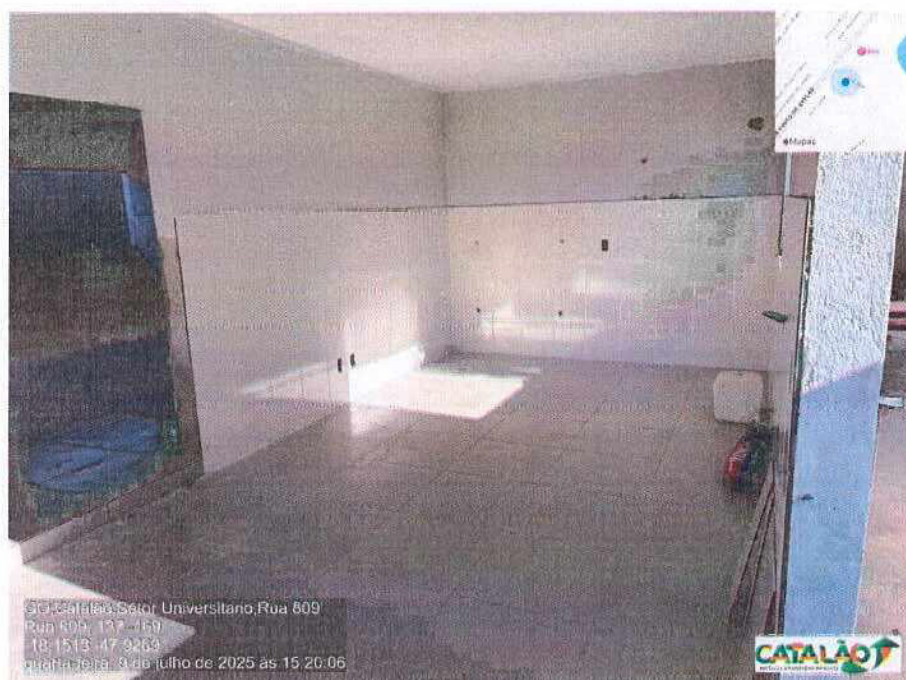


Figura 5

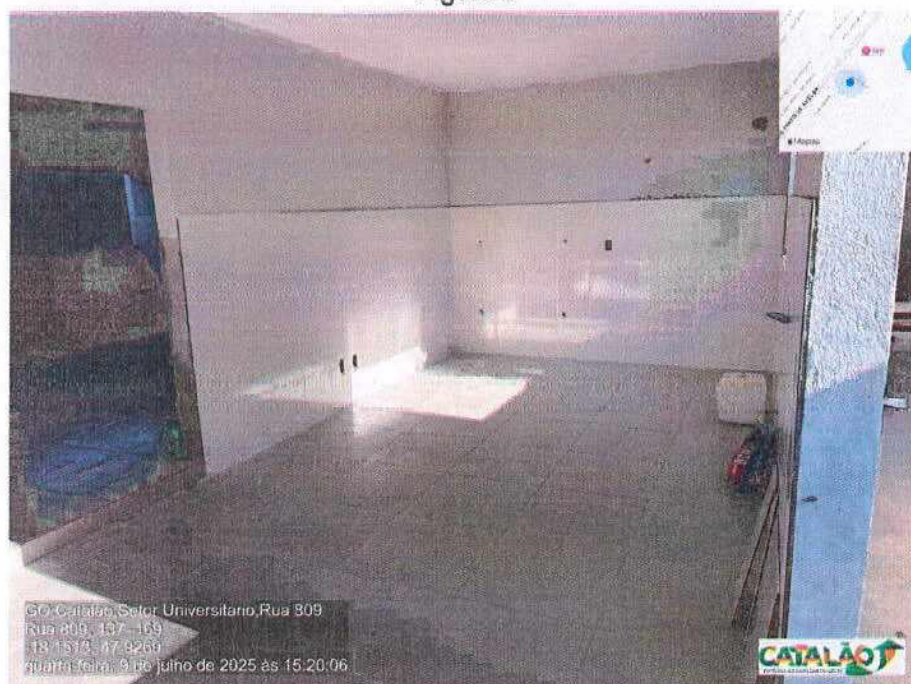

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 6



Figura 7



Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 8



Catalão (GO), 10 de julho de 2025.


Leandro Damas de Oliveira
Diretor
Secretaria Municipal de Obras
