

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 185/2023

PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REPRESA CLUBE DO POVO

ENDEREÇO: REPRESA CLUBE DO POVO

CONTRATADA: LD ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da represa Clube do Povo, no intuito de corroborar os valores apresentados no 5º (quinto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Em concordância com os serviços já executados e verificados no quinto Laudo de Medição referente ao objeto em questão, segue abaixo os serviços restantes:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 0,51% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao tapume para sinalização. Como resultado, o total acumulado do grupo atingiu 100,00% já executado.
- **Demolições:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo, Como resultado, o total acumulado do grupo permanece em 99,74% já executado.
- **Calçadas externas:** No período referente a esta medição, foram executados 21,41% dos serviços relacionados a este grupo, referente à instalação de ladrilho hidráulico. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 59,91% já executado.
- **Calçadas internas:** Sem evolução.

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

- **Área de basquete:** No período referente a esta medição, foram executados 7,85% dos serviços relacionados a este grupo, referente à locação de quadra, reaterro com apiloamento mecânico e argila para aterro. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 7,85% já executado.
- **Quadra poliesportiva:** Sem evolução.
- **Quadras de areia:** No período referente a esta medição, foram executados serviços relacionados a este grupo, referente à locação de quadra e escavação manual de valas. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 6,41% já executado.
- **Pista de skate:** Sem evolução.
- **Área de academia ao ar livre:** Sem evolução.
- **Pet place:** Sem evolução.
- **Playground:** Sem evolução.
- **Mobiliário urbano:** Sem evolução.
- **Área de contemplação (borda):** No período referente a esta medição, foram executados 11,51% dos serviços planejados, abrangendo a execução de piso em pedra portuguesa. Dessa forma, o total executado alcançou 44,16%.
- **Paisagismo:** Sem evolução.
- **Borda de Contenção da Represa:** Não foram identificados serviços neste período de medição, desta forma, permanece o acumulado executado de 4,22% dos serviços previstos.
- **Iluminação:** No período referente a esta medição, foram executados 23,47% dos serviços, podendo ser relacionado a instalação de eletrodutos, cabos, caixas de passagem, suportes para iluminação pública, luminárias de LED e relé fotoelétrico. Desta forma, o total executado deste grupo de serviço chega a 68,28%.

- **Administração:** No período referente a esta medição, foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados, desta forma, o percentual medido foi de 9,85%. Assim, o acumulado total deste grupo de serviço, até o momento, é de 39,28%.

- **Diversos:** Sem evolução.

3. Relatório Fotográfico

Em anexo ao processo de medição, conferido pela fiscalização.

Imagem 01




Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Imagem 02


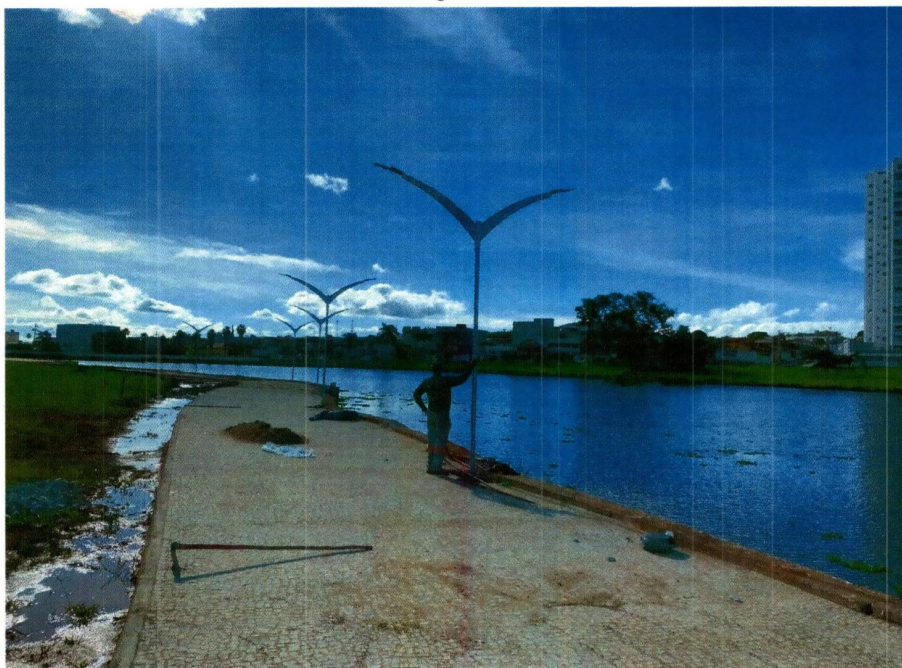


Imagem 03

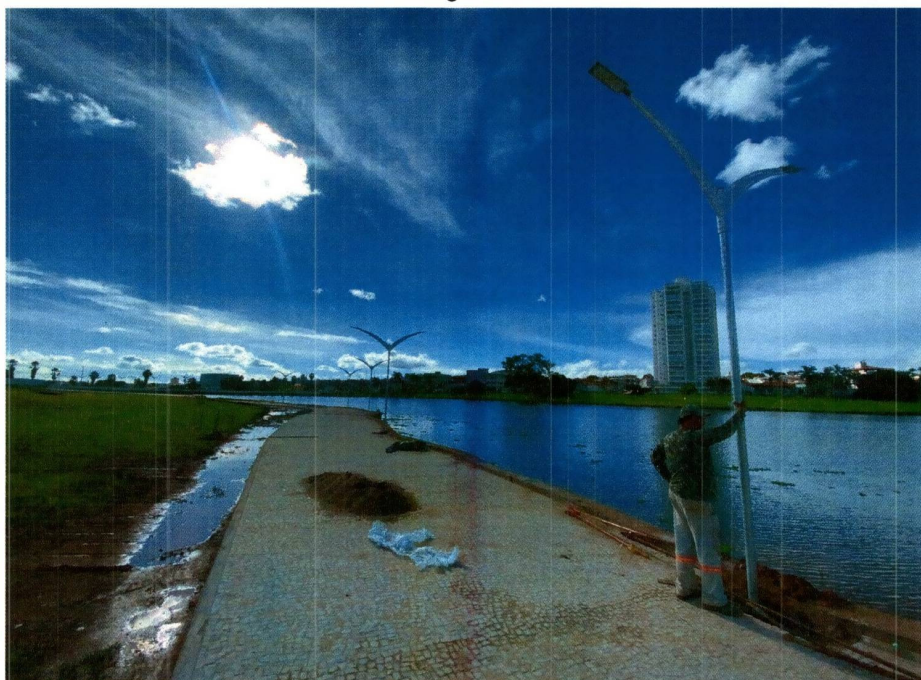

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Imagem 04

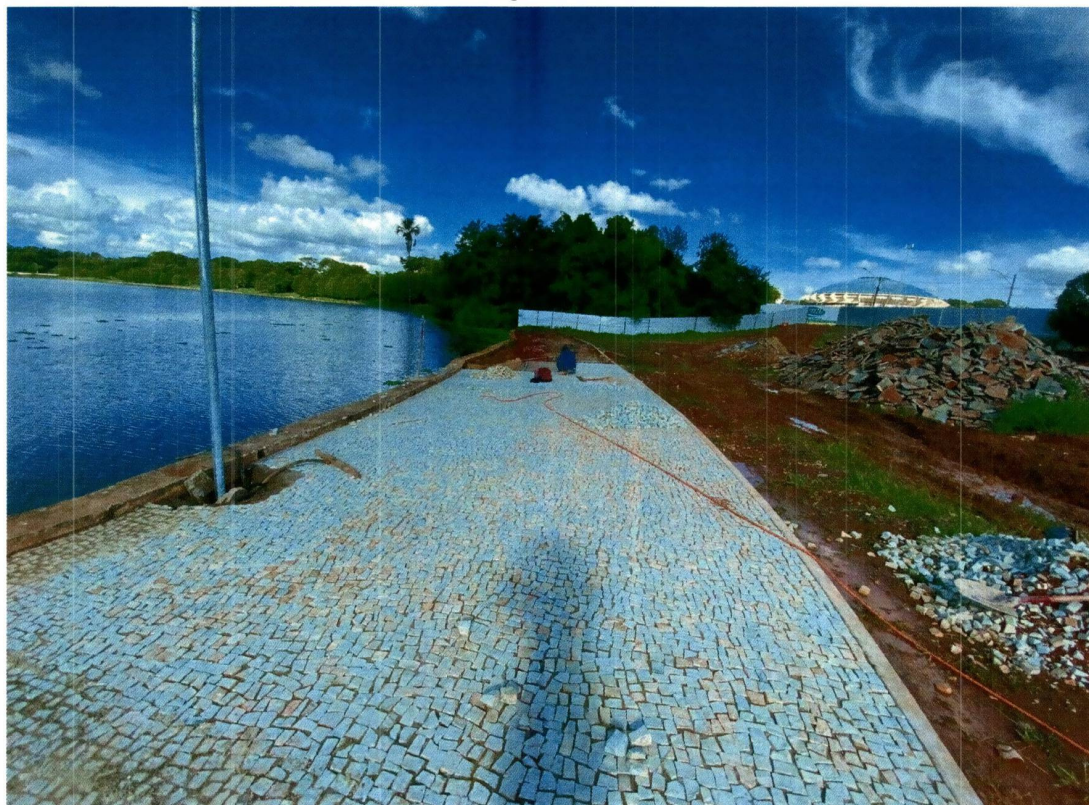


Imagem 05




Imagem 06



Imagem 07



Catalão, 04 de abril de 2024.


LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil
