

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 100/2025

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025

OBJETO: READEQUAÇÃO DA RUA SABINO P. SILVA.

ENDEREÇO: RUA SABINO PEREIRA DA SILVA, ENTRE A AVENIDA JOÃO XXIII E RUA ELIAS DEMOCH, CENTRO, MUNICÍPIO DE CATALÃO.

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA.

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a READEQUAÇÃO DA RUA SABINO P. DA SILVA, (antiga Rua do Lazer), no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 6º (sexto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 6º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição de serviços, foi constatada uma evolução de 9,44% dos serviços integrantes do grupo, sendo possível verificar a locação de contêiner, bem como os consumos proporcionais de água e energia elétrica. Dessa forma, corroborando medições anteriores, o total acumulado atinge 100,00%.
- **Transporte:** No período correspondente a esta medição, foi evidenciado uma evolução de 11,88% referente aos serviços contemplados neste grupo, destacando o transporte de entulho em caçamba estacionária e a desmobilização de container. Assim, considerando-se as medições anteriores, o total acumulado atinge 80,04%.
- **Revestimento de piso:** No período abrangido por esta medição, verificou-se a execução de 1,30% dos serviços previstos, destacando o término de instalação do pavimento em concreto tipo concregrama. Com isso, o total acumulado atinge 98,29%.
- **Instalações elétricas:** No período contemplado por esta medição, registrou-se uma evolução de 48,20%, correspondente à instalação do postes e luminárias centrais, caixa de passagem com tampa, refletores, cabos, disjuntores e mais acessórios para correta instalação elétrica, chegando assim, a um total acumulado de 100,00%.

- **Instalações hidrossanitárias:** No período contemplado por esta medição, foi identificado a execução de 20,89% dos serviços previstos, sendo evidenciado a instalação das torneiras e utilização dos joelhos, chegando a um total acumulado de 100,00%.
- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição foram identificados 20,56% dos serviços previstos, no que tange a instalação das grades de proteção, chegando a um total acumulado de 98,33%.
- **Pintura:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes a esse grupo de serviço.
- **Diversos:** No período referente a esta medição foram identificados 25,21% dos serviços previstos para este grupo de serviço, sendo constatado o término de execução das mesas e bancos, plantio de grama e arvores e término do pórtico de entrada, chegando a um total acumulado de 88,43%.
- **Administração Local:** No período abrangido por esta medição, identificou-se a execução de 13,36% dos serviços vinculados à administração da obra, resultando em um total acumulado de 86,20%.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1

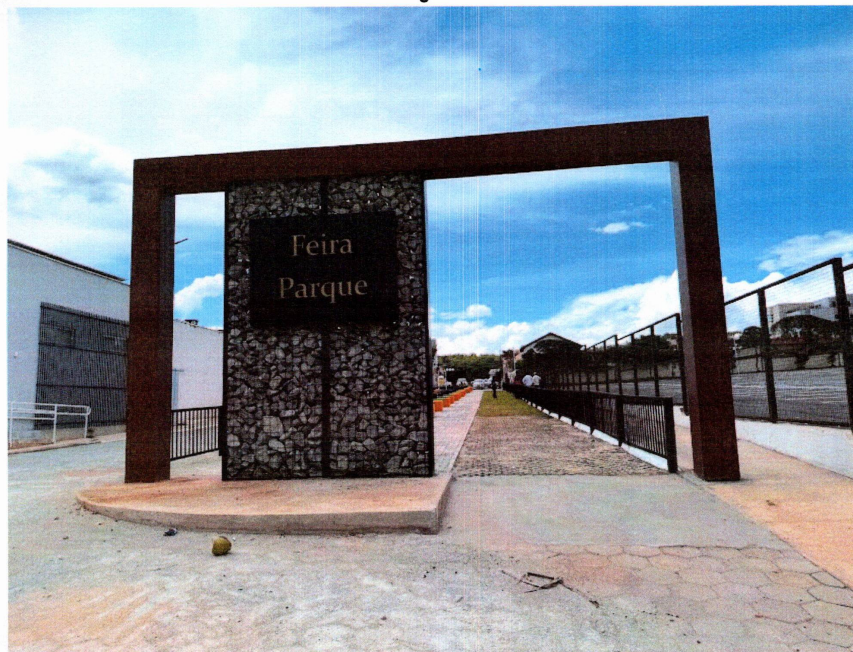


Figura 2



Figura 3



Figura 4

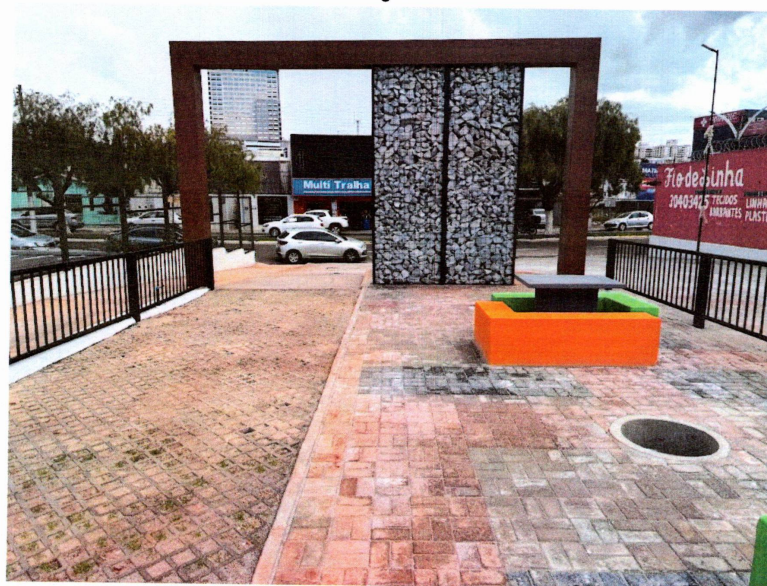


Figura 5



Figura 6



Catalão (GO), 02 de dezembro de 2025.

Leandro Damas de Oliveira
Diretor de Obras
Secretaria Municipal de Obras
