

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO 089/2024

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MORRINHO DO SÃO JOÃO

ENDEREÇO: MORRINHO DO SÃO JOÃO

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA-ME

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização Do Morrinho do São João, localizado no Bairro Ipanema, no intuito de corroborar os valores apresentados no 3º (terceiro) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 3º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 11,88% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange à raspagem e limpeza do terreno, demolição, caibro, tapume, tela plástica, locação de container e proporcionalmente os consumos de água e energia, chegando assim o grupo em um total de 94,61%.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, foram executados 22,83% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange o transporte de entulho em caçamba estacionária, chegando o grupo em um total de 90,15% já executado.
- **Serviços em terra:** No período referente a esta medição, foram executados 20,26% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao reaterro com apiloamento

mecânico e escavação manual de valas, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.

- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, foram executados 28,43% dos serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 62,86%
- Esquadrias metálicas: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Vidros: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Revestimento de paredes: No período referente a esta medição, foram executados 50,00% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange à pastilha porcelana. Diante do exposto, o total acumulado chega a 50,00% dos serviços previstos.
- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, foram executados 60,85% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange à execução de lastro de concreto, recomposição de pavimento em pedras poliédricas e execução de pavimento em pedras poliédricas. Diante do exposto, o total acumulado chega a 100,00% dos serviços previstos.
- Ferragens: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo
- Pintura: No período referente a esta medição, foram executados 49,28% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange à execução de pintura látex acrílicos, pintura poliesportiva, pintura com tinta esmalte para esquadrias de ferro, pintura PVA látex e o aluguel mensal de andaime metálico. Diante do exposto, o total acumulado chega a 49,28% dos serviços previstos.
- Diversos: No período referente a esta medição, foram executados 25,71% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange à execução de deck, preparação com adubação do terreno em forma de canteiro e plantio de forração, mudas de arbusto floríferos, mudas de árvore ornamental, mudas de arbusto de folhagem, abertura de cavas e placa de entrada. Diante do exposto, o total acumulado chega a 72,23% dos serviços previstos.

- Administração – mensalistas: No período desta medição foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados. Desta forma, o percentual total medido é de 28,92% chegando a um acumulado de 69,02%.

Diante do exposto, encontra-se uma evolução de 29,02% da obra.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1

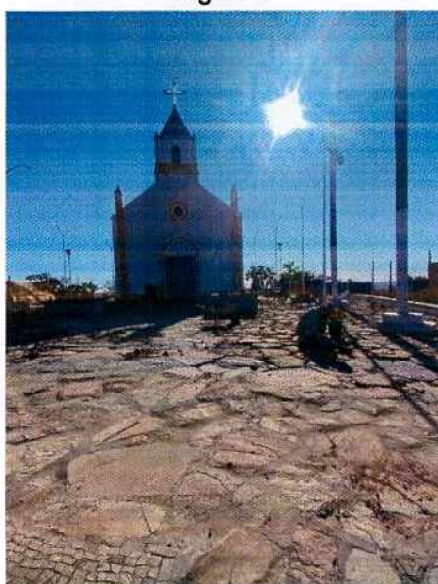


Figura 2



Figura 3



Figura 4

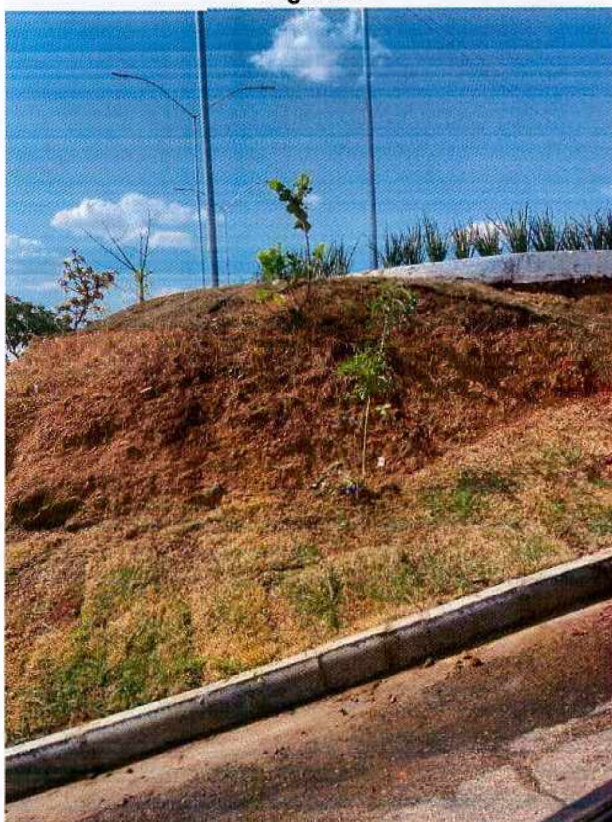


Figura 5

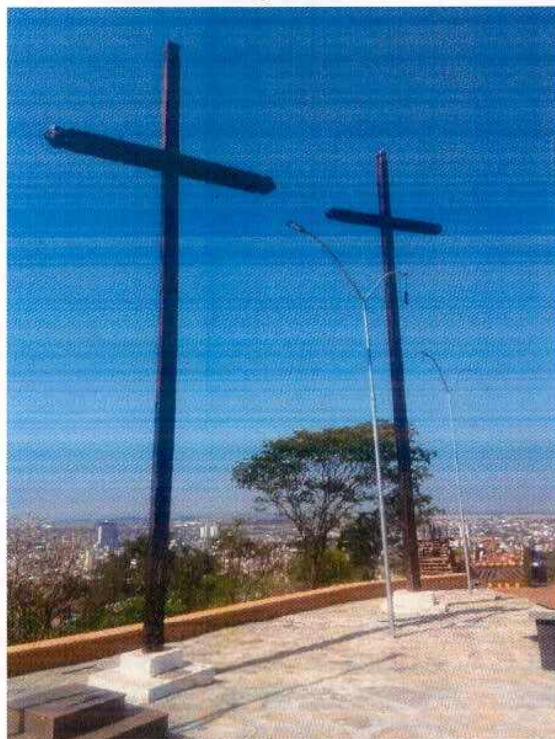


Figura 6



Figura 7



Figura 8



Catalão, 10 de outubro de 2024.



LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil
