

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 060/2024

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 009/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA HOSPITALAR

ENDEREÇO: RUA ISRAEL DE ALMEIDA, S/N, QUADRA ÚNICA INSTITUCIONAL (AO LADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA), SETOR SANTA RITA, CATALÃO-GO.

CONTRATADA: TL ENGENHARIA E PROJETO EIRELI

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a construção da Lavanderia Hospitalar, localizada no município de Catalão, no intuito de corroborar os valores apresentados no 6º (sexto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 6º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Transporte:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos
- **Serviços em terra:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Fundações e Sondagem:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Estrutura:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Instalações elétricas:** Durante o período de referência desta medição, foram realizados 29,40% dos serviços associados a este conjunto, desta forma, o total acumulado continua de 59,45%.

- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição, foram executados 16,75% dos serviços previstos para este grupo de serviços, desta forma, o total acumulado é de 21,38%.
- **Alvenaria e divisórias:** Durante o período de abrangência da medição, foram constatados evolução de 24,44% na execução dos serviços previstos, sendo ele divisória de granito polido, com isso, o total acumulado chega em 100,00%.
- **Impermeabilização:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Estrutura de madeira:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Coberturas:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Esquadrias metálicas:** No período em questão, foram iniciados os serviços pertinentes a este grupo, que incluem a instalação de janelas de correr, janelas maxim-ar, portões de correr e portas de abrir de uma e duas folhas. O progresso total registrado para este conjunto de serviço alcançou 87,84% de conclusão.
- **Vidros:** No período referente a esta medição, foram iniciados e concluídos todos os serviços relativos a este grupo, que incluem instalação de vidros de 6mm, vidros de 4mm, vidros de 5mm.
- **Revestimento de parede:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Forros:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Revestimento de piso:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados para este grupo. Com isso, o total acumulado permanece em 99,07%.
- **Ferragens:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Administração - mensalistas:** No período referente a esta medição, foram constatados 4,00% de serviços executados, sendo ele referente a pagamento de mestre de obra e engenheiro. Com isso, o total acumulado chega a 95,00%.

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

- **Pintura:** No período referente a esta medição, não foram executados os serviços deste item, permanecendo assim 69,83%.
- **Diversos:** No período referente a esta medição, foram executados 21,69% serviços para este grupo, sendo este, bancada de granito e suporte para bancada. Desta forma, o total acumulado para este grupo de serviço totaliza 84,90%.

Diante do exposto, encontra-se uma evolução de **15,28%** da obra, chegando a um total executado de **84,54%**.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1




Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 2



Figura 3

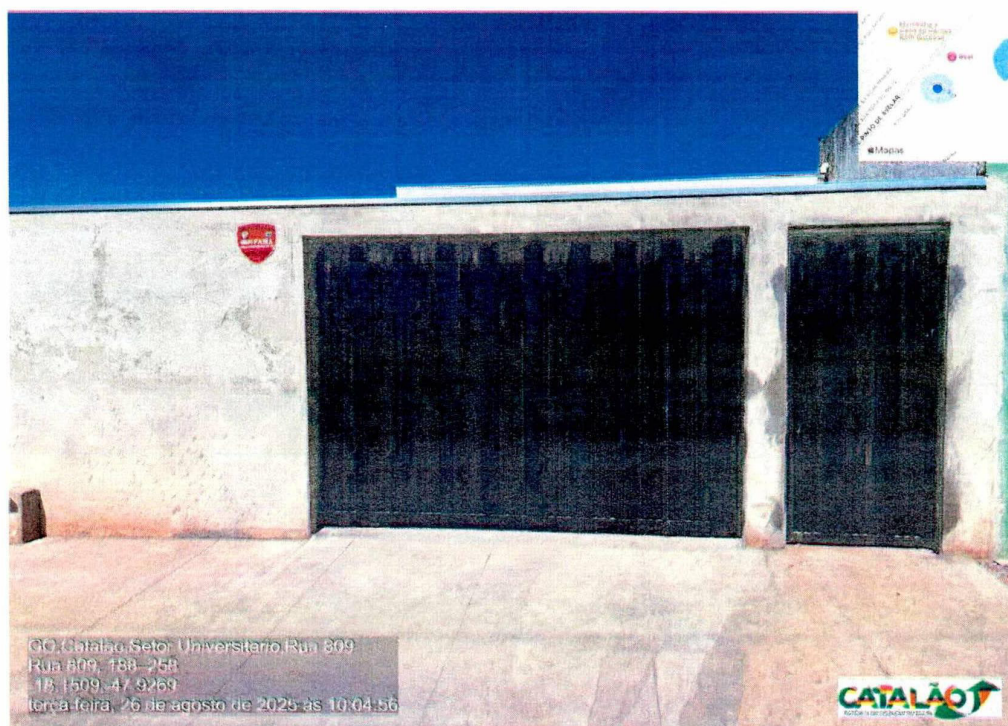

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 4

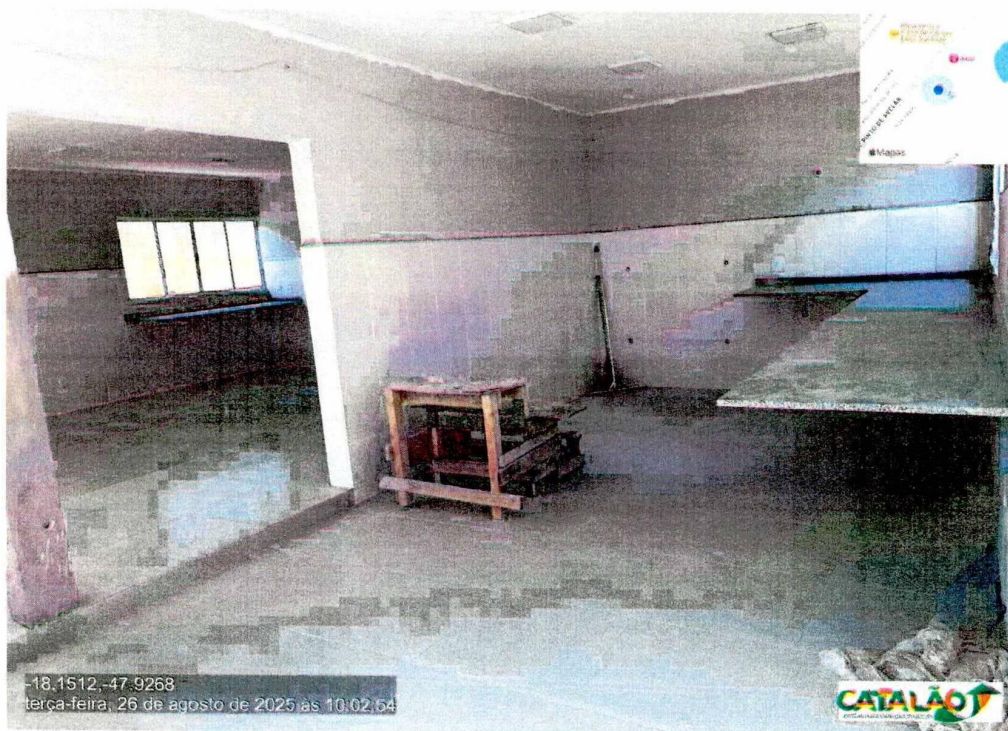


Figura 5




Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 6




Figura 7

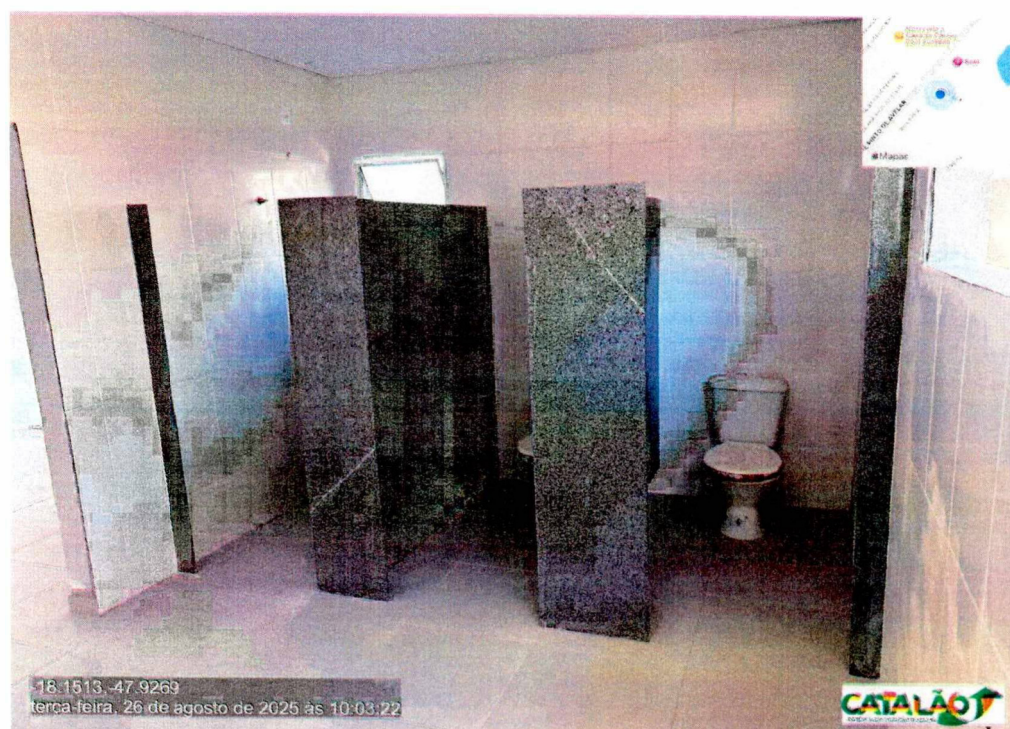

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 8

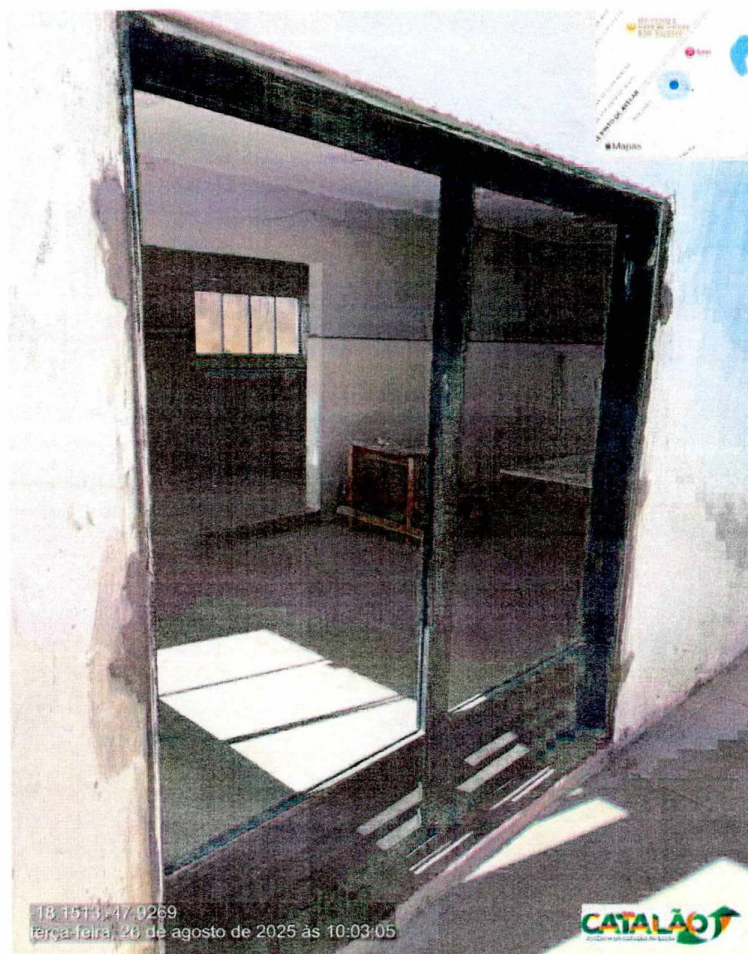

Catalão (GO), 26 de agosto de 2025.


Leandro Damas de Oliveira
Diretor
Secretaria Municipal de Obras
