

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 076/2024

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 008/2024

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR

ENDEREÇO: AVENIDA WILSON BARBOSA DE LIMA, ESQUINA COM A RUA ALAN MORI.

CONTRATADA: ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELLI ME.

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR, localizada no Bairro Evelina Nour no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 1º (primeiro) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 1º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 57,51% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a desmatamento e limpeza, consumo de água e energia elétrica, locação da praça, locação de container e placa da obra plotada em chapa metálica, chegando assim o grupo em um total de 57,51%.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, foram executados 73,17% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange o transporte de entulho em caminhão incluso a carga manual e transporte de entulho caçamba estacionária, chegando o grupo em um total de 73,17% já executado.



- Serviços em terra: No período referente a esta medição, foram executados 84,85% dos serviços relacionados a este grupo, referente a reaterro, espalhamento mecânico e apiloamento, chegando o grupo em um total de 84,85% já executado.
- Fundações e sondagens: No período referente a esta medição, foram executados 85,78% dos serviços relacionados a este grupo, referente a estaca trado com 25 cm de diâmetro sem ferro, forma tabua de pinho, preparo com betoneira e transporte manual de concreto, chegando o grupo em um total de 85,78% já executado.
- Estrutura: No período referente a esta medição, foram executados 100,00% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao preparo com betoneira e transporte manual de concreto fck = 30 Mpa, lançamento/aplicação/adensamento manual de concreto, aços de forma geral, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.
- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Instalações hidrossanitárias: No período referente a esta medição, foram executados 25,15% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao uso de kit cavalete, hidrômetro diâmetro de ramal de 25 mm e irrigação automatizada chegando o grupo em um total de 25,15% já executado.
- Alvenarias e divisórias: No período referente a esta medição, foram executados 100,00% dos serviços relacionados a este grupo, referente a execução da alvenaria de blocos cerâmicos furados na vertical 14x 19 x 39 cm, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.
- Impermeabilização: No período referente a esta medição, foram executados 100,00% dos serviços relacionados a este grupo, referente a impermeabilização de vigas baldrame, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.
- Estrutura de madeira: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, foram executados 9,09% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao concreto desempenado com espessura de 5 cm, chegando o grupo em um total de 9,09% já executado.

- Administração: Foi realizado o equivalente a 15,99% dos serviços, tendo sido constatados pagamentos relacionados a engenheiro, mestre de obra, topógrafo e vigia de obras, chegando o grupo em um total de 15,99% já executado.
- Revestimento de parede: No período referente a esta medição, foram realizados 32,45% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao chapisco comum e reboco, chegando o grupo em um total de 32,45% dos serviços já executados.
- Pintura: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Diversos: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Paisagismo: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.

3. Relatório Fotográfico

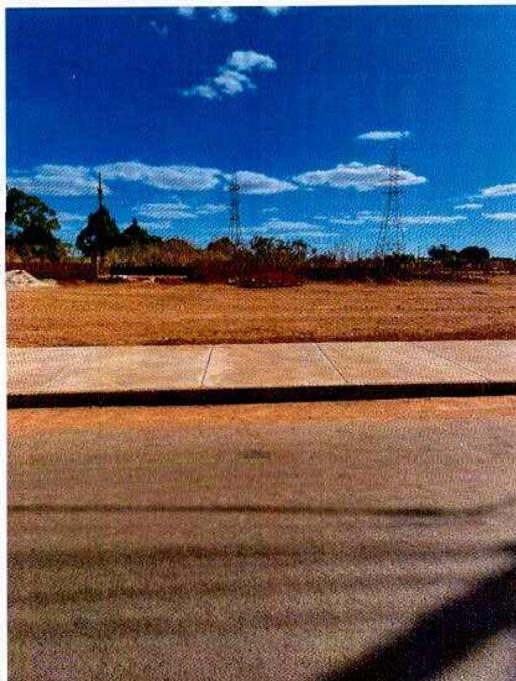


Figura 1

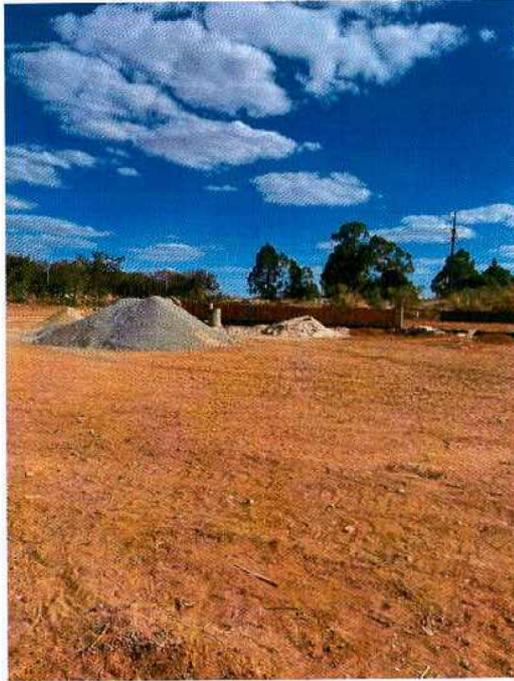


Figura 2

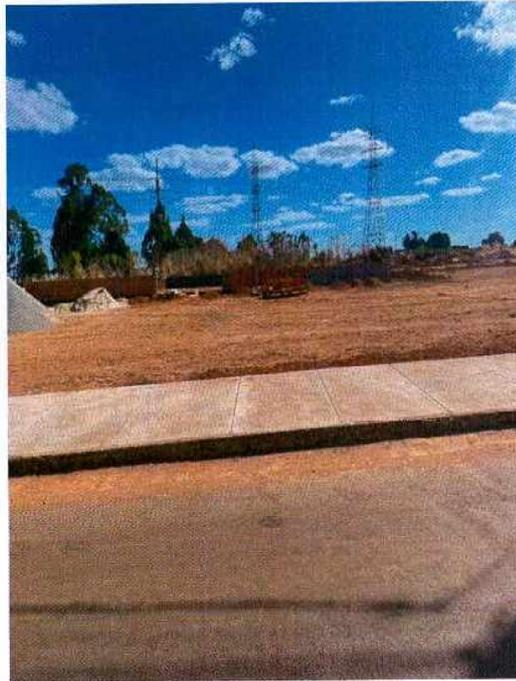


Figura 3

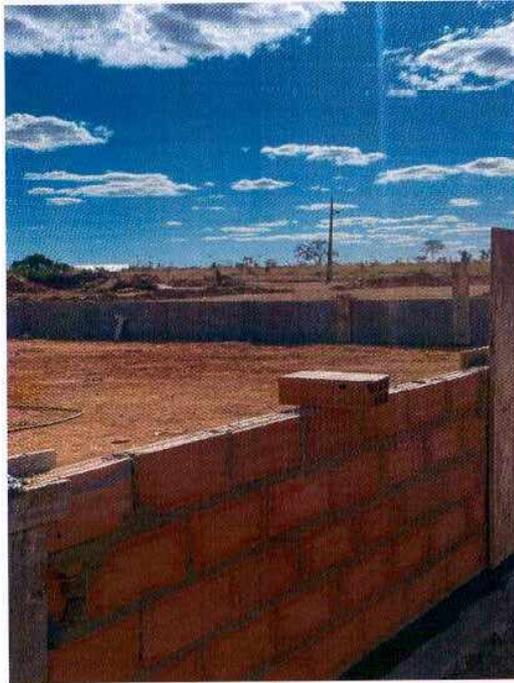


Figura 4

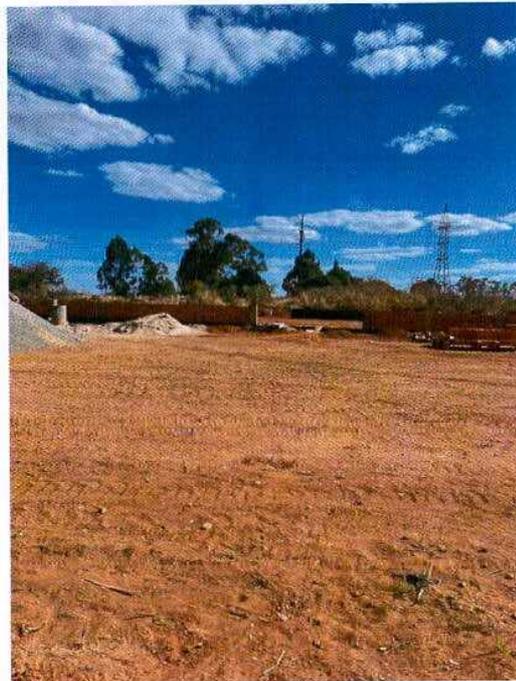


Figura 5

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'K' or a similar symbol, located at the bottom right of the page.



Figura 6


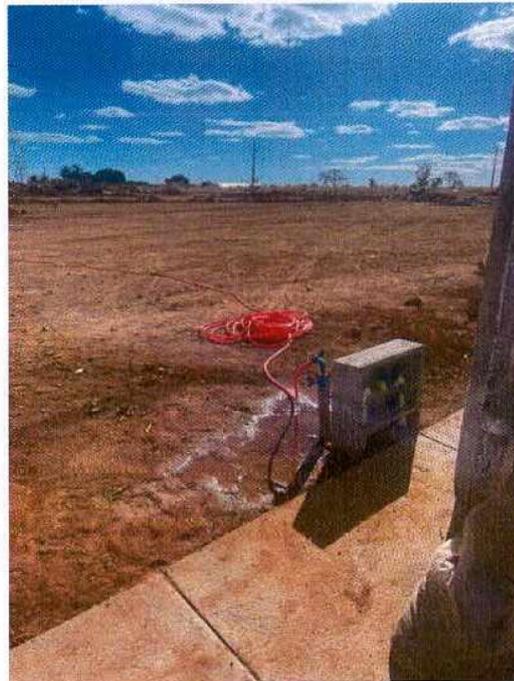


Figura 7

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive letter 'L'.

Catalão, 13 de agosto de 2024.



LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras

Engenheiro Civil
