

## LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 100/2025

**PROCESSO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025

**OBJETO:** READEQUAÇÃO DA RUA SABINO P. SILVA.

**ENDEREÇO:** RUA SABINO PEREIRA DA SILVA, ENTRE A AVENIDA JOÃO XXIII E RUA ELIAS DEMOCH, CENTRO, MUNICÍPIO DE CATALÃO.

**CONTRATADA:** ECA ENGENHARIA LTDA.

### 1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a READEQUAÇÃO DA RUA SABINO P. DA SILVA, (antiga Rua do Lazer), no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 4º (quarto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

### 2. Laudo técnico

#### 2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 4º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição de serviços, foi constatada uma evolução de 7,10% dos serviços integrantes do grupo, sendo possível verificar a locação de contêiner, bem como os consumos proporcionais de água e energia elétrica. Dessa forma, corroborando medições anteriores, o total acumulado atinge 80,60%.
- **Transporte:** No período correspondente a esta medição, registrou-se a execução de 12,41% dos serviços integrantes deste grupo, referentes ao transporte de entulho em caçamba estacionária. Assim, considerando-se as medições anteriores, o total acumulado perfaz 68,16%.
- **Revestimento de piso:** No período abrangido por esta medição, verificou-se a execução de 45,60% dos serviços previstos, destacando-se a realização do passeio de proteção em concreto desempenado, execução do pavimento intertravado e o pavimento em concreto tipo concregrama. Com isso, o total acumulado atinge 66,30%.
- **Instalações elétricas:** No período contemplado por esta medição, registrou-se uma evolução de 29,90%, correspondente à aquisição e instalação dos postes e luminárias, chegando assim, a um total acumulado de 40,72%.

Leonilda Damasceno de Oliveira  
Assessoria Especial de Engenharia  
Professora Especializada em Engenharia  
Civil



- **Instalações hidrossanitárias:** No período contemplado por esta medição, registrou-se uma evolução de 79,11%, correspondente à execução dos tubos e conexões hidráulicas, chegando assim, a um total acumulado de 79,11%.
- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes e esse grupo de serviço.
- **Pintura:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes e esse grupo de serviço.
- **Diversos:** No período referente a esta medição foram identificados 19,57% dos serviços previstos para este grupo de serviço, sendo constatado a execução do meio fio e mesas, chegando a um total acumulado de 20,29%.
- **Administração Local:** No período abrangido por esta medição, identificou-se a execução de 20,42% dos serviços vinculados à administração da obra, resultando em um total acumulado de 44,19%.

### 3. Relatório Fotográfico

Figura 1

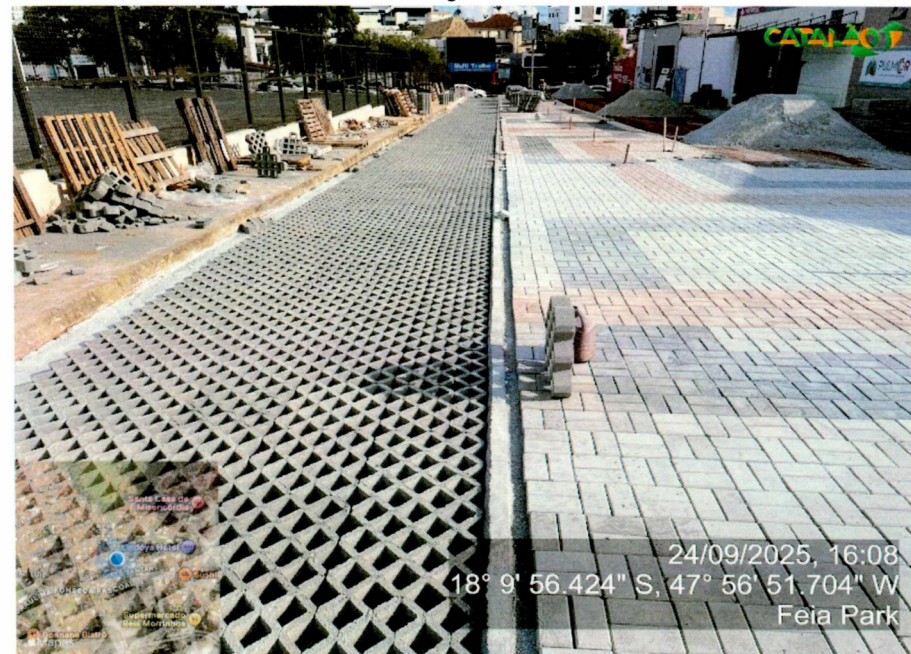


Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Secretaria de Obras

Figura 8



Catalão (GO), 02 de outubro de 2025.

  
**Leandro Damas de Oliveira**  
Diretor de Obras  
Secretaria Municipal de Obras
