

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 060/2024

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 009/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA HOSPITALAR

ENDEREÇO: RUA ISRAEL DE ALMEIDA, S/N, QUADRA ÚNICA INSTITUCIONAL (AO LADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA), SETOR SANTA RITA, CATALÃO-GO.

CONTRATADA: TL ENGENHARIA E PROJETO EIRELI

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a construção da Lavanderia Hospitalar, localizada no município de Catalão, no intuito de corroborar os valores apresentados no 2º (segundo) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 2º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** Durante o período de medição em questão, foi constatada a execução de 5,02% dos serviços pertencentes a este grupo. As atividades realizadas incluem os consumos proporcionais de água e energia e locação de container. Desta forma, o total acumulado para este grupo de serviço chega a 90,54%.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, verificou-se a execução de 41,80% dos serviços programados, os quais compreendem o transporte recorrente de entulho por caçamba estacionária. Desta forma, este grupo de serviço chega a um total acumulado de 74,00%.
- **Serviços em terra:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.

- **Fundações e Sondagem:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Estrutura:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Instalações elétricas:** Durante o período de referência desta medição, foram realizados 2,59% dos serviços associados a este conjunto, os quais incluíram o início da passagem dos eletrodutos. Com isso, o total acumulado para este grupo chega a 8,48%.
- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Alvenaria e divisórias:** Durante o período de abrangência da medição, não foram constatados evolução na execução dos serviços previstos, com isso, o total acumulado permanece em 77,56%.
- **Impermeabilização:** Durante o período de abrangência da medição, não foram constatados evolução na execução dos serviços previstos, com isso, o total acumulado permanece em 67,47%.
- **Estrutura de madeira:** Durante o período abarcado por esta medição, foram realizados 60,00% dos serviços associados a este conjunto, abrangendo a aquisição e início da instalação da estrutura de madeira para receber a cobertura.
- **Coberturas:** Durante o período abarcado por esta medição, foram realizados 8,68% dos serviços associados a este conjunto, abrangendo a aquisição das telhas para cobertura.
- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Vidros:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Revestimento de parede:** Durante o período abarcado por esta medição, foram realizados 23,75% dos serviços associados a este conjunto, abrangendo a aplicação do chapisco, emboço e reboco. Desta forma, o total acumulado chega a 64,34%.

- **Forros:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Revestimento de piso:** No período referente a esta medição, foram executados 3,93% dos serviços relacionados para este grupo, no que tange a aplicação de lastro de brita. Com isso, o total acumulado chega a 11,80%.
- **Ferragens:** Conforme indicado em medições anteriores, 100,00% dos serviços pertinentes a este grupo de serviço já foram concluídos.
- **Administração - mensalistas:** No período referente a esta medição, foram constatados 8,00% de serviços executados, sendo ele referente a pagamento de mestre de obra e engenheiro. Com isso, o total acumulado chega a 48,00%.
- **Pintura:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo.
- **Diversos:** No período referente a esta medição, foram executados 11,25% dos serviços previstos para este grupo, podendo ser constatado o muro em alvenaria no local. Desta forma, o total acumulado para este grupo de serviço chega a 43,77%.

Diante do exposto, encontra-se uma evolução de 5,80% da obra, chegando a um total executado de 42,40%.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2

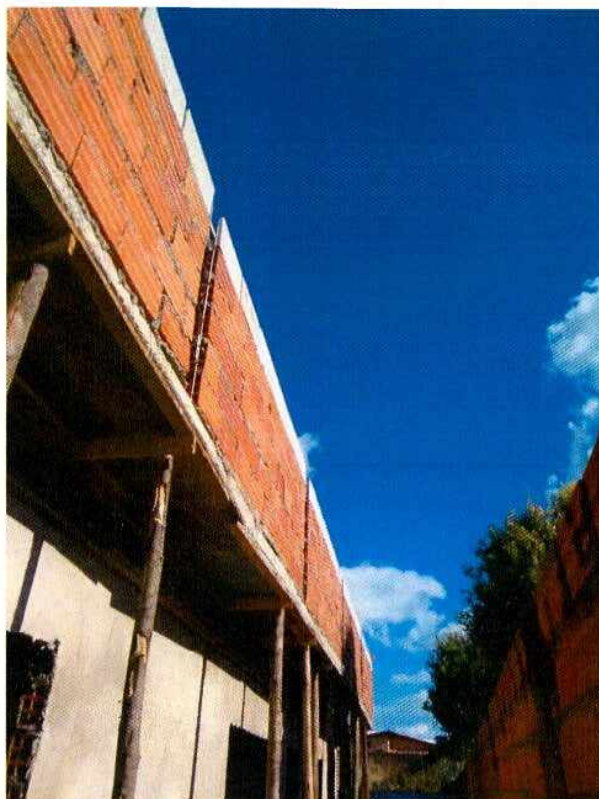


Figura 3

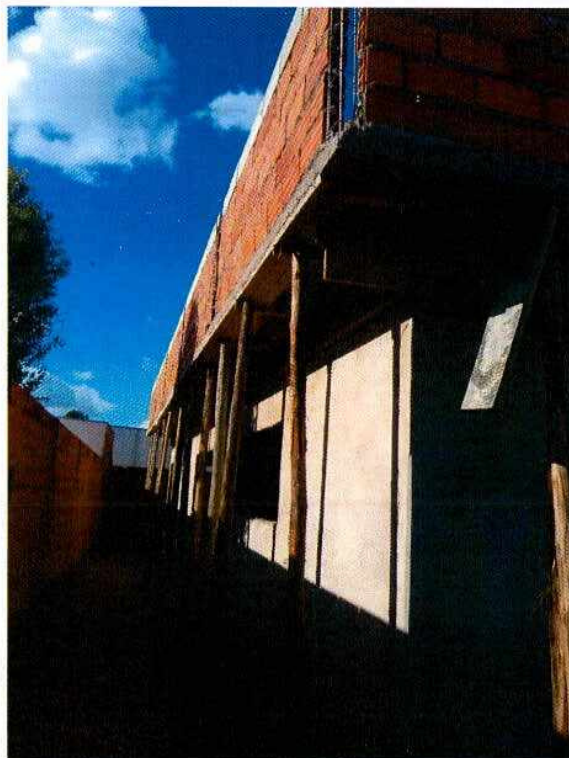


Figura 4



Catalão, 24 de junho de 2024.

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras

Engenheiro Civil
