



- ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS -

01

- DEOF -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ORGÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 TIPO	1.2 DOCUMENTO NOTAS DE PAGAMENTO	1.7 Nº DO PROCESSO 2025043836	1.3 FONTE DE RECURSOS RECURSOS MINERAIS	1.4 FOLHA 15399					
1.5 DATA DE EMISSÃO 27/11/2025	1.6 DATA DO EMPENHO 27/11/2025	1.8 Nº DA LIQUIDAÇÃO 1	1.9 DOTAÇÃO COMPACTADA 20251162	1.10 SALDO ANTERIOR R\$ 2.000.621,64					
1.11 EXERC 2025	1.12 ORGÃO 01	1.13 UNIDADE 3019	1.14 FUNÇÃO 15	1.15 PROG. 4290	1.16 SUBFUN 451	1.17 P / A 5087	1.18 NAT. DESP/ SNAT 449051.0 OBRAS E INSTALACOES	1.19 FONTE 170072	1.20 VALOR R\$ 2.000.621,64
1.21 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS									1.22 SALDO ATUAL R\$ 0,00
1.23 PROJETO / ATIVIDADE 15.451.4290-5087-RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - PERÍMETRO URBANO									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 NOME EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA	2.2 CPF / CNPJ 15.131.446/0001-22	
2.3 ENDEREÇO Nº2555	2.4 MUNICÍPIO CATALAO	2.5 U.F. GO
2.6 AGÊNCIA 3953-0	2.7 BANCO 748	2.8 CONTA 94880-2

3 - HISTÓRICO

3.1 ESPECIFICAÇÃO
NR. LICITAÇÃO: 006 NR. AUTORIZAÇÃO: 0
PG. DA 6ª MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 171/2025, CONCORRÊNCIA Nº 006/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

3.2 CERTIFICADO
A DESPESA É REGULAR, O(S) MATERIAL(IS) / SERVIÇO(S) / OBRA(S) DESCRITO(S) FOI(RAM) ENTREGUE(S), ACEITO(S), RECEBIDO(S) EM PERFEITA(S) CONDIÇÃO(ÕES).
3.3 DESCONTOS
61 ISSQN 80.024,87
80 IRPJ - RETENÇÃO 77.023,93
81 INSS RETENÇÃO-PJ 20.006,22
TOTAL RETENÇÕES: 177.055,02

4 - CONTÁBIL / FINANCEIRO

4.1 BANCO: BANCO DO BRASIL	4.4 NÚMERO:	4.5 DATA: 27/11/2025	
4.2 CONTA: 731013 CFEM			
4.3 PAGAMENTO: DEBITO			
4.6 VALOR DOS DESCONTOS R\$ 177.055,02			
4.7 VALOR LÍQUIDO R\$ 1.823.566,62			
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO DA FAZENDA	CONTADOR	FORNECEDOR
4.8 VALOR LÍQUIDO DO DOCUMENTO POR EXTENSO ***** (UM MILHÃO E OITOCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) *****			



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 311-5
Conta corrente 73101-3 PREF MUN CATALAO CEFEM

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3953 SICREDI PLANALTO CENTRAL GO
Conta corrente (com DV) 948802
CNPJ 15.131.446/0001-22
Nome favorecido EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.701
Valor 1.823.566,62
Destinação 0
Data transferência 27/11/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A6F72C94E211A788

Assinada por	JB527262 SURANIA MARIA PEREIRA	27/11/2025 15:19:46
	JI593165 JAMIL TORQUATO PEREIRA	27/11/2025 15:23:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI593165 JAMIL TORQUATO PEREIRA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária	Tipo da Conta
EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA	15.131.446/0001-22	748	3953-0	94880-2	
Endereço	Cidade		Telefone		
Nº2555	CATALAO				

Liquidação

Processo	Data Liq.	Data Venc.	Nº Liquidação
2025043836	27/11/2025	27/11/2025	1

Empenho

Exercício	Nº Empenho	Nº Seq	Data	Processo	Licitação
2025	15399	3	27/11/2025	2025043836	
Nº Licitação	Fonte de Recursos				
006	170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAT				

Dotação

Natureza de Despesa	FICHA: 20251162	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	Classificação Funcional	
Sub Elemento de Despesa	15.451.4290-5087-RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - PERÍMETRO URBANO	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		
Vínculo	Saldo Anterior	Saldo Atual
170072 - RECURSOS MINERAIS	2000621,64	0,00
Crédito: Especial		

Valores

Retenção 61 - ISSQN		Valor Retido	80.024,87		
Retenção 80 - IRPJ - RETENÇÃO		Valor Retido	77.023,93		
Retenção 81 - INSS RETENÇÃO-PJ		Valor Retido	20.006,22		
EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	TOTAL RETIDO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
2.000.621,64	2.000.621,64	2.000.621,64	177.055,02	1.823.566,62	0,00

Histórico

LIQUIDAÇÃO DA 6ª MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 171/2025, CONCORRÊNCIA Nº 006/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Documentos

Tipo Documento	Nº Documento	Nº Série	Data Emissão	Valor Documento	Valor Liquidação
Nota Fiscal eletrônica(Chave de acesso Municipal)	2363	U	26/11/2025	2.000.621,64	2.000.621,64

Líquido por Extenso

***** (UM MILHÃO E OITOCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) *****

4 - ASSINATURAS



ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema.

Recebi(mos) de EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 2363

NF-e Emitida em: 26/11/2025

Código Controle Interno: 4501805

PÁGINA: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO					
Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 20250000024132					
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 15.131.446/0001-22 Inscrição municipal: 54006830 Nome/Razão: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA. Endereço: Nº S/N - KM-245 Bairro: DISTRITO PIRES BELO Município: CATALAO/GO CEP: 75.714-300 Telefone: (64)3411-7405		Nº da nota 2363 Série UNICA Data emissão 26/11/2025			
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 01.505.643/0001-50 Inscrição estadual: Inscrição municipal: Nome/Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO/GO. Endereço: RUA NASSIN AGEL Nº 505 Bairro: CENTRO Município: CATALAO / GO CEP: 75.701-050 Telefone: (34)4150-12					
Discriminação dos serviços prestados SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM VALOR TOTAL R\$ 2.000.621,64. 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 171/2025, CONCORRÊNCIA Nº 006/2025 PROCESSO Nº 2025019963. BASE DE CALCULO RETENÇÕES DO INSS (35%): R\$ 2.000.621,64 X 35% = R\$ 700.217,57 X 11% = R\$ 77.023,93					
Prefeitura Municipal de Catalão Autorizo a liquidação e pagamento desta Nota Fiscal, conforme legislação vigente. Data: ____/____/____  Bruno Augusto Evangelista Matrícula 108273 / CPF: 709.501.991-68 Secretário Municipal de Transportes Secretaria Municipal de Obras Atesto que os () materiais recebidos / (x) serviços prestados foram recebidos em conformidade com o (x) Contrato / () Nota de Empenho, conforme legislação vigente, na data de 26/11/25.  Leandro Damas de Oliveira Matrícula 109130 - CPF: 030.463.041-10 Municipal de Catalão					
ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Imposto retido pelo tomador: NÃO Serviço prestado fora do município: NÃO Observação: DADOS BANCARIOS BANCO: SICREDI AGENCIA :3953 CONTA: 94880-2 BC e Aliquota 2000.621,64 x 4% ISS a ser retido: 80.024,87 Data: 26/11/25  Auditoria Fiscal de Tributos					
RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 77.023,93	IR R\$ 20.006,22	CSLL R\$ 20.006,22
Demonstrativo Valor dos serviços R\$ 2.000.621,64 (-) Desconto R\$ 0,00 (-) Retenções federais R\$ 117.036,37 (-) Outras retenções R\$ 0,00 (=) Valor líquido R\$ 1.883.585,27			Cálculo do Imposto Valor dos serviços R\$ 2.000.621,64 (-) Desconto R\$ 0,00 (=) Valor da nota R\$ 2.000.621,64 (-) Deduções R\$ 0,00 (=) Base de cálculo R\$ 2.000.621,64 (x) Aliquota % 4,00 (=) Valor do imposto(ISS) R\$ 80.024,87		
Serviço prestado em GO - CATALAO		Serviço devido em GO - CATALAO			
Valor dos serviços 2.000.621,64		Desconto 0,00		Valor da nota 2.000.621,64	
Informações importantes: - A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: https://catalao.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/					

Código verificação: 06899683525126

Prefeitura Municipal de Catalão

Nota Fiscal

Autorizo a

conferência

Prefeitura Municipal de Catalão

Autorizo a liquidação e pagamento desta Nota Fiscal,
conforme legislação vigente.

Data: 28/11/25

Matr.

Secretaria

Jamil Torquato Pereira
Matrícula 108279 / CPF: 198.327.881-53
Secretário Municipal de Administração

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor					
EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA		15.131.446/0001-22	748	3953-0	94880-2
Endereço		Telefone			
AV RAULINA FONSECA PASCHOAL, N°2555, 00000000, SANTA HELENA II, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20251162	15399	82025
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/11/2025	0	CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS	006	2025043836
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
				
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.000.621,64	2.000.621,64	0,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES		170 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAT
Sub elemento de despesa		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES		
Classificação funcional		Crédito
15.451.4290-5087-RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - PERÍMETRO		ESPECIAL

Valores	Valor do empenho
	2.000.621,64

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM, CONFORME CONTRATO N° 171/2025, CONCORRÊNCIA N° 006/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso
***** (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema



<http://www.catalao.go.gov.br>
protocolo@catalao.go.gov.br

ISABELLA.BORGES*



PROTOCOLO: 2025043836 **Autuaça** 25/11/2025 **Hora:** 14:29
Interessado: EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA
CPF / CNPJ: 15.131.446/0001-22 **Data**
N. **PROT.** -
Valor: R\$ -
Assunto: DEPARTAMENTO DE OBRAS
SubAssunto: MEDIÇÃO
Tópicos do
Comentário: REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 171/025
Origem: PROTOCOLO

PROTOCOLO	2025043836	Autuaça	25/11/2025	Hora	14:29
Interessado:	EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA				
CPF / CNPJ:	15.131.446/0001-22	Fone:	(64)3442-5949		
Endereço:	AV RAULINA FONSECA PASCHOAL - N°2555		Bairro	ZONA RURAL	
N.	Data	PROT.	-		
Valor:	R\$ -				
Assunto:	DEPARTAMENTO DE OBRAS				
SubAssunto:	MEDIÇÃO				
Tópicos do subassunto:					
Comentário:	REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 171/025				
Origem:	PROTOCOLO				



À

Prefeitura Municipal de Catalão – GO
Secretaria de Obras

Ref.: Entrega da 6ª Medição – Contrato nº 171/2025

Processo Técnico nº 2025019963

Trecho: Avenida Sebastião de Pádua e Sede da CMOC

EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 15.131.446/0001-22, com sede na Avenida Raulina Fonseca Paschoal nº2555, sala 2 – Santa Helena II, na qualidade de contratada no âmbito do Contrato nº 171/2025, vem, por meio deste, requerer formalmente a entrega da **6ª Medição** dos serviços executados no referido contrato, cujo objeto abrange a execução de obras no trecho da **Avenida Sebastião de Pádua até a sede da CMOC**, conforme previsto no escopo contratual.

Informamos que os serviços realizados até o momento encontram-se de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado e dentro dos padrões técnicos exigidos.

Sendo assim, solicitamos a análise e aprovação da 6ª Medição, para fins de liberação dos valores correspondentes, conforme previsto contratualmente.

Anexos:

- Boletim de Medição nº 06
- Relatório Fotográfico dos Serviços Executados
- ART
- Ensaio de Laboratório
- Diário de Obra
- Memória de Cálculo da medição
- Certidões Negativas Municipal, federal, Estadual, FGTS e INSS trabalhista
- Cópia do Contrato
- CNO

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Catalão – GO, 25 de Novembro de 2025.

EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

CNPJ nº 15.131.446/0001-22

Rafael Costa Vioto

Eng. Civil

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA DE TRANSPORTES			
EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC					
AVENIDA: SEBASTIÃO DE PÁDUA		TRECHO: AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC		EMPRESA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS	
Nº DO CONTRATO: 171/2025		Nº PROCESSO/PROTOCOLO DE MEDIÇÃO:		Nº PROCESSO TÉCNICO: 2025019963	
REFERÊNCIA: 6 MEDIÇÃO PERÍODO: 15/11/2025 A 25/11/2025 DATA BASE (lo): PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/7/2026 PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/2025 VALOR DA MEDIÇÃO PI: R\$2.000.621,64 VALOR PREVISTO DE REAJUSTE: R\$0,00 VALOR PREVISTO DE REEQUILÍBRIO: R\$0,00 VALOR PREVISTO DE REAJUSTE DO: R\$0,00 VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO: R\$2.000.621,64 OBS.: DECLARO QUE ESTA MINUTA DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO FOI ANALISADA E APROVADA E QUE OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ANEXADOS SÃO VÁLIDOS E CONDIZEM COM A REALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM CAMPO.					

LOCAL/DATE: CATALÃO 25/11/25

Engº Fiscal

Rafael Costa
Engº Emprego e Externo
Rafael Vitor
ENGENHEIRO
CREA 260237906-8

Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transporte
e Infraestrutura
Engenheiro Civil

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras



BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS




CONTRATADA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA AVENIDA: SEBASTIÃO DE PÁDUA MEDIÇÃO Nº: 6 MÊS: nov-25
OBJETO: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC TRECHO: AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC
CONTRATO: 171/2025 PRAZO: A PERÍODO DA MEDIÇÃO: 16-nov-25 A 25-nov-25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				EXECUTADO								REALIÇTUE - ATUAL			QUANTIDADE ACUMULADA (%)
		UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADES				VALORES (R\$)				ÍNDICE	R (R\$)	PI-R (R\$)	
						ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADA	SALDO	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADA	SALDO				
100001	TERRAPLENAGEM																
40423	ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m3	365,880	5,23	1.914,31	351,231		351,23	14,85	1.837,86	0,00	1.837,86	76,85	0,0000	0,00	0,00	96,00
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	365,880	2,67	977,24	351,231		351,23	14,85	938,11	0,00	938,11	39,13	0,0000	0,00	0,00	96,00
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	3.841,740	3,02	11.619,78	3.688,168		3.688,17	153,57	11.155,26	0,00	11.155,26	464,50	0,0000	0,00	0,00	96,00
40050	ESCAV. CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT-1.001 A 1.200M)	m3	4.371,960	16,18	70.756,20	4.196,874		4.196,87	175,08	67.922,58	0,00	67.922,58	2.833,82	0,0000	0,00	0,00	96,00
44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CAT. À CAMINHÃO (PAV URB.)	m3km	38.604,660	2,95	113.939,03	37.058,636		37.058,64	1.546,02	108.376,04	0,00	109.376,04	4.562,99	0,0000	0,00	0,00	96,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	2.091,260	5,72	11.961,85	2.007,672		2.007,67	83,59	11.483,73	0,00	11.483,73	478,12	0,0000	0,00	0,00	96,00
100002	PAVIMENTAÇÃO																
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	10.720,190	0,57	6.144,94	5.360,000		5.360,00	5.360,19	3.072,41	0,00	3.072,41	3.072,53	0,0000	0,00	0,00	50,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZZIAS	m2	10.720,190	0,43	4.576,02	0,000		0,00	10.720,19	0,00	0,00	0,00	4.576,02	0,0000	0,00	0,00	0,00
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3	4.502,480	20,93	94.229,41	2.630,400	1.300,000	3.930,40	572,08	95.049,89	27.206,83	82.256,72	11.972,69	0,0000	0,00	27.206,83	87,29
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	54.577,000	2,94	160.414,68	47.099,430		47.099,43	8.877,57	140.199,87	0,00	140.199,87	20.214,81	0,0000	0,00	0,00	87,40
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	4.502,480	4,50	20.262,02	2.630,400	1.300,000	3.930,40	572,08	11.837,85	5.850,42	17.686,07	2.574,55	0,0000	0,00	5.850,42	87,29
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	128.770,870	2,67	343.937,21	72.336,000	40.000,000	112.336,00	16.434,87	193.203,96	106.836,96	300.040,92	43.896,29	0,0000	0,00	106.836,96	87,24
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	63.635,020	1,29	82.265,83	12.754,390	42.800,000	55.554,39	8.080,63	16.488,56	55.330,81	71.819,38	10.446,45	0,0000	0,00	55.330,81	87,30
100317	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40% - 40% MISTURA EM PISTA, COM ESPESURA DE 15CM - (EXCLUSIV. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF. 09/2024)	m3	7.504,130	134,05	1.005.900,38	4.660,800	2.189,100	6.849,90	654,23	624.762,89	293.440,61	918.203,31	87.697,07	0,0000	0,00	293.440,61	91,28
44200	IMPREGNAÇÃO (PAV URB.)	m2	48.377,800	0,51	24.780,96	30.960,000	14.894,000	45.554,00	2.823,80	15.858,70	7.475,51	23.334,21	1.446,45	0,0000	0,00	7.475,51	94,16
44201	IMPREGNAÇÃO LIGAÇÃO (PAV URB.)	m2	48.377,800	0,43	20.650,55	28.284,000	14.881,200	43.165,20	5.212,80	12.073,30	6.352,18	18.425,49	2.225,06	0,0000	0,00	6.352,18	89,23
40016	CONCRETO BETUMINOSO USADO A QUENTE-ORIG - FAIXA B	m3	2.181,750	452,86	988.031,38	1.272,780	669,664	1.942,43	239,32	578.393,53	303.290,78	879.654,29	108.377,10	0,0000	0,00	303.290,78	89,03
40002	CONCRETO BETUMINOSO USADO A QUENTE-ORIG - FAIXA C	m3	1.436,980	454,54	653.035,90	0,000	437,820	437,82	968,96	0,00	199.008,85	199.008,85	454.026,75	0,0000	0,00	199.008,85	30,47
40480	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	km	277.895,420	0,85	237.244,88	97.748,504	84.761,961	182.511,46	95.363,97	83.450,70	72.362,97	155.813,68	81.431,20	0,0000	0,00	72.362,97	85,68
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	166.438,550	1,93	320.721,76	51.828,780	42.488,63	94.318,39	72.120,16	99.872,36	81.878,15	181.748,52	138.973,24	0,0000	0,00	81.878,15	56,67
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	53.884,350	1,29	69.414,77	8.015,720		8.015,72	45.678,63	10.362,53	0,00	10.362,53	58.052,24	0,0000	0,00	0,00	14,83
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	km	2.206,740	0,72	1.587,89	0,000		0,00	2.206,74	0,00	0,00	0,00	1.587,89	0,0000	0,00	0,00	0,00
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	km	21.927,890	1,45	31.824,18	7.713,045	8.688,25	14.401,29	7.526,40	11.194,12	9.706,80	20.900,93	10.923,25	0,0000	0,00	9.706,80	85,68
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV URB.)	km	1.469,430	3,21	4.713,27	457,579	375,13	832,71	636,72	1.467,70	1.203,23	2.670,94	2.042,33	0,0000	0,00	1.203,23	56,67
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV URB.)	km	174,130	2,28	397,13	0,000		0,00	174,13	0,00	0,00	0,00	397,13	0,0000	0,00	0,00	0,00
44302	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV URB.)	m3km	7.441,560	3,49	25.956,58	954,703		954,70	6.486,86	3.330,05	0,00	3.330,05	22.626,53	0,0000	0,00	0,00	12,83
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPREGNAÇÃO - EAI	t	62,890	3.184,96	200.302,20	39,409	18,96	58,37	4,52	125.516,76	60.379,23	185.896,00	14.406,20	0,0000	0,00	60.379,23	92,81
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	24,190	3.839,96	92.868,62	14,142	7,44	21,58	2,61	54.304,70	28.571,60	82.876,30	10.012,32	0,0000	0,00	28.571,60	89,22
40525	FORNECIMENTO DE CAP-90/10	t	484,870	5.284,34	2.615.063,25	137,460	122,17	259,63	235,24	726.387,17	645.572,09	1.371.959,27	1.243.103,98	0,0000	0,00	645.572,09	52,46
44400	CALCADA EM CONCRETO DESEMPENHADO 15MPa - ESPESURA = 5cm (ACBQ)	m2	4.817,500	32,72	157.637,60	0,000		0,00	4.817,50	0,00	0,00	0,00	157.637,60	0,0000	0,00	0,00	0,00
100004	DRENAGEM																
41287	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPIOS 120-30	m	733,860	52,53	38.548,32	0,000		0,00	733,86	0,00	0,00	0,00	38.548,32	0,0000	0,00	0,00	0,00
41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - BTC 88-20		1.712,230	58,53	101.926,78	0,000		0,00	1.712,23	0,00	0,00	0,00	101.926,78	0,0000	0,00	0,00	0,00
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	m	930,600	82,03	57.724,05	0,000		0,00	930,60	0,00	0,00	0,00	57.724,05	0,0000	0,00	0,00	0,00
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	7.374,100	27,34	201.633,20	0,000		0,00	7.374,10	0,00	0,00	0,00	201.633,20	0,0000	0,00	0,00	0,00
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	237,530	20,95	4.976,90	0,000		0,00	237,53	0,00	0,00	0,00	4.976,90	0,0000	0,00	0,00	0,00
41345	CAIXA COLETOIRA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (ACBQ)	un	3,000	1.841,84	5.525,52	2,000		2,00	1,00	3.983,58	0,00	3.983,58	1.841,84	0,0000	0,00	0,00	66,67
41346	CAIXA COLETOIRA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO (ACBQ)	un	3,000	2.261,13	6.783,38	3,000		3,00	0,00	6.783,38	0,00	6.783,38	0,00	0,0000	0,00	0,00	100,00
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (ACBQ)	un	8,000	206,02	1.648,12	0,000		0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1.648,12	0,0000	0,00	0,00	0,00
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (ACBQ)	un	3,000	373,08	1.119,23	0,000		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1.119,23	0,0000	0,00	0,00	0,00

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

41374	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (ACBIC)	un	3,000	1.981,96	5.944,67	3,000		3,00	0,00	5.944,67	0,00	5.944,67	0,00	0,0000	0,00	0,00	100,00	
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (ACBIC)	un	5,000	59,07	295,33	0,000		0,00	5,00	0,00	0,00	295,33	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (ACBIC)	un	1,000	71,75	71,75	0,000		0,00	1,00	0,00	0,00	71,75	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
41414	DESIDR D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (ACBIC)	m	19,000	103,20	1.960,85	0,000		0,00	19,00	0,00	0,00	1.960,85	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
100009 OBRAS DE ARTE CORRENTES																		
41806	CORPO DE BISTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	67,000	473,33	31.712,89	36,000	31,800	67,00	0,00	17.039,76	14.673,12	31.712,89	0,00	0,0000	0,00	14.673,12	100,00	
41811	CORPO DE BISTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	85,000	706,47	46.050,27	85,000		85,00	0,00	46.050,27	0,00	46.050,27	0,00	0,0000	0,00	0,00	100,00	
41851	BOCA DE BISTC D=0,80M (ACBIC)	un	1,000	964,13	964,13	0,000		0,00	1,00	0,00	0,00	964,13	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS/ORENAGEM URBANA																		
45400	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	m3	50,970	85,95	4.380,83	40,970		40,97	10,00	3.521,17	0,00	3.521,17	859,46	0,0000	0,00	0,00	80,36	
45410	ESCOVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m3	337,690	12,88	4.348,97	267,690		267,68	70,00	3.447,44	0,00	3.447,44	901,53	0,0000	0,00	0,00	79,27	
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m3	264,740	17,25	4.565,48	214,740		214,74	50,00	3.703,22	0,00	3.703,22	862,26	0,0000	0,00	0,00	81,11	
45535	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (ACBIC)	un	15,000	1.650,64	24.759,65	1,000	1,000	2,00	13,00	1.650,64	1.650,64	3.301,28	21.458,37	0,0000	0,00	1.650,64	13,33	
45605	CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS	m3	154,880	10,73	1.662,25	0,000		0,00	154,88	0,00	0,00	0,00	1.662,25	0,0000	0,00	0,00	0,00	
SINALIZAÇÃO																		
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	6.204,000	32,73	203.082,13	0,000		0,00	6.204,00	0,00	0,00	0,00	203.082,13	0,0000	0,00	0,00	0,00	
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL OPINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	m2	9,080	426,06	3.868,56	0,000		0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	3.868,56	0,0000	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		
42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	un	4,000	64.600,52	336.402,07	1,522	0,944	2,47	1,53	128.728,14	79.862,88	208.591,03	129.811,04	0,0000	0,00	79.862,88	61,64	
CANTEIRO DE OBRA																		
42200	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	un	1,000	107.831,43	107.831,43	1,000		1,00	0,00	107.831,43	0,00	107.831,43	0,00	0,0000	0,00	0,00	100	
100097 MOBILIZAÇÃO																		
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,000	100.043,61	100.043,61	0,500		0,50	0,50	50.021,80	0,00	50.021,80	50.021,81	0,0000	0,00	0,00	50	
TOTAIS			PREVISTO R\$			8.673.000,00	REALIZADO R\$			R\$ 3.346.946,63	R\$ 2.000.621,64	R\$ 5.346.567,38	R\$ 3.326.432,62	0,00			2.000.621,64	61,65


Bruno Augusto Evangelista
 Secretário Municipal de Transporte
 e Infraestrutura
 Engenheiro Civil


Leandro Dantas de Oliveira
 Assessor Especial de Engenharia
 Prefeitura Municipal de Caiçara
 Secretária de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DE TRANSPORTES

Aplicação: Para obras que a Instalação do Canteiro é paga 100% na primeira medição e a Mobilização/Desmobilização é paga 50% na primeira e 50% na última medição (Conforme orientação do gestor).

CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO	
Valor do Contrato (A)	R\$ 8.673.000,00
Valor Total da Manutenção do Equilíbrio (B)	
Valor do Contrato s/ Equilíbrio (C) = A - B	R\$ 8.673.000,00
Custo Contratado da Administração Local (D)	R\$ 338.402,07
Custo do contrato s/ Equilíbrio e Administração (E) = C - D	R\$ 8.334.597,93
Custo Executado Total (F)	R\$ 0,00
Custo Executado da Manutenção do Equilíbrio (G)	R\$ 0,00
Custo Executado da Administração Local (H)	R\$ 0,00
Valor da medição ATUAL s/ Equilíbrio e Administração (I)	R\$ 1.920.758,76
Valor acumulado da medição ATUAL s/ Equilíbrio e Administração (J)	R\$ 5.137.976,35
Avanço Financeiro da Obra (K) = J / E	61,64%
Valor Acumulado de Administração (L) = K * D	R\$ 208.591,03
Valor Atual de Administração (M) = L - H	R\$ 208.591,03

CÁLCULO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO	
Valor do Equilíbrio (B)	R\$ 0,00
Avanço Financeiro da Obra (K)	61,64%
Valor Acumulado do Equilíbrio (N) = K * B	R\$ 0,00
Valor Atual do Equilíbrio (O) = N - G	R\$ 0,00

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Código: **GS**

Serviço: **REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO**

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO			Largura (m)	Extensão (m)	Área (m²)
			Estaca Inicial		Estaca Final			
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)
				+			0	-

Total Acumulado – Executado:

0,000

Total Medido-Medidas Anteriores:

Número da última medição (Xª MED)

0,000

Total desta medição:

Número da medição atual ((X+1)ª MED)

0,000

Código: **GS**

Serviço: **CONSTRUÇÃO DE BASE DE SOLO BRITA 40%-60%**

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO			Largura (m)	Extensão (m)	Espessura (m)	Volume (m³)
			Estaca Inicial		Estaca Final				
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)	(m³)
6	20/11/25	D/E	170	+		227	+		1.641,600
6	20/11/25	D/E	227	+		252	+		547,500
									-
									-
									-
									-
									-
									-

Total Acumulado – Executado:

2.189,100

Total Medido-Medidas Anteriores:

Número da última medição (Xª MED)

0,000

Total desta medição:

Número da medição atual ((X+1)ª MED)

2.189,100

Código: **GS**

Serviço: **IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE**

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO			Largura (m)	Extensão (m)	Área m²
			Estaca Inicial		Estaca Final			
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)
6	20/11/25	D/E	170	+		227	+	
6	20/11/25	D/E	227	+		252	+	

Orlando Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transporte
e Infraestrutura
Engenheiro Civil

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

								-
								-
								-
								-

Total Acumulado – Executado:

Total Medido-Medições Anteriores:

Total desta medição:

Número da última medição (Xª MED)

Número da medição atual ((X+1)ª MED)

14.594,000

0,000

14.594,000

Código: GS18

Serviço: PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-1C

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO						Largura	Extensão	Area
			Estaca Inicial			Estaca Final					
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)	(m)	(m)	m²
6	20/11/25	D/E	170	+		219	+		9,60	980	9.408,000
6	21/11/25	D/E	219	+		228	+		10,94	180	1.969,200
6	20/11/25	D/E	228	+		252	+		7,30	480	3.504,000
											-
											-
											-
											-
											-

Portaria CMOC

14.881,200

0,000

14.881,200

Código: GS18

Serviço: CBUQ Faixa C - Cap 50-70

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO						Largura	Extensão	Espessura	Volume
			Estaca Inicial			Estaca Final						
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)	(m)	(m)	(m)	(m³)
6	25/11/25	D/E	227	+		252	+		7,30	500	0,03	109,500
6	25/11/25	D/E	200	+		227	+		9,60	540	0,03	155,520
6	25/11/25	D/E	170	+		200	+		9,60	600	0,03	172,800
				+			+					-
				+			+					-
				+			+					-
				+			+					-
				+			+					-

437,820

0,000

437,820

Código: GS18

Serviço: CBUQ Faixa B - Cap 50-70

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO						Largura	Extensão	Espessura	Volume
			Estaca Inicial			Estaca Final						
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)	(m)	(m)	(m)	(m³)
6	20/11/25	D/E	170	+	(Fr.)	219	+	(Fr.)	9,60	980	0,045	423,360

PORTARIA CMOC


Elmano Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transporte
e Infraestrutura
Engenheiro Civil


Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretário de Obras

6	21/11/25	D/E	219	+	228	+	10,94	180	0,045	88,614
6	20/11/25	D/E	228	+	252	+	7,30	480	0,045	157,680
				+		+				-
				+		+				-
				+		+				-
				+		+				-
				+		+				-
				+		+				-

669,654
0,000
669,654

Código: GS18
Serviço: Fornecimento de Cap 50-70

Nº Medição	Volume de CBUQ	Densidade	Teor CAP	Total	
	(m³)	(Ton/m³)	%	Ton	
6	669,65	2,42	0,0450	72,93	FAIXA B
6	437,82	2,45	0,0460	49,24	FAIXA C
				122,167	

0,000
122,166

Código: GS18
Serviço: Transporte Comercial Mat Betuminoso

Nº Medição	Volume de CBUQ	Densidade	Teor CAP	Area	Taxa	Distancia de Transp.	Total	Tipo Material
	(m³)	(Ton/m³)	%	(m²)	(L/m²)	(KM)	(T*KM)	
6	669,65	2,42	0,0450	-	-	286	20.856,64	CAP 50 - 70 Fx B
6	437,82	2,45	0,0460	-	-	286	14.083,10	CAP 50 - 70 Fx C
6				14.594,00	1,299	286	5.421,88	IMPRIMA
6				14.881,20	0,50	286	2.128,01	RR-1C

42.489,631
0,000
42.489,630

Serviço: Transporte Comercial de Massa

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO						Largura	Extensão	Espessura	Dens.	DT	Total	
			Estaca Inicial			Estaca Final									
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)							
6	20/11/25	D/E	170	+		227	+		9,60	1140	0,045	2,42	32	38.137,651	FAIXA B
6	20/11/25	D/E	227	+		252	+		7,30	500	0,045	2,42	32	12.719,520	FAIXA B
														-	
6	25/11/25	D/E	227			252			7,30	500	0,03	2,42	32	8.479,680	FAIXA C
6	25/11/25	D/E	200			227			9,60	540	0,03	2,42	32	12.043,468	FAIXA C
6	25/11/25	D/E	170			200			9,60	600	0,03	2,42	32	13.381,632	FAIXA C
				+			+								


Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transporte e Infraestrutura
Engenheiro Civil


Leandro Damas de Oliveira
Assessor Técnico da Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

84.761,951
0,000
84.761,951

Serviço: Transporte Local de Massa

Serviço: Transporte Local de massa

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	TRECHO						Largura	Extensão	Espessura	Dens.	DT	Total	
			Estaca Inicial			Estaca Final									
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)							
6	20/11/25	D/E	170	+		227	+		9,60	1140	0,045	2,42	2,525	3.009,299	FAIXA B
6	20/11/25	D/E	227	+		252	+		7,30	500	0,045	2,42	2,525	1.003,649	FAIXA B
														-	
6	25/11/25	D/E	227			252			7,30	500	0,03	2,42	2,525	669,099	FAIXA C
6	25/11/25	D/E	200			227			9,60	540	0,03	2,42	2,525	950,304	FAIXA C
6	25/11/25	D/E	170			200			9,60	600	0,03	2,42	2,525	1.055,894	FAIXA C
				+			+								

6.688,245
0,000
6.688,245

Código: GS18

Serviço: Transporte Local Mat Betuminoso

Nº Medição	Volume de CBUQ (m³)	Densidade (Ton/m³)	Teor CAP %	Area (m²)	Taxa (L/m²)	Distancia de Transp. (KM)	Total (T*KM)	Tipo Material
6	669,65	2,42	0,0450			2,525	184,136	CAP 50 - 70 Fx B
6	437,82	2,45	0,0460			2,525	124,335	CAP 50 - 70 Fx C
6				14.594,00	1,299	2,525	47,868	IMPRIMA
6				14.881,20	0,50	2,525	18,788	RR-1C

375,127
0,000
375,126

Código: GS18

Serviço: Fornecimento de Emulsão (Imprima)

Nº Medição	Area (m²)	Taxa (L/m²)	Total Ton
6	14.594,00	1,299	18,958

18,958
0,000
18,957

Código: GS18

Serviço: Fornecimento de Emulsão (RR-1C)

Nº Medição	Area	Taxa	Total
------------	------	------	-------

Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transporte
e Infraestrutura
Engenheiro Civil

Leandro Dama de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

	(m²)	(L/m²)		Ton
6	14.881,20	0,50		7,441

7,441
0,000
7,440


 Augusto Evangelista
 Diretor Municipal de Transporte
 e Infraestrutura
 Engenheiro Civil


 Leandro Damas de Oliveira
 Assessor Especial de Engenharia
 Prefeitura Municipal de Catalão
 Secretário de Obras

Código:
Serviço: BSTC 0,60

Serviço: BSI 0,60																
Nº Medição	Data do Serviço	Lado	CORPO						SAÍDA					Comprimento Total (m)		
			Estaca Inicial			Estaca Final			Extensão (m)	Tipo	Estaca				Comprimento (m)	Tipo
			(Int.)	+	(Fr.)	(Int.)	+	(Fr.)			(Int.)	+	(Fr.)			
6	15/11/2025	D	17			18		11,00	31,00						31,00	
															0,00	
															0,00	

Total Acumulado – Executado:
Total Medido-Medidas Anteriores:
Total desta medição:

Número da última medição (Xª MED)
Número da medição atual ((X+1)ª MED)

31,00
0,00
31,00

Código:
Serviço: DISSIPADOR DE ENERGIA

SERVIÇO: DISSIPADOR DE ENERGIA							
Nº Medição	Data do Serviço	Lado	CORPO				Coordenada
			Estaca Aproximada			Quantidade (un)	
			(Int.)	+	(Fr.)		
				+			
				+			
				+			
				+			
				+			
				+			

Código:
Serviço: CAIXA COLETORA


Serviço: CAIXA COLETORA			CORPO				Coordenada
Nº Medição	Data do Serviço	Lado	Estaca Aproximada		Quantidade		
			(Int.)	+	(Fr.)	(un)	
				+			
				+			
				+			
				+			
				+			
				+			
				+			
				+			
				+			
				+			

0,000

Código:
Serviço: BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)

Nº Medição	Data do Serviço	Lado	CORPO				Coordenada
			Estaca Aproximada		Quantidade (un)		
			(Int.)	+		(Fr.)	
6	15/11/2025	D	17			1,00	-18.1673 -47.9198
				+			
				+			
				+			
				+			
				+			
				+			
				+			
				+			
				+			

1,000

 Augusto Evangelista
Secretaria Municipal de Transporte e Infraestrutura
Engenheiro Civil

 Leandro Damas de Oliveira
Assessor Técnico de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria da Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC PERÍODO: 15/11/2025 A 25/11/2025 MEDIÇÃO: 6

CONTRATO DE EXECUÇÃO:	17/1/2025	CONTRATADA:	EGP - EMPRESA GLOBAL DE PF	ORDEN DE SERVIÇO:	23/07/2025
PROCESSO LICITATÓRIO:	2025019963	D. BASE PROPOSTA:		ASS. CONTRATO:	21/07/2025
PRAZO DE VIGÊNCIA	21/07/2026				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	10/11/2025				

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO : Rafael Costa Vioto

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA
E A SEDE DA CMOC

MAPA DE CHUVA

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS						1	2
MANHÃ							
TARDE							
NOITE							

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	3	4	5	6	7	8	9
MANHÃ							
TARDE							
NOITE							

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	10	11	12	13	14	15	16
MANHÃ						B	
TARDE						B	
NOITE						B	

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	17	18	19	20	21	22	23
MANHÃ		B	B	B	B	B	
TARDE		B	B	B	B	B	
NOITE		B	B	B	B	C	

	SEG	TER	QUAR	QUIN	SEX	SAB	DOM
DIAS	24	25	26	27	28	29	30
MANHÃ	B	B					
TARDE	B	B					
NOITE	C	B					

LEGENDA		TOTAL	% MÊS
B	BOM	22	91,67%
C	CHUVA	2	8,33%
I	IMPRATICÁVEL	0	0,00%

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 6

FL.: 15

DATA: 15/11/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Sábado

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$

PRAZO DE VIGÊNCIA:

21/07/2026

DECORRIDO: 117

RESTANTE (VIGÊNCIA):

248

PRAZO DE EXECUÇÃO:

10/11/ DECORRIDO:

115

RESTANTE (EXECUÇÃO): -5

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Complemento e Espalhamento de Cascalho para Base de Solo Brita entre as Estacas 170 a 180, Mistura do Material com a Recicladora

Escavação dos dispositivos de Drenagem (Rede de Tubos) referente a drenagem da Estaca 18

Ensaio de Compactação para liberação da Base de Solo Brita

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

1. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
	x	x										x		x

Rafael Vioto
ENGENHEIRO

CREA 260237906-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Dias de Oliveira
Assessor Técnico

FISCAL DA EXECUÇÃO
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 6

FL.: 16

DATA: 16/11/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Domingo

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2025

DECORRIDO: 118

RESTANTE (VIGÊNCIA): 247

PRAZO DE EXECUÇÃO:

10/11/ DECORRIDO: 116

RESTANTE (EXECUÇÃO): -6

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Sem Atividades

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS

Rafael Vioto
ENGENHEIRO

CREA 260237906-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Técnico
FISCAL DA EXECUÇÃO
Secretaria de Obras

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 6
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		FL.: 17
OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOG		DIA DA SEMANA:	Segunda Feira
DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963 CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025 ASS. CONTRATO: 21/07/2025 O. SERV.: 23/07/2025 VALOR PROPOSTA: R\$ - PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026 DECORRIDO: 119 RESTANTE (VIGÊNCIA): 246 PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: 117 RESTANTE (EXECUÇÃO): -7			

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Complemento e Espalhamento de Cascalho para Base de Solo Brita entre as Estacas 180 a 190, Mistura do Material com a Recicladora

Ensaio de Compactação na base de Solo Brita para Liberação

Imprimação Impermeabilizante Base de Solo Brita Estaca 170 a 180

Imprimação Ligante Estaca 170 a 180

Aplicação de Binder Faixa B estaca 170 a 180

CLIMA: ☒ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESCAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
	x	x		x	x							x		x

Rafael Vioto
ENGENHEIRO

CREA 260237908-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Leandro Dantas de Oliveira
FISCAL DA EXECUÇÃO
Secretaria de Obras

Leandro de Oliveira
FISCAL DA EXECUÇÃO
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

 PORTUGAL NO CORAÇÃO DO BRASIL	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 6
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		FL.: 20
OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC		DIA DA SEMANA:	Quinta Feira
DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA			
PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963		CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025	ASS. CONTRATO: 21/07/2025
VALOR PROPOSTA: R\$ -		PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026	DECORRIDO: 122
		RESTANTE (VIGÊNCIA): 243	PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/2026
		DECORRIDO: 120	RESTANTE (EXECUÇÃO): -10

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Complemento e Espalhamento de Cascalho para Base de Solo Brita entre as Estacas 210 a 220, Mistura do Material com a Recicladora

Ensaio de Compactação na base de Solo Brita para Liberação

Imprimação Impermeabilizante Base de Solo Brita Estaca 200 a 210

Imprimação Ligante Estaca 200 a 210

Aplicação de Binder Faixa B estaca 200 a 210

CLIMA: ☒ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
	x	x		x	x							x		x

Rafael Viato
ENGENHEIRO

CREA 260837906-9

Leandro Damas de Almeida
Assessor Especial de Engenharia
FISCAL DA EXECUÇÃO
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 6

FL.: 21

DATA: 21/11/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Sexta Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 123

RESTANTE (VIGÊNCIA): 242

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/

DECORRIDO: 121

RESTANTE (EXECUÇÃO): -11

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Complemento e Espalhamento de Cascalho para Base de Solo Brita entre as Estacas 220 a 228, Mistura do Material com a Recicladora

Ensaio de Compactação na base de Solo Brita para Liberação

Imprimação Impermeabilizante Base de Solo Brita Estaca 210 a 220

Imprimação Ligante Estaca 210 a 220

Aplicação de Binder Faixa B estaca 210 a 220

Limpeza de material com Carga e Transporte para Bota Fora, trecho entre a estaca 10 a 24 para marcação Topográfica das cotas da Base

CLIMA:

☒



SOL

☐



NUBLADO

☐



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
	x	x		x	x							x		x

Rafael Vioto
ENGENHEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 266237906-9

FISCAL DA EXECUÇÃO

Leandro P. ...
Assessor Técnico de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 6

FL.: 22

DATA: 22/11/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Sábado

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026

DECORRIDO: 124

RESTANTE (VIGÊNCIA): 241

PRAZO DE EXECUÇÃO:

10/11/ DECORRIDO: 122

RESTANTE (EXECUÇÃO): -12

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Acabamento no trecho já Reciclado estaca 227 a 252

Imprimação Impermeabilizante Base de Solo Brita Estaca 220 a 252

Imprimação Ligante Estaca 220 a 227

Aplicação de Binder Faixa B estaca 220 a 227

Continuação a limpeza do trecho estaca 10 a 24 com carga e transporte do material para Bota Fora

CLIMA: ☒ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
x	x			x	x							x		x

Rafael Vioto
ENGENHEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA 260237806-0

Leandro Pinheiro de Oliveira

Assessor Especial de Engenharia

Secretaria Municipal de Transportes

FISCAL DA EXECUÇÃO

Secretaria de Obras

	DIÁRIO DE OBRAS		N.º 6
	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		FL.: 24
OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC		DATA: 24/11/25 DIA DA SEMANA: Segunda Feira	
DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963 CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025 ASS. CONTRATO: 21/07/2025 O. SERV.: 23/07/2025 VALOR PROPOSTA: R\$ - PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/07/2026 DECORRIDO: 126 RESTANTE (VIGÊNCIA): 239 PRAZO DE EXECUÇÃO: 10/11/ DECORRIDO: 124 RESTANTE (EXECUÇÃO): -14			

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Imprimação Ligante Estaca 227 a 252

Aplicação de Binder Faixa B estaca 227 a 252

Escavação Carga e Transporte para Bota Fora, para abertura de Caixa para execução de Base e Sub Base Trecho estaca 10 a 24

CLIMA: ☒ SOL ☐ NUBLADO ☐ CHUVA

5. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
				x	x							x		x

Rafael Vioto
ENGENHEIRO

CREA 260237906-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA EXECUÇÃO
Leandro Santos de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras



DIÁRIO DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

N.º 6

FL.: 25

DATA: 25/11/25

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC

DIA DA SEMANA: Terça-Feira

DADOS EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025019963

CONTRATO EXECUÇÃO: 171/2025

ASS. CONTRATO:

21/07/2025

O. SERV.:

23/07/2025

VALOR PROPOSTA: R\$ -

PRAZO DE VIGÊNCIA:

21/07/2026

DECORRIDO: 127

RESTANTE (VIGÊNCIA):

238

PRAZO DE EXECUÇÃO:

10/11/7 DECORRIDO:

125

RESTANTE (EXECUÇÃO): -15

ANOTAÇÕES:

1. FISCAL DA EXECUÇÃO

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO (EXECUTORA)

Limpeza da Área Execução de Reparos para Aplicação de CBUQ trecho extra estaca 252 a 256

Imprimação Ligante para a aplicação de CBUQ Faixa C

Aplicação de Camada Final de CBUQ Faixa C

Escavação para abertura de Caixa para execução de Base e Sub Base Trecho estaca 10 a 24

CLIMA:



SOL



NUBLADO



CHUVA

3. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

FRESAGEM	RECICLAGEM DE BASE	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	PINTURA DE LIGAÇÃO	CBUQ FAIXA B	CBUQ FAIXA C	DEMOLIÇÃO	DRENAGEM SUPERFICIAL	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA	SINALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	ESTUDOS TÉCNICOS
				x		x						x		x

Rafael Vioto
ENGENHEIRO

CREA 266287006-6

FISCAL DA EXECUÇÃO
Leandro Damas de Oliveira
Assessor Executivo
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:	EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CMOC		
MEDIÇÃO Nº:	6		
MÊS DA MEDIÇÃO:	NOV	ANO:	2025
EMPRESA EXECUTORA:	EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA		
PROCESSO LICITATÓRIO	2025019963		
CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº:	171/2025		

Leandro Dias de Oliveira
Assessor Técnico de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

INSTRUÇÕES:

CAPA: Preencher os dados da obra nas células em verde.

DIA: Há uma aba específica para cada dia do mês. Preencher diariamente. Caso não tenha tido atividade no dia deixe em branco.

FOTO: Inserir ou substituir as fotos nos campos indicados. Todas as fotos devem conter as coordenadas no sistema decimal. Ex.: -16.6454, -49.2098.

TIPO DE SERVIÇO: Indicar o grupo de serviço que se refere o serviço registrado.

LONGITUDE E LATITUDE: Usar coordenadas no sistema decimal. Ex.: -16.6454, -49.2098.

LEGENDA: Breve descrição do serviço registrado.

NOME DO ARQUIVO: Todas as imagens devem ser renomeadas, enumeradas e zipadas para ser anexadas no processo.

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 15-NOV-2025
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 6



Legenda:	Base de Solo Brita
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8944
Nome do arquivo:	



Legenda:	Base de Solo Brita
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8944
Nome do arquivo:	



Legenda:	Dispositivo de Drenagem
Tipo de serviço:	DRENAGEM
Latitude:	-18,1619
Longitude:	-47,9036
Nome do arquivo:	



Legenda:	Dispositivo de Drenagem
Tipo de serviço:	DRENAGEM
Latitude:	-18,1619
Longitude:	-47,9036
Nome do arquivo:	



Legenda:	Espalhamento de Brita
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1621
Longitude:	-47,9072
Nome do arquivo:	



Legenda:	Execução de Muro Ala
Tipo de serviço:	DRENAGEM
Latitude:	-18,1651
Longitude:	-47,8984
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 17-NOV-2025
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 6



Legenda:	Complemento e Espalhamento
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1665
Longitude:	-47,8943
Nome do arquivo:	



Legenda:	Complemento e Espalhamento
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1665
Longitude:	-47,8943
Nome do arquivo:	



Legenda:	Imprimação Impermeabilizante
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1665
Longitude:	-47,8941
Nome do arquivo:	



Legenda:	Imprimação Ligante
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1668
Longitude:	-47,8957
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de Binder
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8969
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de Binder
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8969
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 18-NOV-2025
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 6



Legenda:	Complemento e Espalhamento
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1665
Longitude:	-47,8943
Nome do arquivo:	




Legenda:	Imprimação Impermeabilizante
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8945
Nome do arquivo:	



Legenda:	Imprimação Ligante
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1665
Longitude:	-47,8941
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de Binder
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8941
Nome do arquivo:	

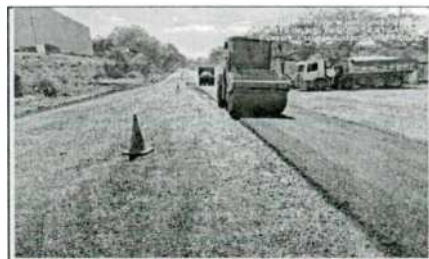


Legenda:	Aplicação de Binder
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8941
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de Binder
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8941
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA


DATA: 19-NOV-2025
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 6

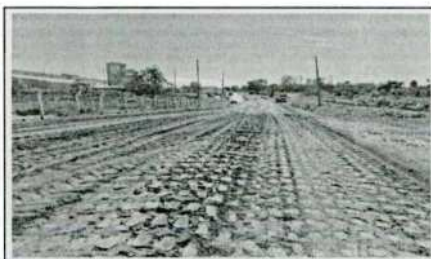

Legenda:	Complemento e Espalhamento
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1665
Longitude:	-47,8943
Nome do arquivo:	



Legenda:	Complemento e Espalhamento
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1665
Longitude:	-47,8943
Nome do arquivo:	

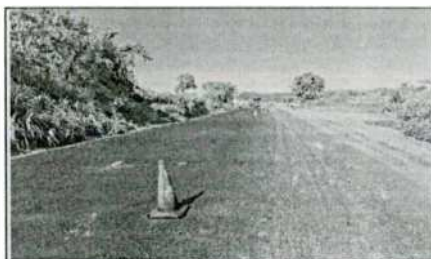

Legenda:	Pintura de Ligação
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8941
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de Binder
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8941
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de Binder
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8941
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

De: *[Assinatura]*
Secretaria Municipal de Transportes
Protocolo: 171/2025


OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM(

DATA: 20-NOV-2025

EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025


NÚMERO DA MEDIÇÃO: 6

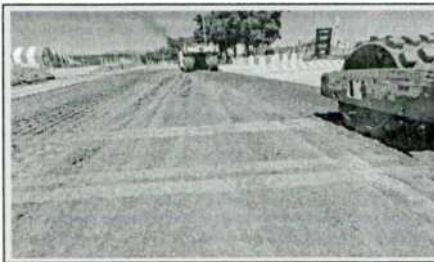

Legenda:	Base de Solo Brita
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1651
Longitude:	-47,885
Nome do arquivo:	



Legenda:	Base de Solo Brita
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1651
Longitude:	-47,885
Nome do arquivo:	

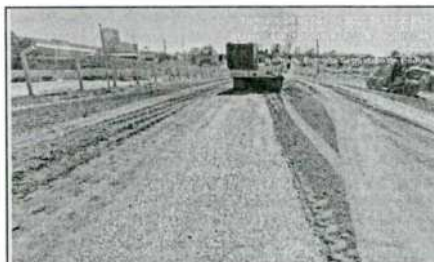

Legenda:	Aplicação de Binder
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1651
Longitude:	-47,885
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de Binder
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1661
Longitude:	-47,8876
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de Binder
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1661
Longitude:	-47,8876
Nome do arquivo:	



Legenda:	
Tipo de serviço:	
Latitude:	
Longitude:	
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 21-NOV-2025
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 6



Legenda:	Complemento e Espalhamento
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8969
Nome do arquivo:	



Legenda:	Complemento e Espalhamento
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8969
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de CBUQ
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8969
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de CBUQ
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8969
Nome do arquivo:	



Legenda:	Limpeza
Tipo de serviço:	SERVIÇOS DIVERSOS
Latitude:	-18,1673
Longitude:	-47,9199
Nome do arquivo:	



Legenda:	Limpeza
Tipo de serviço:	SERVIÇOS DIVERSOS
Latitude:	-18,1673
Longitude:	-47,9199
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 22-NOV-2025
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 6




Legenda:	Acabamento
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1648
Longitude:	-47,8842
Nome do arquivo:	




Legenda:	Pintura Ligante
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1666
Longitude:	-47,8969
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de CBUQ
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1645
Longitude:	-47,8838
Nome do arquivo:	

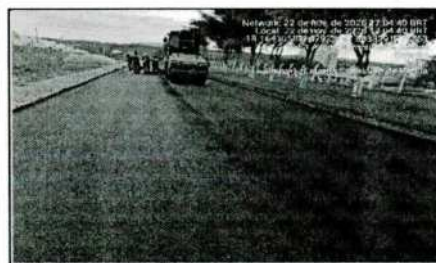

Legenda:	Aplicação de CBUQ
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1645
Longitude:	-47,8838
Nome do arquivo:	

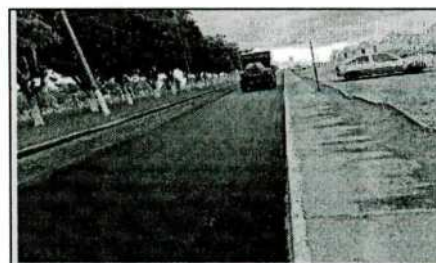

Legenda:	Aplicação de CBUQ
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1645
Longitude:	-47,8838
Nome do arquivo:	




Legenda:	Aplicação de CBUQ
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1645
Longitude:	-47,8838
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 24-NOV-2025
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 6



Legenda:	Pintura Ligante
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1641
Longitude:	-47,8832
Nome do arquivo:	

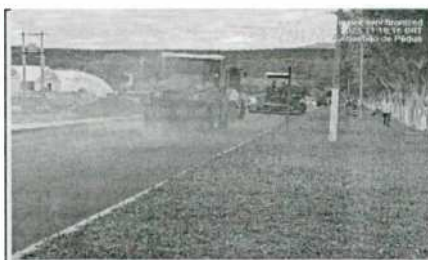

Legenda:	Aplicação de CBUQ
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1642
Longitude:	-47,8817
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de CBUQ
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1642
Longitude:	-47,8817
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de CBUQ
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1642
Longitude:	-47,8817
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de CBUQ
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1642
Longitude:	-47,8817
Nome do arquivo:	



Legenda:	Abertura de Caixa
Tipo de serviço:	SERVIÇOS DIVERSOS
Latitude:	-18,1676
Longitude:	-47,9207
Nome do arquivo:	

OBRA: EXEC. PAV. ASFÁLTICA ENTR. AV. SEBASTIÃO DE PÁDUA E A SEDE DA CM
EXECUTORA: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

DATA: 25-NOV-2025
CONTRATO DE EXECUÇÃO: 171/2025
NÚMERO DA MEDIÇÃO: 6



Legenda:	Pintura Ligante
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1641
Longitude:	-47,8832
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de CBUQ faixa C
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1618
Longitude:	-47,8797
Nome do arquivo:	




Legenda:	Aplicação de CBUQ faixa C
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1618
Longitude:	-47,8797
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de CBUQ faixa C
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1618
Longitude:	-47,8797
Nome do arquivo:	



Legenda:	Aplicação de CBUQ faixa C
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1618
Longitude:	-47,8797
Nome do arquivo:	

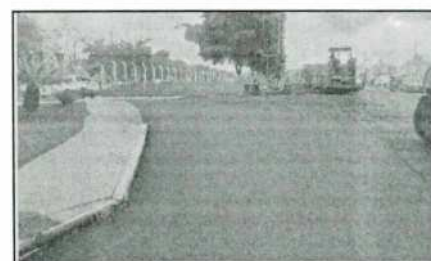

Legenda:	Aplicação de CBUQ faixa C
Tipo de serviço:	PAVIMENTAÇÃO
Latitude:	-18,1618
Longitude:	-47,8797
Nome do arquivo:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 01.505.643/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO

Nº 704797

Nome		C.P.F. /C.N.P.J.	
159523	EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA.	15.131.446/0001-22	
Endereço Completo			
ROD.BR 050 N° S/N KM-245, DISTRITO PIRES BELO, CATALAO / GO, CEP 75714300			
Inscrição Municipal			
54006830			
FIM EXPRESSO A QUE SE REFERE ESTA			

CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam pendências em seu nome, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria da Fazenda Municipal e da Procuradoria Geral da Fazenda Municipal.

Certidão emitida nos termos do art.332 e ss da Lei nº. 2.174/03 - Código Tributário do Município de Catalão. Regulamentado nos art. 126 e ss do Decreto Municipal nº 1.360/03.

Sexta-feira, 14 de Novembro de 2025.

Qualquer Rasura invalida a Certidão

Certidão valida até		Código de Validação:	
14/12/2025		11921704797	
Data/Hora impressão			
14/11/2025 - 08:15:39			



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.131.446/0001-22

Certidão nº: 51226716/2025

Expedição: 02/09/2025, às 15:58:20

Validade: 01/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.131.446/0001-22, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento
90.025.34096/78	EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	02/09/2025 09:31
Origem do cadastramento e-CAC		
Tipo Zona	ART	RRT
Zona Urbana		
CIB	Cadastro Imobiliário	
	0000	
Data do início da obra	CNAE	
10/08/2025	4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas	

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	10/08/2025

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	CATALAO	GO	75.701-970
Bairro	Logradouro	Número	
SETOR CENTRAL	RUA RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA	66	

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vinculo
EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	15.131.446/0001-22	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
10/08/2025		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
01.505.643/0001-50	MUNICIPIO DE CATALAO

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial unifamiliar	Alvenaria	48.377,80 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
48.377,80 m²



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO EM DIVIDA ATIVA - POSITIVA
COM EFEITO NEGATIVO(PARCELAMENTO)

NR. CERTIDÃO: Nº 55775466

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

CNPJ

15.131.446/0001-22

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

POR FORCA DO PARAG. UNICO, ART.195, LEI 11651/91, DE
26 DE DEZEMBRO DE 1991, ESTA CERTIDAO NAO DA DIREITO
A ALIENACAO DE QUALQUER BEM PATRIMONIAL DO SUJEITO
PASSIVO, ESPECIALMENTE BEM IMOVEL.

PROCESSOS:

2001249366630 2001249466693 2501910922226 2502333322265 ..*:*:*:*:

..*:**
::*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:**
::*:*:*:*:*:*:*:**
::*:*:*:*:*:**
::*:*:*:*:**
::*:*:*:**
::*:**
::**

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do inciso IV do artigo 3 da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Lei nr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.435.637.440

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 25 SETEMBRO DE 2025

HORA: 7:51:00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA
CNPJ: 15.131.446/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:35:40 do dia 06/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/04/2026.

Código de controle da certidão: **1217.F35D.76C9.8147**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.131.446/0001-22
Razão Social: EGP EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS LTDA
Endereço: RUA ROD BR050 KM245 245 Z RURAL / PIRES BELO / CATALAO / GO / 75714-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/10/2025 a 12/11/2025

Certificação Número: 2025101408522094686904

Informação obtida em 30/10/2025 11:43:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.131.446/0001-22		Tomador: 90.025.34096/78											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADELICIO MONTEIRO DOS SANTOS	890	158.240.981-15	101	19/11/2025	Mensal	2.858,33	228,66	0,00	0,00	0,00	228,66
10/2025		BRUNO PIRES DE CAMPOS	C01S001145	042.196.291-73	101	19/11/2025	Mensal	1.670,74	133,65	0,00	0,00	0,00	133,65
10/2025		CARLOS HENRIQUE MARTINS DA SILVA	C01S001148	303.919.168-31	101	19/11/2025	Mensal	295,47	23,63	0,00	0,00	0,00	23,63
10/2025		CRISTIANO MARCOS DE JESUS	C01S001146	931.925.411-72	101	19/11/2025	Mensal	458,94	36,71	0,00	0,00	0,00	36,71
10/2025		JOSE ARY NUNES DA SILVA	888	300.858.701-10	101	19/11/2025	Mensal	3.822,63	305,81	0,00	0,00	0,00	305,81
10/2025		LEVY RIBEIRO DE SOUZA	C01S001143	783.169.522-20	101	19/11/2025	Mensal	3.310,91	264,87	0,00	0,00	0,00	264,87
10/2025		MARCOS FELIPE JOSE SAMPAIO	C01S001144	044.052.171-81	101	19/11/2025	Mensal	3.347,10	267,76	0,00	0,00	0,00	267,76
10/2025		SILVANILDO DE JESUS BARBOSA	887	845.228.361-04	101	19/11/2025	Mensal	1.867,65	149,41	0,00	0,00	0,00	149,41
		Total do Tomador		90.025.34096/78				17.631,77	1.410,50	0,00	0,00	0,00	1.410,50
		Total do Estabelecimento		15.131.446/0001-22				72.319,57	5.785,45	0,00	0,00	0,00	5.785,45
		Total FGTS						1.521.858,15	121.747,18	0,00	0,00	0,00	121.747,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.131.446/0001-22		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALESSANDRA DE SOUSA FERREIRA PACHE	838	023.828.641-09	101	19/11/2025	Mensal	3.139,90	251,19	0,00	0,00	0,00	251,19
10/2025		AMANDA CANDIDA DA SILVA	553	067.006.171-97	101	19/11/2025	Mensal	3.138,52	251,08	0,00	0,00	0,00	251,08
10/2025		ANDREZA ALVES DA ROCHA	519	036.288.401-39	101	19/11/2025	Mensal	3.247,80	259,82	0,00	0,00	0,00	259,82
10/2025		CLEIVANIR RODRIGUES MARTINS	C01S001153	597.023.381-15	101	19/11/2025	Mensal	1.872,31	149,78	0,00	0,00	0,00	149,78
10/2025		ERCI JOSE DE OLIVEIRA	C01S001161	573.176.746-72	101	19/11/2025	Mensal	1.951,51	156,11	0,00	0,00	0,00	156,11
10/2025		GISELLE SAFATLE FAJAD GOMES	029000001	534.057.306-00	101	19/11/2025	Mensal	4.155,99	332,47	0,00	0,00	0,00	332,47
10/2025		GLEYDSON PEREIRA DA SILVA	893	013.118.541-18	101	19/11/2025	Mensal	3.835,97	306,87	0,00	0,00	0,00	306,87
10/2025		GRACIELE MARQUES DA SILVEIRA	906.273.891.20_00683.001	906.273.691-20	101	19/11/2025	Mensal	4.300,67	344,05	0,00	0,00	0,00	344,05
10/2025		IDERLAN FEITOSA DE SOUZA	029000020	423.051.603-72	101	19/11/2025	Mensal	4.081,20	326,49	0,00	0,00	0,00	326,49
10/2025		JORDANA CRISTINA DE SOUZA COSTA	680	090.964.581-76	101	19/11/2025	Mensal	1.632,51	130,60	0,00	0,00	0,00	130,60
10/2025		JOSE MARIO DOS SANTOS	881	006.333.245-07	101	19/11/2025	Mensal	3.507,25	280,58	0,00	0,00	0,00	280,58
10/2025		LUCIO MARIO FERREIRA	878	449.948.421-91	101	19/11/2025	Mensal	2.727,14	218,17	0,00	0,00	0,00	218,17
10/2025		OTONIEL CABRAL DA SILVA	624	085.120.917-38	101	19/11/2025	Mensal	4.387,33	350,98	0,00	0,00	0,00	350,98
10/2025		PAULO CESAR DA SILVA CHAVES	029000024	005.671.633-85	101	19/11/2025	Mensal	4.742,31	379,38	0,00	0,00	0,00	379,38
10/2025		RODRIGO DE FREITAS GUIMARAES	825	045.536.001-45	101	19/11/2025	Mensal	4.322,11	345,76	0,00	0,00	0,00	345,76
10/2025		UALACE CABRAL DA SILVA	029000022	137.018.957-59	101	19/11/2025	Mensal	3.645,28	291,62	0,00	0,00	0,00	291,62
				Total do Tomador	Sem Tomador			54.687,80	4.374,95	0,00	0,00	0,00	4.374,95
				Total do Estabelecimento	15.131.446/0001-22			72.319,57	5.785,45	0,00	0,00	0,00	5.785,45
					Total FGTS			1.521.858,15	121.747,18	0,00	0,00	0,00	121.747,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.131.446/0003-94		03.207.703/0001-83											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADAO GOMES DE OLIVEIRA	099009456	321.717.811-49	101	19/11/2025	Mensal	4.358,30	348,66	0,00	0,00	0,00	348,66
10/2025		ADELMO BATISTA DA SILVA	715	154.816.738-00	101	19/11/2025	Mensal	4.445,33	355,62	0,00	0,00	0,00	355,62
10/2025		ADEMIR DE MORAES	099012725	071.184.268-06	101	19/11/2025	Mensal	8.707,17	696,57	0,00	0,00	0,00	696,57
10/2025		ADRIEL CARLOS MARTINS	856	402.771.668-02	101	19/11/2025	Mensal	7.121,92	569,75	0,00	0,00	0,00	569,75
10/2025		AFONSO JERONIMO DA SILVA	627	088.611.138-73	101	19/11/2025	Mensal	3.708,84	296,70	0,00	0,00	0,00	296,70
10/2025		ALESSANDRO PEREIRA	683	411.549.738-67	101	19/11/2025	Mensal	3.862,88	309,03	0,00	0,00	0,00	309,03
10/2025		ALEX GONCALVES NUNES	355	375.194.658-61	101	19/11/2025	Mensal	3.249,56	259,96	0,00	0,00	0,00	259,96
10/2025		ALEXANDRE FRANCISCO DE CARVALHO	616	075.638.217-32	101	19/11/2025	Mensal	11.650,07	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00
10/2025		ALUIZIO ALCANTARA DA FONSECA	248	506.949.604-20	101	19/11/2025	Mensal	4.361,82	348,94	0,00	0,00	0,00	348,94
10/2025		ANA MARIA DOS SANTOS	661	326.947.668-03	101	19/11/2025	Mensal	2.523,40	201,87	0,00	0,00	0,00	201,87
10/2025		ANDERSON SOARES DE LIMA	538	393.058.178-74	101	19/11/2025	Mensal	5.573,83	445,89	0,00	0,00	0,00	445,89
10/2025		ANTONIO BARBOSA	523	061.956.188-29	101	19/11/2025	Mensal	3.286,95	262,95	0,00	0,00	0,00	262,95
10/2025		ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO	831	218.959.828-12	101	19/11/2025	Mensal	7.757,86	620,62	0,00	0,00	0,00	620,62
10/2025		ANTONIO NARDE MIRANDA	099004473	036.756.008-90	101	19/11/2025	Mensal	4.153,44	332,27	0,00	0,00	0,00	332,27
10/2025		ANTONIO NAZARE MACHADO	845	737.810.613-53	101	19/11/2025	Mensal	6.748,83	539,90	0,00	0,00	0,00	539,90
10/2025		ANTONIO REIS PEREIRA DO NASCIMENTO	657	316.206.038-96	101	19/11/2025	Mensal	4.849,18	387,93	0,00	0,00	0,00	387,93
10/2025		ANTONIO SOARES DA COSTA	231	359.997.056-49	101	19/11/2025	Mensal	5.391,67	431,33	0,00	0,00	0,00	431,33
10/2025		APARECIDO PIO RIBEIRO	099010139	158.395.148-29	101	19/11/2025	Mensal	3.469,61	277,56	0,00	0,00	0,00	277,56
10/2025		BRUNO ROMAO DA SILVA	347	358.833.658-33	101	19/11/2025	Mensal	6.320,67	505,65	0,00	0,00	0,00	505,65
10/2025		CARLOS DA CONCEICAO VIEIRA	356	623.272.233-77	101	19/11/2025	Mensal	4.262,24	340,97	0,00	0,00	0,00	340,97
10/2025		CARLOS RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA	647	221.946.698-17	101	19/11/2025	Mensal	7.125,34	570,02	0,00	0,00	0,00	570,02
10/2025		CICERO PANTA DA SILVA	771	126.929.758-98	101	19/11/2025	Mensal	3.045,24	243,61	0,00	0,00	0,00	243,61
10/2025		CLAUDIO DO NASCIMENTO PEREIRA	150	137.617.778-17	101	19/11/2025	Mensal	6.014,10	481,12	0,00	0,00	0,00	481,12
10/2025		CLAUDIO PADILHA DOS SANTOS	791	403.055.738-45	101	19/11/2025	Mensal	17.726,05	1.418,08	0,00	0,00	0,00	1.418,08
10/2025		CLAUDIO PERES RODRIGUES	09904820	182.068.968-99	101	19/11/2025	Mensal	4.735,29	378,82	0,00	0,00	0,00	378,82
10/2025		CONRADO TOMAS DE OLIVEIRA	756	400.540.518-51	101	19/11/2025	Mensal	4.791,32	383,30	0,00	0,00	0,00	383,30
10/2025		DAMIAO SALES DA SILVA	804	401.008.448-04	101	19/11/2025	Mensal	4.829,33	386,34	0,00	0,00	0,00	386,34
10/2025		DAVI SOUZA DA MOTA	444	355.802.258-06	101	19/11/2025	Mensal	3.725,92	298,07	0,00	0,00	0,00	298,07
10/2025		DEMAR ALVES DO NASCIMENTO	761	005.566.583-70	101	19/11/2025	Mensal	5.315,18	425,21	0,00	0,00	0,00	425,21
10/2025		DIMAS JOSE SIMAO DE OLIVEIRA	875	457.217.696-53	101	19/11/2025	Mensal	6.087,93	487,03	0,00	0,00	0,00	487,03
10/2025		EDI CARLOS DE ALMEIDA	099012172	204.828.808-13	101	19/11/2025	Mensal	8.227,23	658,17	0,00	0,00	0,00	658,17
10/2025		EDISON APARECIDO CRUDI	099004519	041.191.288-73	101	19/11/2025	Mensal	14.342,51	1.147,40	0,00	0,00	0,00	1.147,40
10/2025		EDUARDO CRISTIANO NUNES JESUINO	344	400.257.288-90	101	19/11/2025	Mensal	2.968,45	237,47	0,00	0,00	0,00	237,47
10/2025		EDVALDO MARIA CALDEIRA	099010527	123.479.008-46	101	19/11/2025	Mensal	4.184,63	334,77	0,00	0,00	0,00	334,77
10/2025		ELIANDRO ANTONIO HERNANDES	854	273.378.508-75	101	19/11/2025	Mensal	4.482,94	358,63	0,00	0,00	0,00	358,63
10/2025		ELIVELTON DO NASCIMENTO SILVA	364	413.191.408-58	101	19/11/2025	Mensal	2.986,07	238,88	0,00	0,00	0,00	238,88
10/2025		ELSON DE CALDAS GOMES	559	335.590.618-22	101	19/11/2025	Mensal	3.461,57	276,92	0,00	0,00	0,00	276,92
10/2025		ENIO DE MELO	099008577	936.488.716-68	101	19/11/2025	Mensal	9.941,89	795,35	0,00	0,00	0,00	795,35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.131.446/0003-94		Tomador: 03.207.703/0001-83											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ERICK ALVES DA SILVA	309	428.379.638-79	101	19/11/2025	Mensal	8.981,01	718,48	0,00	0,00	0,00	718,48
10/2025		ERNESTO TESTA JUNIOR	099006201	834.336.788-04	101	19/11/2025	Mensal	10.263,77	821,10	0,00	0,00	0,00	821,10
10/2025		EVALDO DE OLIVEIRA SILVA	341	261.559.558-08	101	19/11/2025	Mensal	4.591,45	367,31	0,00	0,00	0,00	367,31
10/2025		EVERALDO ANDRADE DE OLIVEIRA	759	140.726.768-02	101	19/11/2025	Mensal	4.244,76	339,58	0,00	0,00	0,00	339,58
10/2025		FABIANO CORDEIRO DOS SANTOS	674	128.666.347-48	101	19/11/2025	Mensal	3.948,79	315,90	0,00	0,00	0,00	315,90
10/2025		FABRICIA SOARES DE OLIVEIRA MOREIRA	601	069.433.256-98	101	19/11/2025	Mensal	2.843,21	227,45	0,00	0,00	0,00	227,45
10/2025		FELIPE DE OLIVEIRA DELMONDES DE ALEN	677	452.198.968-30	101	19/11/2025	Mensal	3.829,00	306,32	0,00	0,00	0,00	306,32
10/2025		FELIPE PISTELLI	C01S001156	390.392.398-27	101	19/11/2025	Mensal	7.488,12	599,04	0,00	0,00	0,00	599,04
10/2025		FRANCISCO DENEZIO DE SIQUEIRA	099004553	585.292.846-15	101	19/11/2025	Mensal	4.624,72	369,97	0,00	0,00	0,00	369,97
10/2025		FRANCISCO FURTADO DE SANTANA	099004554	325.694.243-15	101	19/11/2025	Mensal	5.881,11	470,48	0,00	0,00	0,00	470,48
10/2025		FRANCISCO RIBEIRO CARDOSO	099004562	785.556.823-53	101	19/11/2025	Mensal	22.361,21	1.788,89	0,00	0,00	0,00	1.788,89
10/2025		GASPAR NEVES DUARTE FILHO	369	784.405.486-72	101	19/11/2025	Mensal	8.570,58	685,64	0,00	0,00	0,00	685,64
10/2025		GENILSON FERREIRA DA SILVA	768	404.047.118-04	101	19/11/2025	Mensal	3.647,43	291,79	0,00	0,00	0,00	291,79
10/2025		GERSON DA SILVA	731	163.179.698-41	101	19/11/2025	Mensal	3.204,36	256,34	0,00	0,00	0,00	256,34
10/2025		ILDO LEOPOLDINO	C01S001183	252.130.428-05	101	19/11/2025	Mensal	797,28	63,78	0,00	0,00	0,00	63,78
10/2025		ISAAC DOS SANTOS	729	298.549.068-50	101	19/11/2025	Mensal	3.333,21	266,65	0,00	0,00	0,00	266,65
10/2025		JAQUELINE HOSANA GERONASSO	770	454.726.128-88	101	19/11/2025	Mensal	2.447,69	195,81	0,00	0,00	0,00	195,81
10/2025		JOAO BOSCO MARQUES PINHEIRO	618	169.928.258-79	101	19/11/2025	Mensal	6.521,27	521,70	0,00	0,00	0,00	521,70
10/2025		JOAO ERIVALDO VIDAL SALVIANO	652	426.216.153-68	101	19/11/2025	Mensal	8.613,63	689,09	0,00	0,00	0,00	689,09
10/2025		JOAO FREITAS CARDOZO	C01S001155	141.236.358-65	101	19/11/2025	Mensal	7.883,18	630,65	0,00	0,00	0,00	630,65
10/2025		JOAO GUALBERTO DE AGUILAR NETO	844	457.982.558-67	101	19/11/2025	Mensal	5.753,76	460,30	0,00	0,00	0,00	460,30
10/2025		JOAO VICTOR SANTANA CARNEIRO ARANHA	378	543.442.178-70	101	19/11/2025	Mensal	3.085,98	246,87	0,00	0,00	0,00	246,87
10/2025		JOHNNY DOS SANTOS TANAN	099009228	329.498.028-00	101	19/11/2025	Mensal	9.639,32	771,14	0,00	0,00	0,00	771,14
10/2025		JOSE ADAILSON PEREIRA LIMA	310	082.566.788-79	101	19/11/2025	Mensal	5.391,67	431,33	0,00	0,00	0,00	431,33
10/2025		JOSE ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS	099013024	015.031.755-70	101	19/11/2025	Mensal	5.172,76	413,82	0,00	0,00	0,00	413,82
10/2025		JOSE BENEDITO MANOEL CANDIDO	099008521	216.591.696-44	101	19/11/2025	Mensal	4.672,76	373,82	0,00	0,00	0,00	373,82
10/2025		JOSE CICERO FLORENTINO DA SILVA	362	044.459.054-45	101	19/11/2025	Mensal	4.678,82	374,30	0,00	0,00	0,00	374,30
10/2025		JOSE COITINHO	099006545	734.485.679-49	101	19/11/2025	Mensal	5.841,43	467,31	0,00	0,00	0,00	467,31
10/2025		JOSE FERNANDO HENCKLEIN	706	285.398.898-89	101	19/11/2025	Mensal	4.626,59	370,12	0,00	0,00	0,00	370,12
10/2025		JOSE MARIA DA SILVA	099011974	529.934.184-91	101	19/11/2025	Mensal	8.575,39	686,03	0,00	0,00	0,00	686,03
10/2025		JOSE NEWTON FILGUEIRA	812	844.724.993-04	101	19/11/2025	Mensal	4.738,30	379,06	0,00	0,00	0,00	379,06
10/2025		JOSE REGINATO DOMINGOS	099004632	101.577.308-75	101	19/11/2025	Mensal	11.866,52	949,32	0,00	0,00	0,00	949,32
10/2025		JOSE ROSELINO PINTO	662	897.555.709-00	101	19/11/2025	Mensal	5.920,74	473,65	0,00	0,00	0,00	473,65
10/2025		JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA	848	413.710.418-22	101	19/11/2025	Mensal	5.544,06	443,52	0,00	0,00	0,00	443,52
10/2025		JOSIEL MICHAEL FRANCISCO	360	365.215.168-25	101	19/11/2025	Mensal	3.053,84	244,30	0,00	0,00	0,00	244,30
10/2025		JULIO APOLINARIO SANTOS FILHO	796	806.995.615-15	101	19/11/2025	Mensal	5.494,02	439,52	0,00	0,00	0,00	439,52
10/2025		JULIO CESAR FONTES FORTUNATO FILHO	711	508.158.588-25	101	19/11/2025	Mensal	2.514,22	201,13	0,00	0,00	0,00	201,13
10/2025		LEANDRO DE SOUZA	532	960.550.499-53	101	19/11/2025	Mensal	5.825,69	466,05	0,00	0,00	0,00	466,05

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.131.446/0003-94		Tomador: 03.207.703/0001-83											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		LEONARDO JOSE DOS SANTOS	861	109.426.914-07	101	19/11/2025	Mensal	4.192,77	335,42	0,00	0,00	0,00	335,42
10/2025		LUCAS DANIEL DA SILVA	847	131.176.904-84	101	19/11/2025	Mensal	4.044,03	323,52	0,00	0,00	0,00	323,52
10/2025		LUCAS FEITOSA CAETANO	619	336.866.998-26	101	19/11/2025	Mensal	9.337,59	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
10/2025		LUCAS MIGUEL DOS SANTOS	701	443.622.628-06	101	19/11/2025	Mensal	2.668,19	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45
10/2025		LUCIO BASILIO DE MEDEIROS	663	649.273.934-53	101	19/11/2025	Mensal	11.499,45	919,95	0,00	0,00	0,00	919,95
10/2025		LUIZ GONZAGA ALVES DE MORAIS	626	271.214.798-77	101	19/11/2025	Mensal	6.320,03	505,60	0,00	0,00	0,00	505,60
10/2025		LUIZ HENRIQUE TIOTIA DE OLIVEIRA	743	444.387.198-52	101	19/11/2025	Mensal	3.345,72	267,65	0,00	0,00	0,00	267,65
10/2025		MANUEL PEDRO REGO LICA	840	603.135.063-70	101	19/11/2025	Mensal	4.342,33	347,38	0,00	0,00	0,00	347,38
10/2025		MARCIO LIMA COSTA	361	020.116.593-70	101	19/11/2025	Mensal	2.922,95	233,83	0,00	0,00	0,00	233,83
10/2025		MARCOS FABIANO FERLETI	612	164.539.928-17	101	19/11/2025	Mensal	8.898,35	711,86	0,00	0,00	0,00	711,86
10/2025		MARIVALDO GUILHERME ESTEVES	842	009.682.384-40	101	19/11/2025	Mensal	4.838,53	387,08	0,00	0,00	0,00	387,08
10/2025		MIGUEL INACIO DA SILVA JUNIOR	366	589.220.268-20	101	19/11/2025	Mensal	3.224,65	257,97	0,00	0,00	0,00	257,97
10/2025		MIGUEL PORFIRIO	C01S001162	281.911.398-20	101	19/11/2025	Mensal	2.978,34	238,25	0,00	0,00	0,00	238,25
10/2025		MISAEI PEREIRA DE SOUZA	688	111.921.246-42	101	19/11/2025	Mensal	4.596,54	367,72	0,00	0,00	0,00	367,72
10/2025		MOIZES SANTINO DOS SANTOS	099010945	507.434.579-00	101	19/11/2025	Mensal	4.610,79	368,86	0,00	0,00	0,00	368,86
10/2025		OSAIR NUNES DE OLIVEIRA	C01S001166	041.915.347-00	101	19/11/2025	Mensal	5.526,58	442,12	0,00	0,00	0,00	442,12
10/2025		OSVALDO MEDEIROS DA SILVA	099005585	327.596.198-50	101	19/11/2025	Mensal	10.983,76	878,70	0,00	0,00	0,00	878,70
10/2025		PAULO CESAR DA SILVA MENDES	846	387.194.118-20	101	19/11/2025	Mensal	3.084,94	246,79	0,00	0,00	0,00	246,79
10/2025		PAULO DI SESSA JUNIOR	667	095.949.158-97	101	19/11/2025	Mensal	6.434,44	514,75	0,00	0,00	0,00	514,75
10/2025		PAULO DONISETI DE OLIVEIRA	723	259.771.848-40	101	19/11/2025	Mensal	3.223,95	257,91	0,00	0,00	0,00	257,91
10/2025		PAULO VICTOR FERREIRA COSTA	C01S001167	164.284.337-70	101	19/11/2025	Mensal	4.396,02	351,68	0,00	0,00	0,00	351,68
10/2025		RAPHAEL JOSE DA SILVA	779	405.299.688-78	101	19/11/2025	Mensal	2.539,49	203,15	0,00	0,00	0,00	203,15
10/2025		REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	099004714	158.576.818-98	101	19/11/2025	Mensal	5.394,23	431,53	0,00	0,00	0,00	431,53
10/2025		RENAN DOS SANTOS PEREIRA	493	238.990.118-21	101	19/11/2025	Mensal	3.737,39	298,99	0,00	0,00	0,00	298,99
10/2025		RENATO DOS SANTOS LIMA	615	036.430.517-78	101	19/11/2025	Mensal	5.546,17	443,69	0,00	0,00	0,00	443,69
10/2025		RENATO SANTOS DA MOTA	129	401.334.418-14	101	19/11/2025	Mensal	7.605,11	608,40	0,00	0,00	0,00	608,40
10/2025		RODRIGO PARANHOS SANTOS	482	345.360.088-61	101	19/11/2025	Mensal	8.717,55	697,40	0,00	0,00	0,00	697,40
10/2025		ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS	431	184.882.928-05	101	19/11/2025	Mensal	9.433,00	754,64	0,00	0,00	0,00	754,64
10/2025		RONALDO JOSE DEL CHIARO	787	131.675.218-64	101	19/11/2025	Mensal	4.358,17	348,65	0,00	0,00	0,00	348,65
10/2025		ROSIMEIRE BARBOSA DE CAMPOS	C01S001165	165.991.088-90	101	19/11/2025	Mensal	2.571,04	205,68	0,00	0,00	0,00	205,68
10/2025		RUI FELIX DA SILVA JUNIOR	772	388.658.368-65	101	19/11/2025	Mensal	3.982,39	318,59	0,00	0,00	0,00	318,59
10/2025		RYAN BARBOSA DA SILVA	488	596.851.338-16	101	19/11/2025	Mensal	3.268,71	261,49	0,00	0,00	0,00	261,49
10/2025		RYAN HENRIQUE CARVALHO SANTOS	686	241.873.928-74	101	19/11/2025	Mensal	4.470,82	357,66	0,00	0,00	0,00	357,66
10/2025		SEBASTIAO SOARES	099013156	101.905.928-18	101	19/11/2025	Mensal	6.309,22	504,73	0,00	0,00	0,00	504,73
10/2025		SIDNEI SALTAO	826	158.482.098-55	101	19/11/2025	Mensal	8.070,43	645,63	0,00	0,00	0,00	645,63
10/2025		SINVAL CORREIA DA SILVA	099007501	059.185.448-10	101	19/11/2025	Mensal	3.866,67	309,33	0,00	0,00	0,00	309,33
10/2025		SIVALDO SANTANA BARBOSA	099011255	425.054.398-69	101	19/11/2025	Mensal	11.265,55	901,24	0,00	0,00	0,00	901,24
10/2025		THALITA BELEMEL DE OLIVEIRA	C01S001178	557.797.888-20	101	19/11/2025	Mensal	3.079,76	246,38	0,00	0,00	0,00	246,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.131.446/0003-94		Tomador:		03.207.703/0001-83							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		TIAGO DA SILVA MARIANO	755	471.569.368-24	101	19/11/2025	Mensal	3.813,41	305,07	0,00	0,00	0,00	305,07
10/2025		TIAGO FRUTUOSO DE SOUZA	370	289.433.288-26	101	19/11/2025	Mensal	4.323,87	345,90	0,00	0,00	0,00	345,90
10/2025		UILSON FRANCISCO DA SILVA	415	876.556.249-68	101	19/11/2025	Mensal	9.163,54	733,08	0,00	0,00	0,00	733,08
10/2025		VAGNER HENRIQUE PEREIRA DE AVILA	512	147.099.036-97	101	19/11/2025	Mensal	4.566,74	365,33	0,00	0,00	0,00	365,33
10/2025		VALDINEI ALVES DE SOUZA	753	191.647.398-99	101	19/11/2025	Mensal	5.712,91	457,03	0,00	0,00	0,00	457,03
10/2025		VALDIR APARECIDO DO NASCIMENTO	712	245.689.788-90	101	19/11/2025	Mensal	7.391,35	591,30	0,00	0,00	0,00	591,30
10/2025		VALMOR FERREIRA DOS SANTOS	868	841.537.769-04	101	19/11/2025	Mensal	5.735,82	458,86	0,00	0,00	0,00	458,86
10/2025		VANDERLEI DONISETI DA SILVA	687	106.719.878-44	101	19/11/2025	Mensal	7.830,08	626,40	0,00	0,00	0,00	626,40
10/2025		VANDERLEI RODRIGUES	794	067.593.298-05	101	19/11/2025	Mensal	7.963,29	637,06	0,00	0,00	0,00	637,06
10/2025		VERSI ANDRE MANZALI	312	108.815.678-92	101	19/11/2025	Mensal	6.145,21	491,81	0,00	0,00	0,00	491,81
10/2025		WESLEY JOSE DA SILVA	377	421.955.858-62	101	19/11/2025	Mensal	4.072,63	325,81	0,00	0,00	0,00	325,81
10/2025		WILLIAN NEVES SILVA	766	048.107.805-38	101	19/11/2025	Mensal	3.933,60	314,68	0,00	0,00	0,00	314,68
10/2025		WILSON JOSE MACHADO	651	115.209.998-10	101	19/11/2025	Mensal	3.660,65	292,85	0,00	0,00	0,00	292,85
Total do Tomador 03.207.703/0001-83								726.264,96	58.100,57	0,00	0,00	0,00	58.100,57
Total do Estabelecimento 15.131.446/0003-94								1.449.538,58	115.961,73	0,00	0,00	0,00	115.961,73
Total FGTS								1.521.858,15	121.747,18	0,00	0,00	0,00	121.747,18



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.025.34096/78	Nome da obra EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	Data do cadastramento 02/09/2025 09:31
Origem do cadastramento e-CAC		
Tipo Zona Zona Urbana	ART	RRT
	CIB	Cadastro Imobiliário 0000
Data do início da obra 10/08/2025	CNAE 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 10/08/2025
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município CATALAO	UF GO	CEP 75.701-970
Bairro SETOR CENTRAL	Logradouro RUA RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA	Número 66	

Responsável

Nome EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA	CPF/CNPJ 15.131.446/0001-22	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 10/08/2025	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
01.505.643/0001-50	MUNICIPIO DE CATALAO

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial unifamiliar	Alvenaria	48.377,80 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 48.377,80 m²
--

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADILSON CORREIA	C01S001180	343.523.528-45	101	19/11/2025	Mensal	2.311,38	184,91	0,00	0,00	0,00	184,91
10/2025		ADRIANO RAMOS SOARES	332	088.741.266-11	101	19/11/2025	Mensal	4.405,04	352,40	0,00	0,00	0,00	352,40
10/2025		ANDRE RODRIGUES DECIO	099013501	062.284.049-54	101	19/11/2025	Mensal	5.364,32	429,14	0,00	0,00	0,00	429,14
10/2025		ANTONIO DONIZETI DOS SANTOS	099013459	142.147.368-26	101	19/11/2025	Mensal	4.707,17	376,57	0,00	0,00	0,00	376,57
10/2025		ANTONIO DOS SANTOS MENEZES	099012968	689.871.703-06	101	19/11/2025	Mensal	3.774,05	301,92	0,00	0,00	0,00	301,92
10/2025		APARECIDO BATISTA DA SILVA	782	057.683.268-55	101	19/11/2025	Mensal	2.847,66	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81
10/2025		CARLOS ROBERTO RIGUI	252	068.124.828-97	101	19/11/2025	Mensal	5.030,62	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
10/2025		CASSIANO SENA MOREIRA	338	443.305.488-79	101	19/11/2025	Mensal	2.760,23	220,81	0,00	0,00	0,00	220,81
10/2025		CICERO OSCAR DE SOUZA PRIMO	709	078.639.618-07	101	19/11/2025	Mensal	2.667,84	213,42	0,00	0,00	0,00	213,42
10/2025		CLEBER LEMES DOS SANTOS	C01S001159	405.840.788-38	101	19/11/2025	Mensal	2.981,95	238,55	0,00	0,00	0,00	238,55
10/2025		CLOVES MOREIRA DE MAGALHAES	600	109.408.868-47	101	19/11/2025	Mensal	6.421,30	513,70	0,00	0,00	0,00	513,70
10/2025		CLOVIS FRANCA	337	087.629.918-41	101	19/11/2025	Mensal	3.488,23	279,05	0,00	0,00	0,00	279,05
10/2025		CLOVIS RODRIGUES DA SILVA	598	058.719.208-96	101	19/11/2025	Mensal	3.288,85	263,10	0,00	0,00	0,00	263,10
10/2025		DANIEL EVANGELISTA DO PRADO	099013191	451.116.688-96	101	19/11/2025	Mensal	4.870,14	389,61	0,00	0,00	0,00	389,61
10/2025		DORIVAL CARDOSO	099012683	027.206.018-61	101	19/11/2025	Mensal	4.554,23	364,33	0,00	0,00	0,00	364,33
10/2025		ELIAS AMORIM SILVA	099013479	357.757.185-34	101	19/11/2025	Mensal	6.203,94	496,31	0,00	0,00	0,00	496,31
10/2025		FABIO HENRIQUE MARTINS	517	300.263.458-11	101	19/11/2025	Mensal	3.639,18	291,13	0,00	0,00	0,00	291,13
10/2025		FABIO INACIO VICENTE	265	918.143.321-20	101	19/11/2025	Mensal	4.245,09	339,60	0,00	0,00	0,00	339,60
10/2025		FERNANDO ALVES DE SOUZA JUNIOR	099013543	095.486.268-81	101	19/11/2025	Mensal	2.649,42	211,95	0,00	0,00	0,00	211,95
10/2025		GILDASIO LIMA PIRES	099013484	035.978.795-94	101	19/11/2025	Mensal	4.850,64	388,05	0,00	0,00	0,00	388,05
10/2025		GUILHERME RODRIGUES	C01S001160	431.219.378-98	101	19/11/2025	Mensal	2.634,98	210,79	0,00	0,00	0,00	210,79
10/2025		ISMAEL DA SILVA SANTOS	099013541	069.761.804-86	101	19/11/2025	Mensal	2.886,43	230,91	0,00	0,00	0,00	230,91
10/2025		JAIR TEIXEIRA DO AMARAL	099005853	099.859.078-92	101	19/11/2025	Mensal	6.181,08	494,48	0,00	0,00	0,00	494,48
10/2025		JESSIELSON GOMES BECERRA	C01S001151	395.653.808-08	101	19/11/2025	Mensal	3.141,95	251,35	0,00	0,00	0,00	251,35
10/2025		JOAO BATISTA POCAIA	456	958.126.448-53	101	19/11/2025	Mensal	3.715,27	297,22	0,00	0,00	0,00	297,22
10/2025		JOSE BARBOSA NETO	775	095.547.998-37	101	19/11/2025	Mensal	3.572,37	285,78	0,00	0,00	0,00	285,78
10/2025		JOSE CARLOS DA SILVEIRA	099013226	285.462.288-09	101	19/11/2025	Mensal	6.158,73	492,69	0,00	0,00	0,00	492,69
10/2025		JOSE CORDEIRO DOS SANTOS	710	035.814.024-24	101	19/11/2025	Mensal	3.111,63	248,93	0,00	0,00	0,00	248,93
10/2025		JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA	780	136.335.588-02	101	19/11/2025	Mensal	2.836,21	226,89	0,00	0,00	0,00	226,89
10/2025		JOSE ROBERTO PIMENTEL	099013522	101.480.618-69	101	19/11/2025	Mensal	2.659,89	212,79	0,00	0,00	0,00	212,79
10/2025		JULIANO BUENO DE OLIVEIRA	099013198	382.768.688-84	101	19/11/2025	Mensal	2.877,27	230,18	0,00	0,00	0,00	230,18
10/2025		JURACI BORGES DE SOUSA	099013454	433.056.603-68	101	19/11/2025	Mensal	5.115,61	409,24	0,00	0,00	0,00	409,24
10/2025		KLAUSS EDUARDO DE ROSSI SALGADO	697	906.610.281-00	101	19/11/2025	Mensal	3.912,39	312,99	0,00	0,00	0,00	312,99
10/2025		LAERCIO ROCHA COSTA	099013380	038.050.038-89	101	19/11/2025	Mensal	4.839,86	387,18	0,00	0,00	0,00	387,18
10/2025		LUCAS EDUARDO GOMES BORGES	C01S001150	450.571.238-90	101	19/11/2025	Mensal	2.936,74	234,93	0,00	0,00	0,00	234,93
10/2025		LUCAS FERNANDES	793	336.106.848-79	101	19/11/2025	Mensal	4.119,54	329,56	0,00	0,00	0,00	329,56
10/2025		LUIZ CARLOS GOMES FERREIRA	552	023.627.448-17	101	19/11/2025	Mensal	4.052,78	324,22	0,00	0,00	0,00	324,22
10/2025		MARCELO LOPES ROSA	099008373	294.976.658-73	101	19/11/2025	Mensal	10.628,93	850,31	0,00	0,00	0,00	850,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MARCELO RODRIGUES XAVIER	740	349.995.038-32	101	19/11/2025	Mensal	4.042,35	323,38	0,00	0,00	0,00	323,38
10/2025		MARCIO GONCALVES DA SILVA	516	145.927.028-24	101	19/11/2025	Mensal	4.088,42	327,07	0,00	0,00	0,00	327,07
10/2025		MARLUCIO RODRIGUES FAGUNDES	693	098.356.968-10	101	19/11/2025	Mensal	6.592,09	527,36	0,00	0,00	0,00	527,36
10/2025		MATHEUS HENRIQUE LEONARDO DA SILVA	696	555.683.098-33	101	19/11/2025	Mensal	3.238,72	259,09	0,00	0,00	0,00	259,09
10/2025		MATIAS FORTUNATO FERNANDES	099013471	425.820.338-63	101	19/11/2025	Mensal	3.685,42	294,83	0,00	0,00	0,00	294,83
10/2025		NELRY FERREIRA CREMA	563	337.201.248-86	101	19/11/2025	Mensal	3.539,58	283,16	0,00	0,00	0,00	283,16
10/2025		PEDRO EVANGELISTA DO PRADO	420	425.769.138-73	101	19/11/2025	Mensal	2.876,55	230,12	0,00	0,00	0,00	230,12
10/2025		ROBERTO PORTO	91	633.487.807-72	101	19/11/2025	Mensal	10.988,79	879,10	0,00	0,00	0,00	879,10
10/2025		RODRIGO DE ALMEIDA	263	694.817.841-34	101	19/11/2025	Mensal	2.677,58	214,20	0,00	0,00	0,00	214,20
10/2025		RODRIGO JOSE DA SILVA	578	342.544.488-30	101	19/11/2025	Mensal	5.844,54	467,56	0,00	0,00	0,00	467,56
10/2025		ROGERIO JOSE DO NASCIMENTO	099004726	067.243.398-20	101	19/11/2025	Mensal	12.179,79	974,38	0,00	0,00	0,00	974,38
10/2025		RONIS CARLOS PEREIRA	C01S001179	098.137.658-44	101	19/11/2025	Mensal	2.237,63	179,01	0,00	0,00	0,00	179,01
10/2025		RYAN FELIPE MENDES PEREIRA	342	395.635.508-38	101	19/11/2025	Mensal	1.420,01	113,59	0,00	0,00	0,00	113,59
10/2025		SILVIA MILANEZ	556	216.032.938-09	101	19/11/2025	Mensal	3.345,69	267,65	0,00	0,00	0,00	267,65
10/2025		THIAGO BELAO CALDANA	717	328.325.098-78	101	19/11/2025	Mensal	3.648,87	291,74	0,00	0,00	0,00	291,74
10/2025		THIAGO LEME COTIAS	099013490	329.398.948-92	101	19/11/2025	Mensal	7.487,25	598,98	0,00	0,00	0,00	598,98
10/2025		UBIRACY ALVES BARBOSA	099008148	376.891.345-72	101	19/11/2025	Mensal	6.105,69	488,45	0,00	0,00	0,00	488,45
10/2025		VALDIR APARECIDO ULDERICO	738	067.398.258-07	101	19/11/2025	Mensal	3.568,95	285,51	0,00	0,00	0,00	285,51
10/2025		VALDIR MARANI	099013398	078.609.408-76	101	19/11/2025	Mensal	3.601,42	288,11	0,00	0,00	0,00	288,11
10/2025		VALDIR PIRES	099013520	019.969.858-92	101	19/11/2025	Mensal	6.442,08	515,36	0,00	0,00	0,00	515,36
10/2025		VALMIR VIEIRA DE MATOS	013000384	067.439.978-11	101	19/11/2025	Mensal	5.152,52	412,20	0,00	0,00	0,00	412,20
					Total do Tomador		10.635.691/0001-53	259.204,88	20.736,09	0,00	0,00	0,00	20.736,09
					Total do Estabelecimento		15.131.446/0003-94	1.449.538,58	115.961,73	0,00	0,00	0,00	115.961,73
					Total FGTS			1.521.858,15	121.747,18	0,00	0,00	0,00	121.747,18

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

121.747,18

Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.131.446/0003-94		Tomador: 51.235.24935/74											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADRIANO SOUZA GOMES	141	415.217.378-51	101	19/11/2025	Mensal	3.741,17	299,29	0,00	0,00	0,00	299,29
10/2025		ALISSON PEREIRA DA SILVA	133	860.760.365-59	101	19/11/2025	Mensal	5.363,42	429,07	0,00	0,00	0,00	429,07
10/2025		ANDRE COSTA DA SILVA	132	222.831.978-30	101	19/11/2025	Mensal	8.148,08	651,84	0,00	0,00	0,00	651,84
10/2025		ANTONIO CANTUÁRIO DE SOUSA	09900961	565.425.263-15	101	19/11/2025	Mensal	3.914,85	313,17	0,00	0,00	0,00	313,17
10/2025		ANTONIO LISBOA RODRIGUES	799	239.851.778-05	101	19/11/2025	Mensal	3.071,76	245,74	0,00	0,00	0,00	245,74
10/2025		ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	112	025.371.559-80	101	19/11/2025	Mensal	4.196,93	335,75	0,00	0,00	0,00	335,75
10/2025		BRUNO STEFANI DOS SANTOS	445	399.571.728-40	101	19/11/2025	Mensal	7.761,39	620,91	0,00	0,00	0,00	620,91
10/2025		CARLOS MASCARENHAS	099012003	084.232.308-21	101	19/11/2025	Mensal	6.496,06	519,68	0,00	0,00	0,00	519,68
10/2025		CARLOS ROBERTO BAPTISTA	099013455	443.422.256-20	101	19/11/2025	Mensal	11.540,54	923,24	0,00	0,00	0,00	923,24
10/2025		CICERO BELO DOS SANTOS	188	116.962.458-85	101	19/11/2025	Mensal	5.094,88	407,59	0,00	0,00	0,00	407,59
10/2025		CLAUDIO ANDRADE MOTA	843	902.590.922-15	101	19/11/2025	Mensal	3.529,04	282,32	0,00	0,00	0,00	282,32
10/2025		DAVINO JOSE DA SILVA	190	889.184.327-04	101	19/11/2025	Mensal	7.383,49	590,67	0,00	0,00	0,00	590,67
10/2025		DOUGLAS ALEXANDRE BARBOSA	803	563.388.788-37	101	19/11/2025	Mensal	3.483,94	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71
10/2025		EDILSON ELOI LIMA	460	831.342.713-20	101	19/11/2025	Mensal	8.524,95	681,99	0,00	0,00	0,00	681,99
10/2025		EDVALDO GONCALVES DE LIRA	234	222.823.348-09	101	19/11/2025	Mensal	9.320,62	745,64	0,00	0,00	0,00	745,64
10/2025		EUZIMAR DA CONCEICAO	099008333	889.818.603-78	101	19/11/2025	Mensal	3.940,24	315,21	0,00	0,00	0,00	315,21
10/2025		EVERALDO DA PAIXAO SANTOS	411	715.979.215-72	101	19/11/2025	Mensal	3.270,90	261,67	0,00	0,00	0,00	261,67
10/2025		EZEQUIEL ANTONIO DA SILVA	412	417.392.108-08	101	19/11/2025	Mensal	4.777,39	382,19	0,00	0,00	0,00	382,19
10/2025		EZEQUIEL NUNES	099013013	119.179.608-67	101	19/11/2025	Mensal	3.832,84	306,62	0,00	0,00	0,00	306,62
10/2025		FABIANO NERVA LUIZ	862	335.947.118-03	101	19/11/2025	Mensal	7.630,50	610,44	0,00	0,00	0,00	610,44
10/2025		FABIO NUNES DE SOUSA	142	023.765.303-69	101	19/11/2025	Mensal	4.121,65	329,73	0,00	0,00	0,00	329,73
10/2025		FRANCISCO JOCA DE SOUSA	137	116.103.648-21	101	19/11/2025	Mensal	3.479,86	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
10/2025		JOAO PAULO AMANCIO FERREIRA	509	224.567.428-69	101	19/11/2025	Mensal	3.836,84	306,93	0,00	0,00	0,00	306,93
10/2025		JOSE ANTONIO DOS SANTOS	508	085.154.008-20	101	19/11/2025	Mensal	4.520,07	361,60	0,00	0,00	0,00	361,60
10/2025		JOSE ANTONIO LAZZO	85	125.040.748-67	101	19/11/2025	Mensal	5.324,23	425,93	0,00	0,00	0,00	425,93
10/2025		JOSE DONISETE VILAS BOAS	149	786.357.566-49	101	19/11/2025	Mensal	3.229,17	258,33	0,00	0,00	0,00	258,33
10/2025		JOSE GERALDO DE ALMEIDA	157	507.480.686-00	101	19/11/2025	Mensal	3.229,03	258,32	0,00	0,00	0,00	258,32
10/2025		JOSE LUIS PEREIRA	502	350.028.998-38	101	19/11/2025	Mensal	4.224,95	337,98	0,00	0,00	0,00	337,98
10/2025		JOSE MARIA SILVA	120	709.371.413-72	101	19/11/2025	Mensal	2.764,13	221,13	0,00	0,00	0,00	221,13
10/2025		JOSE ROBERTO SIMAO	099010239	103.059.668-98	101	19/11/2025	Mensal	4.803,61	384,28	0,00	0,00	0,00	384,28
10/2025		JOSIEL DA SILVA PEREIRA	126	227.007.368-18	101	19/11/2025	Mensal	9.273,74	741,89	0,00	0,00	0,00	741,89
10/2025		JULIO CESAR SANTANA BARBOSA	599	577.732.488-69	101	19/11/2025	Mensal	3.796,18	303,69	0,00	0,00	0,00	303,69
10/2025		LUCIANO SIQUEIRA TENORIO	099009655	276.369.668-67	101	19/11/2025	Mensal	6.389,27	511,14	0,00	0,00	0,00	511,14
10/2025		LUIS PAULO FERREIRA DA SILVA	139	408.629.738-80	101	19/11/2025	Mensal	4.419,19	353,53	0,00	0,00	0,00	353,53
10/2025		MAGNO RODRIGUES DOS SANTOS	475	217.555.448-12	101	19/11/2025	Mensal	5.124,27	409,94	0,00	0,00	0,00	409,94
10/2025		MARCOS AUGUSTO HERDEIRO	217	428.539.758-78	101	19/11/2025	Mensal	3.559,64	284,77	0,00	0,00	0,00	284,77
10/2025		MARIVAL APARECIDO CORDEIRO DE JESUS	494	180.706.858-75	101	19/11/2025	Mensal	6.060,93	484,87	0,00	0,00	0,00	484,87
10/2025		MILTON MARCELO FELIX DE MOURA	189	264.378.798-66	101	19/11/2025	Mensal	6.235,52	498,84	0,00	0,00	0,00	498,84

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.131.446/0003-94		51.235.24935/74											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		NILDOMAR AMORIM SILVA	099010238	044.997.905-90	101	19/11/2025	Mensal	3.775,80	302,06	0,00	0,00	0,00	302,06
10/2025		OSMAR PEREIRA DE SOUZA	181	643.966.141-87	101	19/11/2025	Mensal	5.264,08	421,12	0,00	0,00	0,00	421,12
10/2025		RAFAEL CARLOS DE GODOY	827	365.796.758-37	101	19/11/2025	Mensal	2.489,48	199,15	0,00	0,00	0,00	199,15
10/2025		RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE CASTRO	524	913.966.973-49	101	19/11/2025	Mensal	3.310,71	264,85	0,00	0,00	0,00	264,85
10/2025		REGINALDO SANTOS DA MOTA	86	059.214.238-82	101	19/11/2025	Mensal	5.563,73	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
10/2025		REGINALDO SANTOS DA MOTA JUNIOR	339	361.068.478-37	101	19/11/2025	Mensal	12.302,41	984,19	0,00	0,00	0,00	984,19
10/2025		ROBERIO SANTOS RIBEIRO MATOS	099004717	225.837.198-82	101	19/11/2025	Mensal	5.501,46	440,11	0,00	0,00	0,00	440,11
10/2025		ROBERTO CARLOS DOS SANTOS	099011964	138.073.348-07	101	19/11/2025	Mensal	4.581,80	366,54	0,00	0,00	0,00	366,54
10/2025		ROBERTO DELGADO	469	138.952.028-51	101	19/11/2025	Mensal	5.979,12	478,32	0,00	0,00	0,00	478,32
10/2025		RODRIGO DE SOUZA CORONADO	184	389.195.148-52	101	19/11/2025	Mensal	3.082,17	246,57	0,00	0,00	0,00	246,57
10/2025		ROGERIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA	113	877.702.703-59	101	19/11/2025	Mensal	3.190,57	255,24	0,00	0,00	0,00	255,24
10/2025		RUDSON ARAUJO NASCIMENTO	099006245	013.736.265-00	101	19/11/2025	Mensal	6.726,06	538,08	0,00	0,00	0,00	538,08
10/2025		SALVADOR GOMES PEREIRA	134	493.337.555-00	101	19/11/2025	Mensal	4.900,96	392,07	0,00	0,00	0,00	392,07
10/2025		SERGIO MARTINS PEREIRA	613	214.334.928-90	101	19/11/2025	Mensal	2.701,60	216,12	0,00	0,00	0,00	216,12
10/2025		TIAGO DONIZETE DOS SANTOS	506	425.795.198-23	101	19/11/2025	Mensal	3.211,00	256,88	0,00	0,00	0,00	256,88
10/2025		VALDEMIR DA SILVA	151	290.739.358-81	101	19/11/2025	Mensal	3.176,15	254,09	0,00	0,00	0,00	254,09
10/2025		VALDINILSON CARNEIRO LIBERATO	125	036.666.223-64	101	19/11/2025	Mensal	6.611,65	528,93	0,00	0,00	0,00	528,93
10/2025		VALTER MONTAGNOLI	87	295.083.958-42	101	19/11/2025	Mensal	5.267,52	421,40	0,00	0,00	0,00	421,40
10/2025		VICTOR COSTA CAVALCANTE FONTOLAN	476	370.977.328-81	101	19/11/2025	Mensal	2.844,91	227,59	0,00	0,00	0,00	227,59
10/2025		WASHINGTON DE OLIVEIRA BATISTA	419	517.575.778-40	101	19/11/2025	Mensal	3.403,25	272,26	0,00	0,00	0,00	272,26
10/2025		WILLIAM JOSE VILAR PEREIRA	492	615.828.073-96	101	19/11/2025	Mensal	2.395,68	191,65	0,00	0,00	0,00	191,65
10/2025		WILLIAM ROGERIO DA SILVA	183	339.387.588-48	101	19/11/2025	Mensal	3.970,70	317,65	0,00	0,00	0,00	317,65
10/2025		ZIGOMAR ARAUJO SANTANA	136	093.102.008-55	101	19/11/2025	Mensal	5.670,23	453,61	0,00	0,00	0,00	453,61
		Total do Tomador		51.235.24935/74				305.335,91	24.426,60	0,00	0,00	0,00	24.426,60
		Total do Estabelecimento		15.131.446/0003-94				1.449.538,58	115.961,73	0,00	0,00	0,00	115.961,73
					Total FGTS			1.521.858,15	121.747,18	0,00	0,00	0,00	121.747,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.131.446/0003-94		Tomador: 90.025.34096/78											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CLEZIO BARBOSA VIEIRA	099008287	283.706.318-17	101	19/11/2025	Mensal	11.411,64	912,93	0,00	0,00	0,00	912,93
Total do Tomador							90.025.34096/78	11.411,64	912,93	0,00	0,00	0,00	912,93
Total do Estabelecimento							15.131.446/0003-94	1.449.538,58	115.961,73	0,00	0,00	0,00	115.961,73
Total FGTS								1.521.858,15	121.747,18	0,00	0,00	0,00	121.747,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 Nome Empregador: EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 304 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

121.747,18

Número da Guia: 0125111903726298-5 Data Emissão: 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) Emitida por: 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.131.446/0003-94		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		AGNALDO SCHIAVINATO	333	290.038.988-71	101	19/11/2025	Mensal	11.042,74	883,41	0,00	0,00	0,00	883,41
10/2025		ANDREA BUENO CLARO	572	258.051.538-07	101	19/11/2025	Mensal	3.204,68	256,37	0,00	0,00	0,00	256,37
10/2025		ANTONIO AILTON OLIVEIRA DE SOUSA	C01S001171	046.724.872-96	101	19/11/2025	Mensal	1.635,90	130,87	0,00	0,00	0,00	130,87
10/2025		ANTONIO MARCOS GARBIN ALVES NEGRAO	099010383	228.221.638-55	101	19/11/2025	Mensal	5.999,12	479,92	0,00	0,00	0,00	479,92
10/2025		BEATRIZ VITAL DOS SANTOS	C01S001175	393.593.248-09	101	19/11/2025	Mensal	2.197,09	175,76	0,00	0,00	0,00	175,76
10/2025		CARLOS ALBERTO DIAS SARMANHO	099010758	701.570.062-04	101	19/11/2025	Mensal	6.354,99	508,39	0,00	0,00	0,00	508,39
10/2025		CARLOS GERMANO LUIZ	099010815	105.706.848-97	101	19/11/2025	Mensal	3.647,71	291,81	0,00	0,00	0,00	291,81
10/2025		CARLOS HENRIQUE SILVA DA LUZ	873	557.175.138-01	101	19/11/2025	Mensal	3.653,76	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
10/2025		CLEITON LUIS BELARMINA	C01S001157	391.005.168-56	101	19/11/2025	Mensal	3.309,21	264,73	0,00	0,00	0,00	264,73
10/2025		DOUGLAS FERNANDO ARMBRUSTER	099009092	302.266.588-13	101	19/11/2025	Mensal	6.844,64	547,57	0,00	0,00	0,00	547,57
10/2025		EDUARDO HENRIQUE CAIXETA	111	258.073.498-29	101	19/11/2025	Mensal	11.197,95	895,83	0,00	0,00	0,00	895,83
10/2025		FELIPE SANTOS LIMA	C01S001176	038.593.172-70	101	19/11/2025	Mensal	1.581,78	126,54	0,00	0,00	0,00	126,54
10/2025		FRANCILDO PEREIRA	C01S001172	603.852.923-33	101	19/11/2025	Mensal	2.704,26	216,34	0,00	0,00	0,00	216,34
10/2025		ISABELA DE SA BITHENCOURT	C01S001154	537.150.298-03	101	19/11/2025	Mensal	2.689,65	215,17	0,00	0,00	0,00	215,17
10/2025		ISABELA SANTOS CARNEIRO	346	423.934.588-08	101	19/11/2025	Mensal	3.684,96	294,79	0,00	0,00	0,00	294,79
10/2025		JOAO PAULO DOS REIS	C01S001170	027.842.941-61	101	19/11/2025	Mensal	1.623,61	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
10/2025		JOSE DE RIBAMAR SOUSA AROUCHA	C01S001174	007.147.053-06	101	19/11/2025	Mensal	2.342,65	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
10/2025		JOSUE LINO SERRA	790	339.562.328-95	101	19/11/2025	Mensal	10.649,65	851,97	0,00	0,00	0,00	851,97
10/2025		MARIANO VICTORINO JUNIOR	581	121.081.068-98	101	19/11/2025	Mensal	9.410,76	752,86	0,00	0,00	0,00	752,86
10/2025		MICHELLE ALVES DE OLIVEIRA	814	424.214.418-03	101	19/11/2025	Mensal	4.879,96	390,39	0,00	0,00	0,00	390,39
10/2025		MOZART VIEIRA SOBRINHO	C01S001152	128.146.184-90	101	19/11/2025	Mensal	8.093,99	647,51	0,00	0,00	0,00	647,51
10/2025		NEIVA FANTIN	164	274.693.908-80	101	19/11/2025	Mensal	5.675,51	454,04	0,00	0,00	0,00	454,04
10/2025		NOILO DE OLIVEIRA DA SILVA	C01S001169	067.924.355-03	101	19/11/2025	Mensal	1.768,93	141,51	0,00	0,00	0,00	141,51
10/2025		PEDRO HENRIQUE GALDEANO FERREIRA	500	492.576.078-52	101	19/11/2025	Mensal	3.520,86	281,66	0,00	0,00	0,00	281,66
10/2025		RAFAEL ALVES DOS SANTOS	C01S001181	106.331.144-64	101	19/11/2025	Mensal	1.987,81	159,02	0,00	0,00	0,00	159,02
10/2025		RENAN HENRIQUE APRIZIO DA MOTA	C01S001158	420.196.578-30	101	19/11/2025	Mensal	3.000,38	240,03	0,00	0,00	0,00	240,03
10/2025		RUBENS DOMINGUES	099012013	115.185.768-85	101	19/11/2025	Mensal	3.292,86	263,42	0,00	0,00	0,00	263,42
10/2025		SERAFIM TEOBALDO MARTINS	584	273.052.871-72	101	19/11/2025	Mensal	8.984,57	718,76	0,00	0,00	0,00	718,76
10/2025		SILVIO ANTONIO SALVADOR	C01S001182	295.829.818-30	101	19/11/2025	Mensal	3.834,21	306,73	0,00	0,00	0,00	306,73
10/2025		THIAGO LEARDINI SOUZA	797	374.316.548-12	101	19/11/2025	Mensal	4.432,19	354,57	0,00	0,00	0,00	354,57
10/2025		WAGNER DOS SANTOS ALBUQUERQUE	C01S001173	007.633.023-09	101	19/11/2025	Mensal	2.340,51	187,24	0,00	0,00	0,00	187,24
10/2025		WELLINGTON FAGUNDES ASSUNCAO MESQ	C01S001177	024.550.421-46	101	19/11/2025	Mensal	1.734,30	138,74	0,00	0,00	0,00	138,74
		Total do Tomador		Sem Tomador				147.321,19	11.785,54	0,00	0,00	0,00	11.785,54
		Total do Estabelecimento		15.131.446/0003-94				1.449.538,58	115.961,73	0,00	0,00	0,00	115.961,73
				Total FGTS				1.521.858,15	121.747,18	0,00	0,00	0,00	121.747,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.131.446/0001-22

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	24	72.319,57	5.785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,45
Total do Estabelecimento		15.131.446/0001-22	72.319,57	5.785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,45

Estabelecimento: 15.131.446/0003-94

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	280	1.449.538,58	115.961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.961,73
Total do Estabelecimento		15.131.446/0003-94	1.449.538,58	115.961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.961,73
Total FGTS			1.521.858,15	121.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.747,18

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 103 - Empregado - Aprendiz
 104 - Empregado - Doméstico
 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.081/1990
 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.019/1974
 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 201 - Trabalhador avulso portuário
 202 - Trabalhador avulso não portuário
 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 303 - Exercente de mandato eletivo
 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 307 - Militar
 308 - Conselheiro
 309 - Agente público - Outros
 310 - Servidor público eventual
 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 312 - Auxiliar local
 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 410 - Trabalhador cadastro em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cassinário/destino
 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 723 - Contribuinte individual - Empregador, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 801 - Estagiário
 902 - Médico residente
 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	15.131.446/0001-22	24	72.319,57	5.785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,45
10/2025	15.131.446/0003-94	280	1.449.538,58	115.961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.961,73
Total FGTS			1.521.858,15	121.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.747,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.131.446/0001-22

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	23	71.177,66	5.694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,11
10/2025	12 - FGTS 13º salário	3	1.141,91	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34
Total do Estabelecimento		15.131.446/0001-22	72.319,57	5.785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,45

Estabelecimento: 15.131.446/0003-94

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	279	1.439.085,00	115.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.125,48
10/2025	12 - FGTS 13º salário	5	10.453,58	836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,25
Total do Estabelecimento		15.131.446/0003-94	1.449.538,58	115.961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.961,73

Total FGTS 1.521.858,15 121.747,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.747,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.131.446 **Nome Empregador:** EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 304 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 121.747,18
Número da Guia: 0125111903726298-5 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:34:15 (Brasília) **Emitida por:** 05.737.510/0001-60 - PROPAY CERTIFICADOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.207.703/0001-83

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	127	726.264,96	58.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,57
Total do Tomador	03.207.703/0001-83	726.264,96	58.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,57

Tomador: 10.635.691/0001-53

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	59	259.204,88	20.736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.736,09
Total do Tomador	10.635.691/0001-53	259.204,88	20.736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.736,09

Tomador: 51.235.24935/74

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	61	305.335,91	24.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.426,60
Total do Tomador	51.235.24935/74	305.335,91	24.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.426,60

Tomador: 90.025.34096/78

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	9	29.043,41	2.323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,43
Total do Tomador	90.025.34096/78	29.043,41	2.323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,43

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	48	202.008,99	16.160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,49
Total do Tomador	Sem Tomador	202.008,99	16.160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,49
Total FGTS		1.521.858,15	121.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.747,18

Verificação da Autenticidade de Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.)

Informamos que a A.R.T. **1020250261508** está devidamente registrada, conforme extrato abaixo. Caso seja encontrada alguma divergência, favor contate-nos pelo Telefone: (62) 3221-6200.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250261508

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)

LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

RNP: **1015845320**

Registro: **1015845320D-GO**

Empresa contratada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - Registro CREA-GO: 170P**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

Contrato: **171/2025**

Celebrado em: **21/07/2025**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

Rua Rod. Mun. Sebastião de Pádua, N° s/n

Bairro: **Lot. Santa Cruz**

CEP: **75706-435**

Quadra: **0** Lote: **0**

Complemento: **Estrada Vicinal**

Cidade: **Catalão-GO**

Data de Início: **23/07/2025**

Previsão término: **10/11/2025**

Coordenadas Geográficas: **-18.168006575,-47.921698388**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário(a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

Tipo de proprietário(a): **Pessoa
Jurídica de Direito Público**

4. Atividade Técnica

FISCALIZACAO

EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA

Quantidade

Unidade

5,0516

QUILOMETROS

As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional e estão sujeitas a análise futura

5. Observações

Esta ART refere-se à fiscalização do Contrato nº 171/2025, Concorrência nº 006/2025, referente à contratação de serviços para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00cm (FAIXA C), incluso terraplenagem e drenagem, na estrada de ligação entre a Avenida Sebastião de Pádua e a sede da CMOC, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes de Catalão.

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
Data

LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA - CPF: ***.463.041-**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200



Registrada em: 11/09/2025 Valor Pg: R\$ 32,78 Boleto: 0125254681

Situação atual: Registrada/OK



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250261666

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a) FREDERICO RODRIGUES TONACO Título profissional: Engenheiro Civil		RNP: 1019578300 Registro: 1019578300D-GO				
2. Dados do Contrato Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO Rua Nassin Agel, Nº 0 Bairro: Setor Central CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50 CEP: 75701-050 Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: ESTRADA VICINAL Cidade: Catalão-GO E-Mail: Contrato: 171/2025 Celebrado em: 21/07/2025 Valor Obra/Serviço R\$: 8.673.000,00 Fone: (64)3441-5000 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável						
3. Dados da Obra/Serviço Rua Nassin Agel, Nº 0 Bairro: Setor Central CEP: 75701-050 Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: ESTRADA VICINAL Cidade: Catalão-GO Data de Início: 23/07/2025 Previsão término: 10/11/2025 Coordenadas Geográficas: -18.1708122,-47.9461176 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50 E-Mail: Fone: (64) 3441-5000 Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público						
4. Atividade Técnica FISCALIZACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA Quantidade 5,0516 Unidade QUILOMETROS <i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i> <i>Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART</i>						
5. Observações Esta ART refere-se à fiscalização do Contrato nº 171/2025, Concorrência nº 006/2025, referente à contratação de serviços para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00cm (FAIXA C), incluso terraplenagem e drenagem, na estrada de ligação entre a Avenida Sebastião de Pádua e a sede da CMOC, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes de Catalão						
6. Declarações Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.						
7. Entidade de Classe NENHUMA	9. Informações - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.					
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima _____, ____ de ____ de ____ Local Data FREDERICO RODRIGUES TONACO - CPF: 046.700.981-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50		 www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200				
Valor da ART: 271,47	Registrada em 10/09/2025	Valor Pago R\$ 271,47	Nosso Numero 28320690125254827	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250258816

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)

RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA

RNP: 2603574884

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Registro: 5080734597/D-SP

Empresa contratada: **EGP - EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA - Registro CREA-GO: 21262**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catalão**

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

Rua Nassim Agel, Nº 505

Bairro: Centro

CEP: 75700-050

Quadra: 00000 Lote: 000

Complemento:

Cidade: Catalão-PE

E-Mail:

Fone: (64)75706435

Contrato: 171/2025

Celebrado em: 21/07/2025

Valor Obra/Serviço R\$: 8.673.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida Presidente Médici, Nº 0001

Bairro: Loteamento Santa Cruz CEP: 75706-435

Quadra: 000 Lote: 000

Complemento:

Cidade: Catalão-GO

Data de início: 21/07/2025

Previsão término: 21/07/2025

Coordenadas Geográficas: -18.1705929,-47.9291674

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário(a): **Prefeitura Municipal de Catalão**

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

E-Mail:

Fone: (64) 75706435

Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO

EXECUCAO TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA

4.371,96

METROS CUBICOS

EXECUCAO MEIO-FIOS

19,00

METROS

EXECUCAO SARJETAS

7.611,83

METROS

EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA

2.642,83

METROS

EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL

48.377,80

METROS QUADRADOS

8.204,00

METROS QUADRADOS

O registro de A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de serviços para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5 cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00 (FAIXA C), incluso terraplenagem e drenagem, na estrada de ligação entre a Avenida Sebastião de Pádua e a sede da CMOC, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Local

Data

RICARDO ALEXANDRE BERNINI BACHIEGA - CPF: 213.032.358-89

Prefeitura Municipal de Catalão - CPF/CNPJ: 01.505.643/0001-50

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200

CREA-GO

Valor da ART:

271,47

Registrada em

02/09/2025

Valor Pago

R\$ 271,47

Nosso Numero

26320690125252036

Situação

Registrada/OK

Não possui

Livro de Ordem

Não Possui

CAT/CAO

**RICARDO
ALEXANDRE
BERNINI
BACHIEGA:2130323
5889**

Assinado de forma
digital por RICARDO
ALEXANDRE BERNINI
BACHIEGA:21303235889
Dados: 2025.09.03
13:15:53 -03'00'

Contrato nº 171/2025
Concorrência nº 006/2025
Processo nº 2025019963
Secretaria Municipal de Transportes

PREÂMBULO:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATALÃO, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 01.505.643/0001-50, com sede na Rua Nassim Agel, nº 505, Setor Central, Catalão-GO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Transportes, **Sr. Bruno Augusto Evangelista**, brasileiro, servidor público municipal, inscrito no CPF sob o nº 709.501.991-68 residente e domiciliado em Catalão-GO.

CONTRATADA: EGP- EMPRESA GLOBAL DE PROJETOS E OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.131.446/0001-22, com endereço na Av. Raulina Fonseca Paschoal, nº 2.555, Sala 02, Lot. Santa Helena II, Catalão- GO, neste ato representada pela **Sr. Ricardo Alexandre Bernini Bachiega**, portador do CPF/MF nº 213.032.258-89, residente e domiciliado nesta cidade.

Este contrato decorre de licitação realizada na modalidade **Concorrência Eletrônica**, autuado sob o nº **006/2025**, Processo Administrativo nº 2025019963, homologada pela Secretária Municipal de Transportes, realizado nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, estando às partes vinculadas ao Edital e seus anexos, e à proposta vencedora, as quais sua execução, e especialmente os casos omissos, estão sujeitos às normas do direito privado, supramencionado diploma legal, cujos termos são irrevogáveis, bem como as cláusulas e às condições a seguir pactuadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O objeto deste contrato é a Contratação de serviços para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, sendo uma camada de 4,5 cm BINDER (FAIXA B) e uma camada de 3,00 (FAIXA C), incluso terraplanagem e drenagem, na estrada de ligação entre a Avenida Sebastião de Pádua e a sede da CMOC, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Transportes.

1.2. O regime de execução será empreitada por preço unitário.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Projeto Básico.

1.3.2. O Edital de Licitação.

1.3.3. A proposta do CONTRATADO.

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

2.1. O prazo de execução será de 16 (dezesseis) semanas e vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021; e o prazo

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
