

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO Nº 141/2024.

PROCESSO: Concorrência Eletrônica 020/2024

OBJETO: Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde

ENDEREÇO: Rua das Violetas, esquina com Rua Tenente Coronel João C. Neto, s/nº, Bairro Primavera, Catalão/GO, CATALÃO/GO

CONTRATADA: Coliseu Construtora EIRELI

1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção de uma Unidade Básica de Saúde no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 4º Boletim de Medição dos serviços realizados pela empresa contratada.

2. Laudo Técnico

2.1. Serviços Executados

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 3º Boletim de Medição analisado:

Serviços Preliminares: Durante o período avaliado, foram executados **1,11%** dos serviços deste grupo, incluindo locação de um contêiner, locação de obra e consumos de energia elétrica e água, totalizando **84,04%** já executados.

Transporte: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo, mantendo 58,80% dos serviços executados referentes a esse grupo.

Serviços em Terra: Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo, mantendo 88,96% dos serviços relacionados a este grupo, sendo evidenciado a terra para aterro.

Fundações e Estrutura: Concluídos **75,80%**, sendo evidenciado **90,17%** dos serviços de fundações, **58,45%** da estrutura e **85,31%** dos serviços referentes a alvenaria.

Impermeabilização: Foram executados **90%** dos serviços relacionados a este grupo.

Cobertura: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Revestimento de Piso, Paredes e Tetos: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Esquadrias: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Instalações Elétricas: Foram concluídos cerca de **9,34%** dos serviços referentes a este grupo, sendo evidenciado eletrodutos e caixas octogonal.

Instalações Hidrossanitários: Manteve o total de **25,97%** sendo evidenciado o kit cavalete, hidrômetro e reservatório metálico.

PCIP (Projeto Contra Incêndio e Pânico): Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Rede de Gases Medicinais: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Climatização: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Comunicação Visual: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Pintura: Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

Diversos e Limpeza: Foi executado **31,90%** dos serviços deste grupo, sendo evidenciado a perfuração do poço artesiano.


Administração Local: Foram executados **7,74%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **32,11%**.


Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente ao 4º Boletim de Medição, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.




Igor C. Nascimento Marques
Engenheiro Civil
Fiscal


Igor C. N. Marques
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

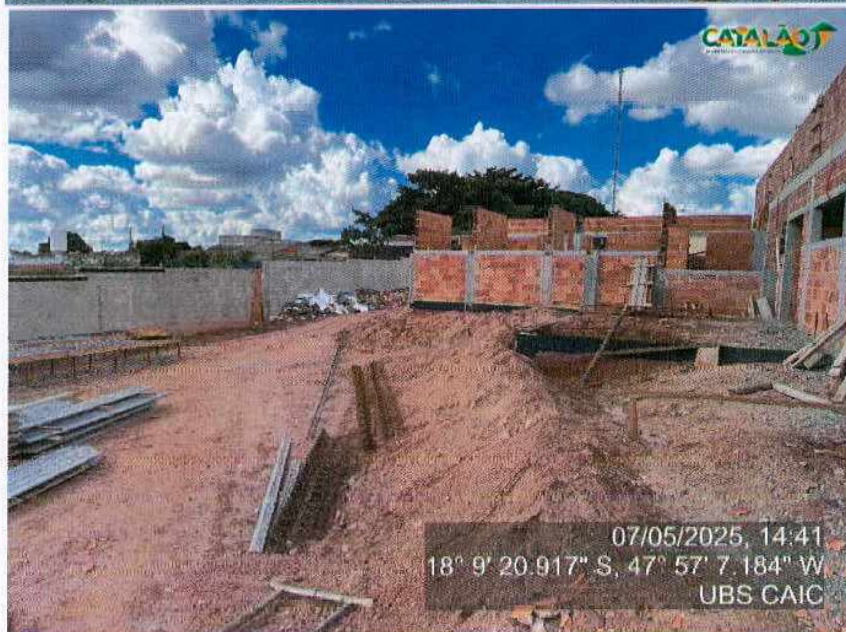

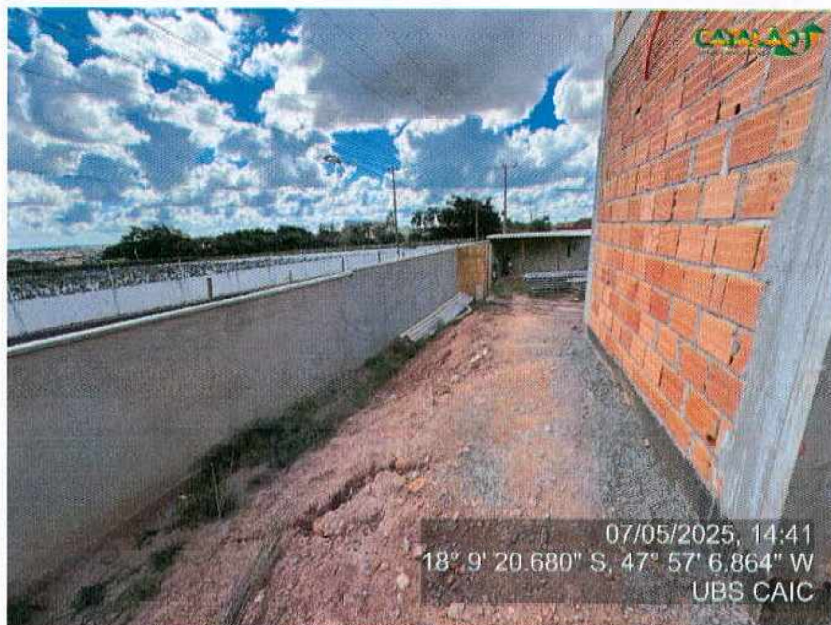

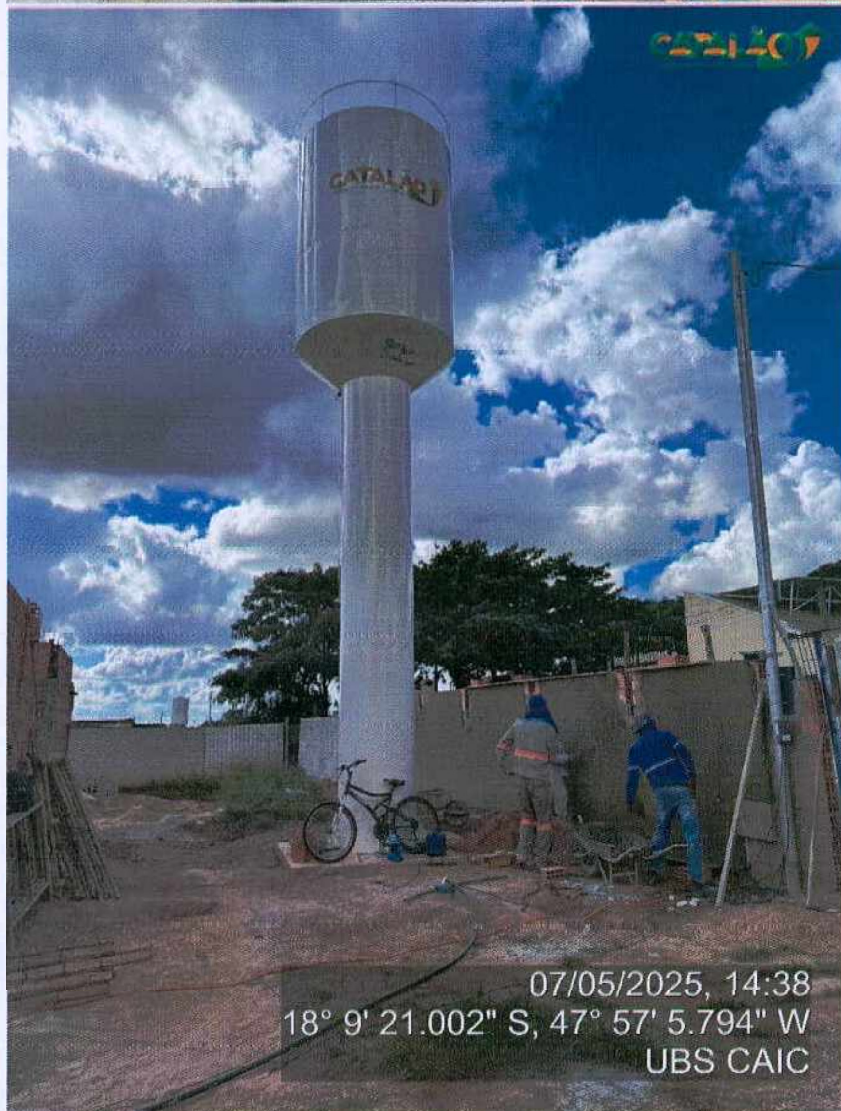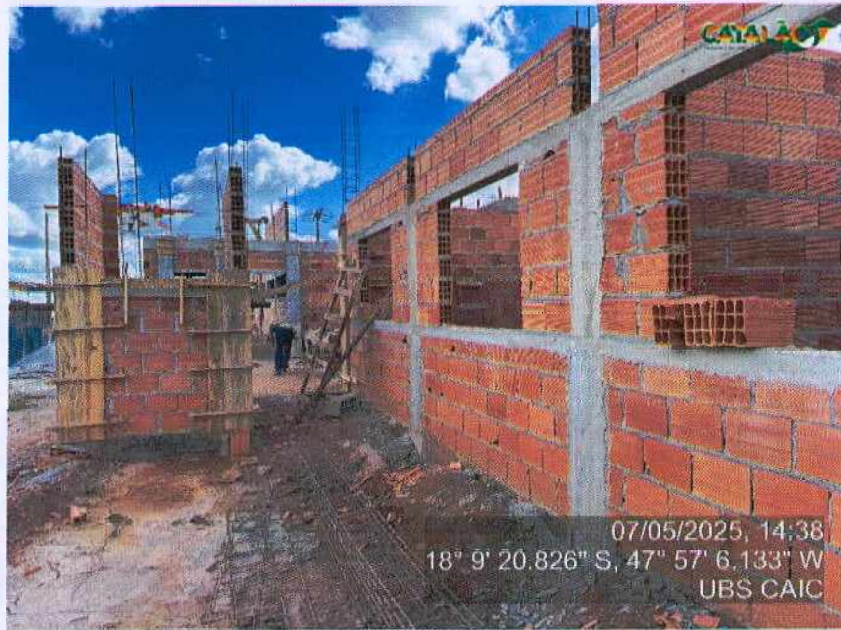

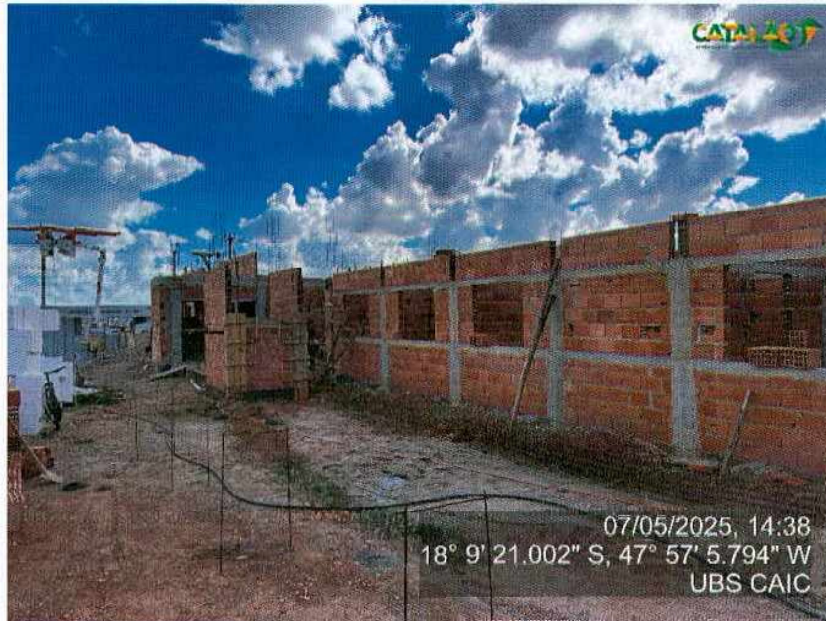

Ignácio L. Marques
Pref. Catalão
