

## LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO Nº 042/2022

**PROCESSO:** Tomada de Preço nº 002/2022

**OBJETO:** Construção de Escola 6 Salas Padrão FNDE

**ENDEREÇO:** Ruas 01, nº 75 esquina com a rua 04 e rua 08. Bairro Flamboyant. CATALÃO/GO

**CONTRATADA:** Riviére Construtora e Incorporadora LTDA

### 1. Apresentação

Este laudo de medição tem como objetivo registrar e acompanhar a execução dos serviços referentes à construção da Escola 6 Salas Padrão FNDE no município de Catalão-GO. O documento visa validar os valores apresentados no 13º Boletim de Medição dos serviços realizados pela empresa contratada.

### 2. Laudo Técnico

#### 2.1. Serviços Executados

A seguir, apresentam-se os serviços executados e contemplados no 13º Boletim de Medição, analisado:

**Serviços Preliminares:** Fase concluída 100%.

**Movimento de Terra para Fundações:** Fase concluída 100%.

**Fundações:** Fase concluída 100%.

**Sistema de Vedação Vertical:** Foram executados 94,4% dos serviços relacionados a este grupo.

**Superestrutura:** Foram executados nesse período 100% dos serviços relacionados a este grupo.

**Esquadrias:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo 4,9% dos serviços de esquadrias.



**Sistema de Cobertura:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **65,1%** dos serviços de cobertura.

**Impermeabilização:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **92,2%** dos serviços de impermeabilização.

**Revestimento Interno e Externo:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **70,0%** dos serviços de revestimentos interno e externo.

**Sistemas de Piso:** Foram executados **65,2%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Instalações Elétricas e Telefônicas:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **25,4%** dos serviços de revestimentos interno e externo.

**Serviços de proteção contra descargas elétricas:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **0,5%** dos serviços de impermeabilização.

**Instalações de Gás Combustível:** Foram executados **8,2%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Instalações Hidráulicas:** Foram executados **100%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Instalações Sanitárias:** Foram executados **96,5%** dos serviços relacionados a este grupo.

**Louças acessórios e metais:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Sistema de Proteção Contra Incêndio:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Pintura e Acabamentos:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Serviços Complementares:** Nesse período não foi executado nenhum serviço correspondente a esse grupo mantendo **44,8%** de serviços complementares executados.

**Serviços Finais:** Nenhuma atividade foi iniciada neste grupo.

**Mensalista:** Foram executados **9,0%** dos serviços relacionados, compatíveis com o percentual de avanço da obra, totalizando **68,9%**.



Esse laudo reflete a evolução dos serviços executados até o período correspondente ao 13º Boletim de Medição, permitindo o devido acompanhamento físico e financeiro da obra.

### Relatório Fotográfico

**Foto 01:** Execução da cobertura do bloco da secretaria



**Fotos 02:** Piso dos Corredores dos blocos






**Fotos 03: Calçada da entrada**



**Fotos 04: Casa de Gás e A.R.R.S**

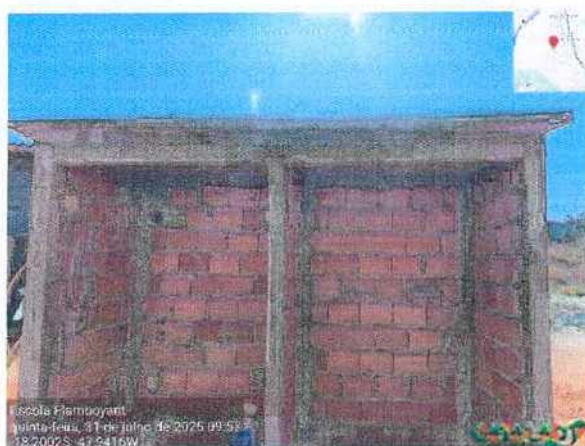

*Rafaiane G. Purcino*

**Rafaiane Gonçalves Purcino**

**Engenheira Civil**

**CREA: 1017759553 D-GO**

Rafaiane Gonçalves Purcino  
Engenheira Civil  
CREA: 1017759553D-GO  
Secretaria de Obras
