

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 076/2024

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 008/2024

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR

ENDEREÇO: AVENIDA WILSON BARBOSA DE LIMA, ESQUINA COM A RUA ALAN MORI.

CONTRATADA: ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELLI ME.

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR, localizada no Bairro Evelina Nour no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 2º (segundo) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 2º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 13,96% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange a consumo de água e energia elétrica, locação da praça, locação de container e placa da obra plotada em chapa metálica, chegando assim o grupo em um total de 71,47%.
- **Transporte:** No período referente a esta medição, foram executados 14,30% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange o transporte de entulho em caçamba estacionária, chegando o grupo em um total de 87,47% já executado.
- **Serviços em terra:** No período referente a esta medição, foram executados 9,44% dos serviços relacionados a este grupo, referente a argila ou barro para aterro/reaterro, chegando o grupo em um total de 94,29% já executado.

- Fundações e sondagens: No período referente a esta medição, não foram executados dos serviços relacionados a este grupo, desta forma, o total acumulado permanece em 85,78%.
- Estrutura: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacados os furos e concretagem das estacas e vigas baldrames, utilização de concreto, aço e formas.
- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, foram executados 5,51% dos serviços relacionados a este grupo, referente à instalação de eletrodutos chegando o grupo em um total de 5,51% já executado.
- Instalações hidrossanitárias: No período referente a esta medição, foram executados 29,94% dos serviços relacionados a este grupo, referente à irrigação automatizada chegando o grupo em um total de 55,09% já executado.
- Alvenarias e divisórias: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacado a alvenaria de vedação de blocos cerâmicos.
- Impermeabilização: Conforme indicado nas medições anteriores, 100,00% dos serviços previstos para este grupo de serviço foram devidamente concluídos, podendo ser destacado a impermeabilização de vigas baldrames.
- Estrutura de madeira: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, foram executados 43,59% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao piso de concreto desempenado, concreto desempenado para quadra com lastro, piso de concreto polido e tela soldada, chegando o grupo em um total de 52,68% já executado.
- Administração: Foi realizado o equivalente a 18,99% dos serviços, tendo sido constatados pagamentos relacionados a engenheiro, mestre de obra, topógrafo e vigia de obras, chegando o grupo em um total de 34,99% já executado.

- Revestimento de parede: No período referente a esta medição, foram realizados 67,54% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao chapisco comum e reboco, chegando o grupo em um total de 100,00% dos serviços já executados.
- Pintura: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Diversos: No período referente a esta medição, foram realizados 1,42% dos serviços relacionados a este grupo, referente aos bancos, chegando o grupo em um total de 100,00% dos serviços já executados.
- Paisagismo: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.

3. Relatório Fotográfico

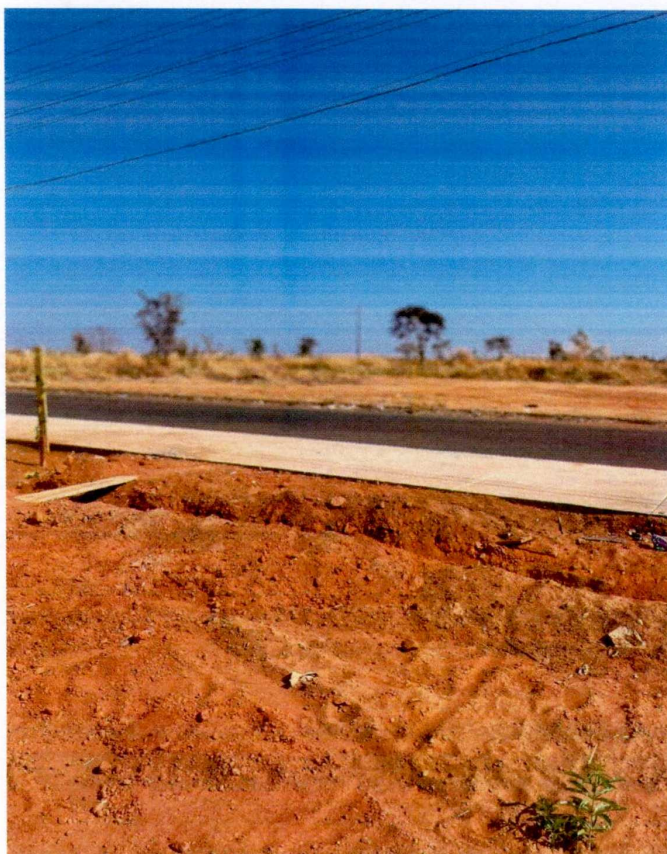


Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

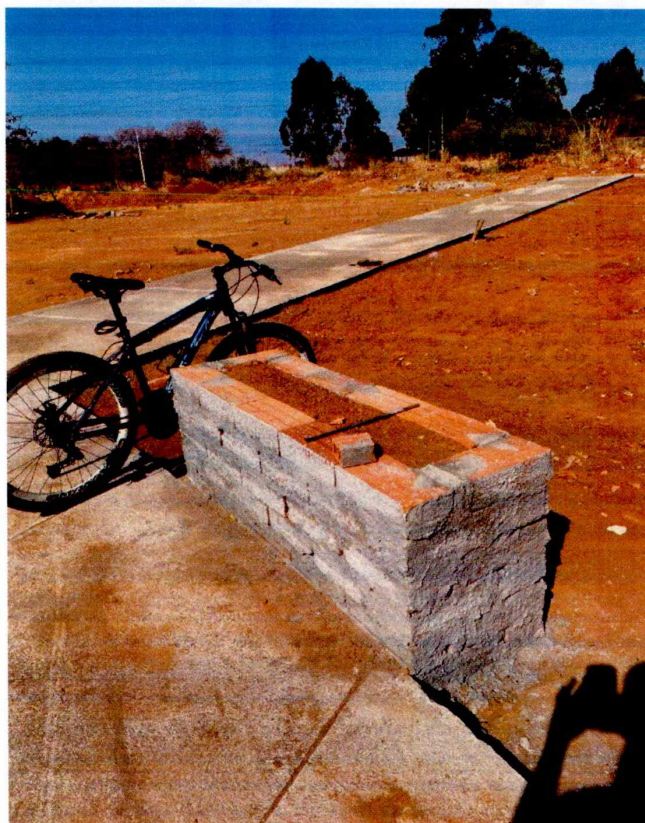


Figura 5

Catalão, 06 de setembro de 2024.



LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras

Engenheiro Civil
