

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 185/2023

PROCESSO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA REPRESA CLUBE DO POVO

ENDEREÇO: REPRESA CLUBE DO POVO

CONTRATADA: LD ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização da represa Clube do Povo, no intuito de corroborar os valores apresentados no 4º (quarto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Em concordância com os serviços já executados e verificados no quarto Laudo de Medição referente ao objeto em questão, segue abaixo os serviços restantes:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, não foram executados serviços relacionados a este grupo, fazendo com que o grupo permaneça em um total acumulado de 99,50% já executado.
- **Demolições:** No período referente a esta medição, foram executados 11,95% dos serviços relacionados a este grupo, referente às demolições de piso, meio-fio, e o transporte de entulho. Como resultado, o total acumulado do grupo atingiu 99,74% já executado.
- **Calçadas externas:** No período referente a esta medição, foram executados 11,71% dos serviços relacionados a este grupo, referente ao reaterro com apiloamento, argila para aterro, lastro de concreto, instalação de ladrilho hidráulico. Como resultado, o total acumulado para este grupo de serviços chega a 38,51% já executado.

- **Calçadas internas:** Sem evolução.
- **Área de basquete:** Sem evolução.
- **Quadra poliesportiva:** Sem evolução.
- **Quadras de areia:** Não foram identificados serviços neste período de medição, desta forma, permanece o acumulado executado de 11,44% dos serviços previstos.
- **Pista de skate:** Sem evolução.
- **Área de academia ao ar livre:** Sem evolução.
- **Pet place:** Sem evolução.
- **Playground:** Sem evolução.
- **Mobiliário urbano:** Sem evolução.
- **Área de contemplação (borda):** No período referente a esta medição, foram executados 18,43% dos serviços planejados, abrangendo a execução de piso em pedra portuguesa. Dessa forma, o total executado alcançou 32,65%.
- **Paisagismo:** Sem evolução.
- **Borda de Contenção da Represa:** Não foram identificados serviços neste período de medição, desta forma, permanece o acumulado executado de 4,22% dos serviços previstos.
- **Iluminação:** No período referente a esta medição, foram executados 5,32% dos serviços, podendo ser relacionado a instalação de cabos e postes de 4m. Desta forma, o total executado deste grupo de serviço chega a 44,81%.
- **Administração:** No período referente a esta medição, foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados, desta forma, o

percentual medido foi de 5,97%. Assim, o acumulado total deste grupo de serviço, até o momento, é de 29,42%.

- **Diversos:** Sem evolução.

3. Relatório Fotográfico

Em anexo ao processo de medição, conferido pela fiscalização.

Imagem 01



Imagem 02

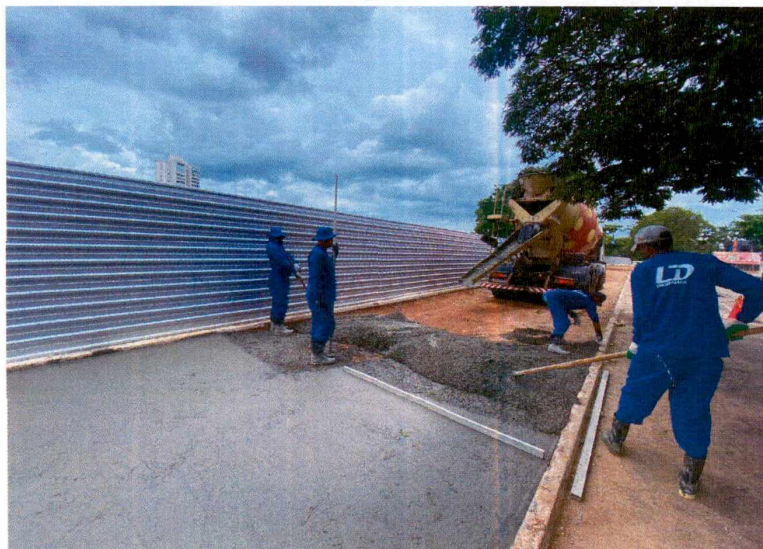


Imagem 03



Imagem 04



Imagem 05



Imagem 06



Imagem 07


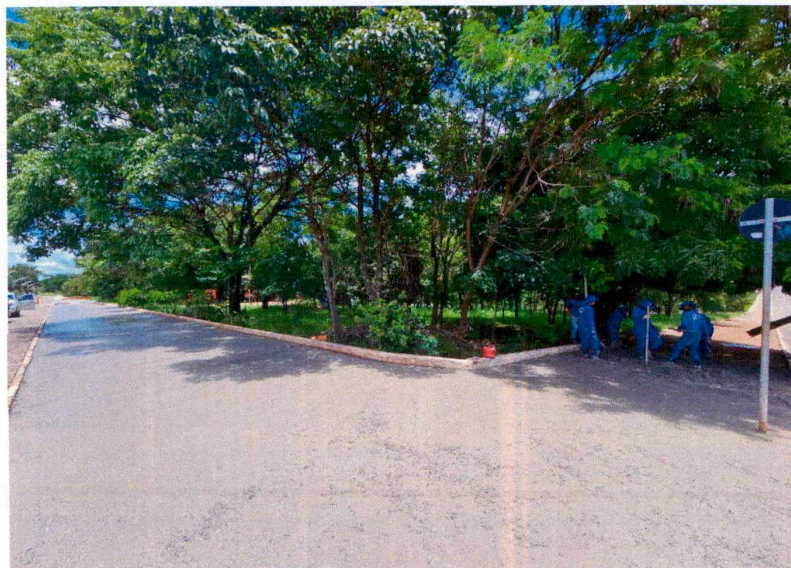


Imagem 08



Catalão, 01 de março de 2024.



LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil
