

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 089/2024

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MORRINHO DO SÃO JOÃO

ENDEREÇO: MORRINHO DO SÃO JOÃO

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA-ME

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização Do Morrinho do São João, localizado no Bairro Ipanema, no intuito de corroborar os valores apresentados no 1º (primeiro) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 1º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição, foram executados 68,65% dos serviços relacionados a este grupo, tendo sido constatados a demolição, limpeza do terreno, placa de obra e tapume e proporcionalmente os consumos de água, energia e locação de container.
- **Transporte:** Nesta referida medição, foram constatados 60,11% de serviços executados, sendo eles o transporte de entulho em caçamba estacionária e em caminhão.
- **Serviços em terra:** No período referente a esta medição, foram executados 19,74% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange escavação de valas e reaterro.

- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, foram executados 34,43% dos serviços relacionados a este grupo, sendo evidenciado postes e suporte para luminária
- Esquadrias metálicas: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Vidros: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Revestimento de pared: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo.
- Revestimento de piso: No período referente a esta medição, foram iniciados serviços relacionados a este grupo, no que tange ao lastro de concreto e passeio de proteção, representando 17,83% do total previsto para o grupo.
- Ferragens: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo
- Administração – mensalistas: No período desta medição foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados. Desta forma, o percentual total do grupo é de 17,40%.
- Pintura: No período referente a esta medição, não foram iniciados serviços relacionados a este grupo
- Diversos: Nesta referida medição, foram constatados 5,49% de serviços executados, sendo eles iniciado os serviços de bancos e deck

Diante do exposto, encontra-se uma evolução de 18,90% da obra.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2



Figura 3

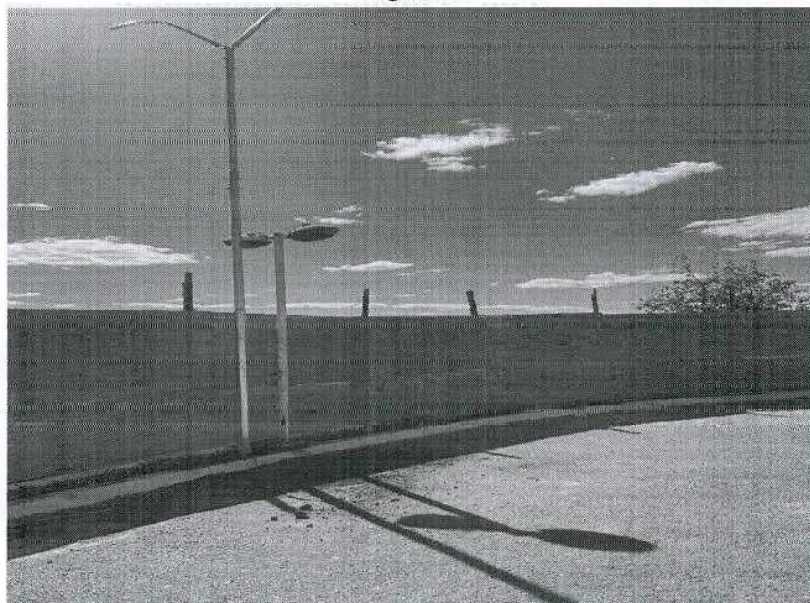


Figura 4



Catalão, 09 de agosto de 2024.



LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras

Engenheiro Civil
