

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 100/2025

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025

OBJETO: READEQUAÇÃO DA RUA SABINO P. SILVA.

ENDEREÇO: RUA SABINO PEREIRA DA SILVA, ENTRE A AVENIDA JOÃO XXIII E RUA ELIAS DEMOCH, CENTRO, MUNICÍPIO DE CATALÃO.

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA.

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a READEQUAÇÃO DA RUA SABINO P. DA SILVA, (antiga Rua do Lazer), no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 5º (quinto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 5º boletim de medição analisado:

- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição de serviços, foi constatada uma evolução de 9,96% dos serviços integrantes do grupo, sendo possível verificar a locação de contêiner, bem como os consumos proporcionais de água e energia elétrica. Dessa forma, corroborando medições anteriores, o total acumulado atinge 90,56%.
- **Transporte:** No período correspondente a esta medição, não foram constatados serviços referentes a este grupo. Assim, considerando-se as medições anteriores, o total acumulado se mantém em 68,16%.
- **Revestimento de piso:** No período abrangido por esta medição, verificou-se a execução de 30,69% dos serviços previstos, destacando-se a realização do pavimento intertravado, o pavimento em concreto tipo concregrama e o pavimento intertravado sextavado (bloket). Com isso, o total acumulado atinge 30,69%.
- **Instalações elétricas:** No período contemplado por esta medição, registrou-se uma evolução de 11,08%, correspondente à instalação da caixa metálica para medidor e eletrodutos, chegando assim, a um total acumulado de 40,72%.
- **Instalações hidrossanitárias:** No período contemplado por esta medição, não houve evolução dos serviços, permanecendo em um total acumulado de 79,11%.

Leonardo Damasceno de Oliveira
Assessor Técnico de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição foram identificados 77,78% dos serviços previstos, no que tange a instalação das grades de proteção.
- **Pintura:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes a esse grupo de serviço.
- **Diversos:** No período referente a esta medição foram identificados 43,66% dos serviços previstos para este grupo de serviço, sendo constatado a execução das mesas e do pórtico de entrada, chegando a um total acumulado de 63,23%.
- **Administração Local:** No período abrangido por esta medição, identificou-se a execução de 20,42% dos serviços vinculados à administração da obra, resultando em um total acumulado de 44,19%.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Leandro Damas do Oliveira
Assessor Especial
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 2




Figura 3



Figura 4



Figura 5

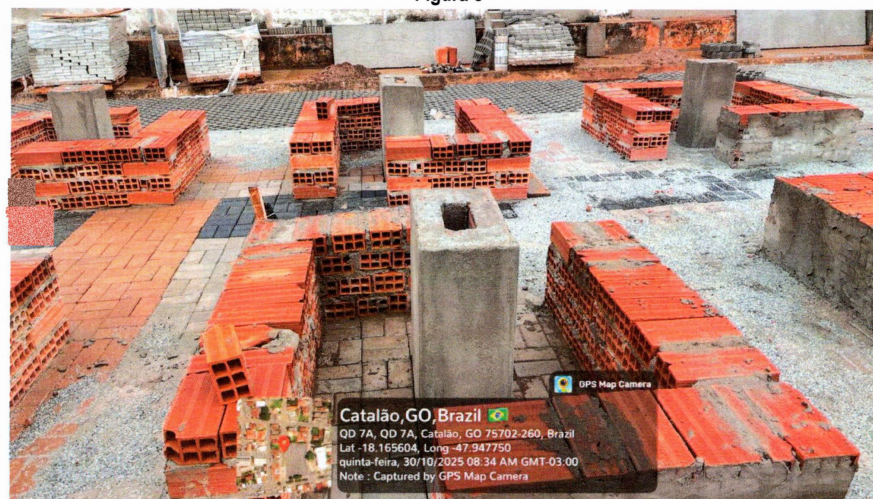


Leandro Damasceno Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 6



Figura 7

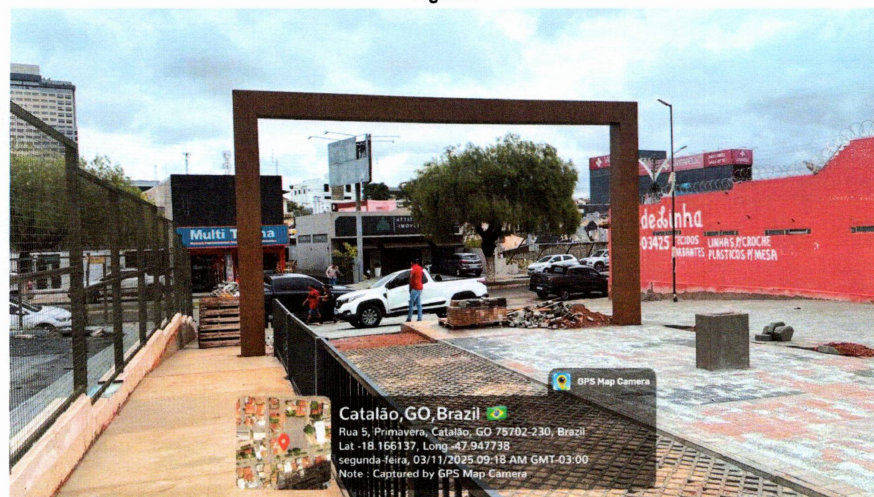

Catalão (GO), 03 de novembro de 2025.


Leandro Damas de Oliveira
Diretor de Obras
Secretaria Municipal de Obras

Secretaria de Obras
