

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 100/2025

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025

OBJETO: READEQUAÇÃO DA RUA SABINO P. SILVA.

ENDEREÇO: RUA SABINO PEREIRA DA SILVA, ENTRE A AVENIDA JOÃO XXIII E RUA ELIAS DEMOCH, CENTRO, MUNICÍPIO DE CATALÃO.

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA.

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços para a READEQUAÇÃO DA RUA SABINO P. DA SILVA, (antiga Rua do Lazer), no município de Catalão-GO, no intuito de corroborar os valores apresentados no 3º (terceiro) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 3º boletim de medição analisado:


- **Serviços preliminares:** No período referente a esta medição de serviços, foi constatada uma evolução de 4,38% dos serviços integrantes do grupo, sendo possível verificar a locação de contêiner, bem como os consumos proporcionais de água e energia elétrica. Dessa forma, corroborando medições anteriores, o total acumulado atinge 73,50%.
- **Transporte:** No período correspondente a esta medição, registrou-se a execução de 7,02% dos serviços integrantes deste grupo, referentes ao transporte de entulho em caçamba estacionária. Assim, considerando-se as medições anteriores, o total acumulado perfaz 55,75%.
- **Revestimento de piso:** No período abrangido por esta medição, verificou-se a execução de 5,65% dos serviços previstos, destacando-se a realização do passeio de proteção em concreto desempenado. Com isso, o total acumulado atinge 20,70%.
- **Instalações elétricas:** No período contemplado por esta medição, registrou-se uma evolução de 29,90%, correspondente à aquisição e instalação dos postes e luminárias, chegando assim, a um total acumulado de 40,72%.
- **Instalações hidrossanitárias:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes a esse grupo de serviço.

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

- **Esquadrias metálicas:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes e esse grupo de serviço.
- **Pintura:** No período referente a esta medição ainda não foram identificados serviços referentes e esse grupo de serviço.
- **Diversos:** No período referente a esta medição foram identificados 0,73% dos serviços previstos para este grupo de serviço, sendo constatado a execução do meio fio.
- **Administração Local:** No período abrangido por esta medição, identificou-se a execução de 12,60% dos serviços vinculados à administração da obra, resultando em um total acumulado de 23,77%.

Relatório Fotográfico

Figura 1

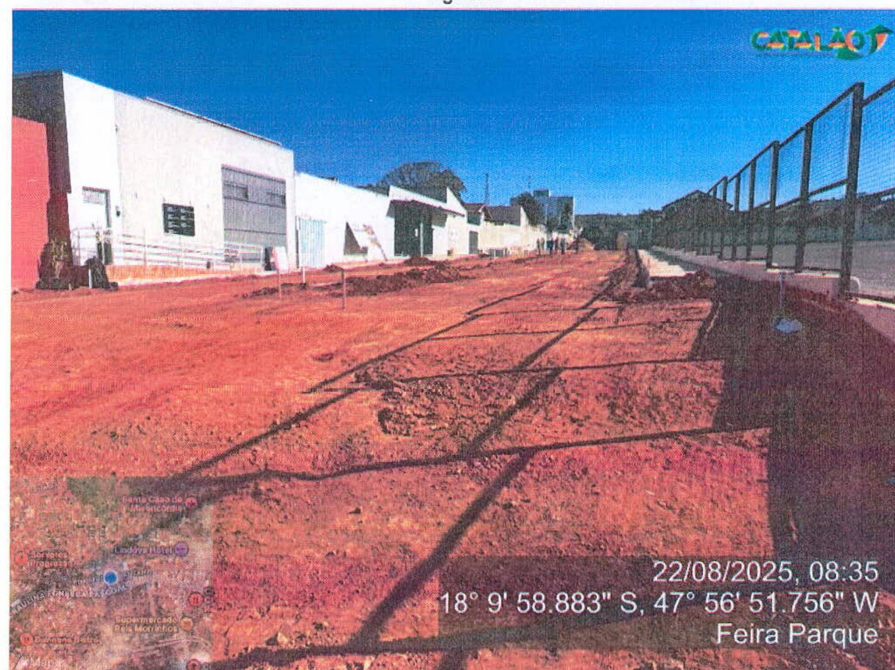

Leandro Damas de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 2


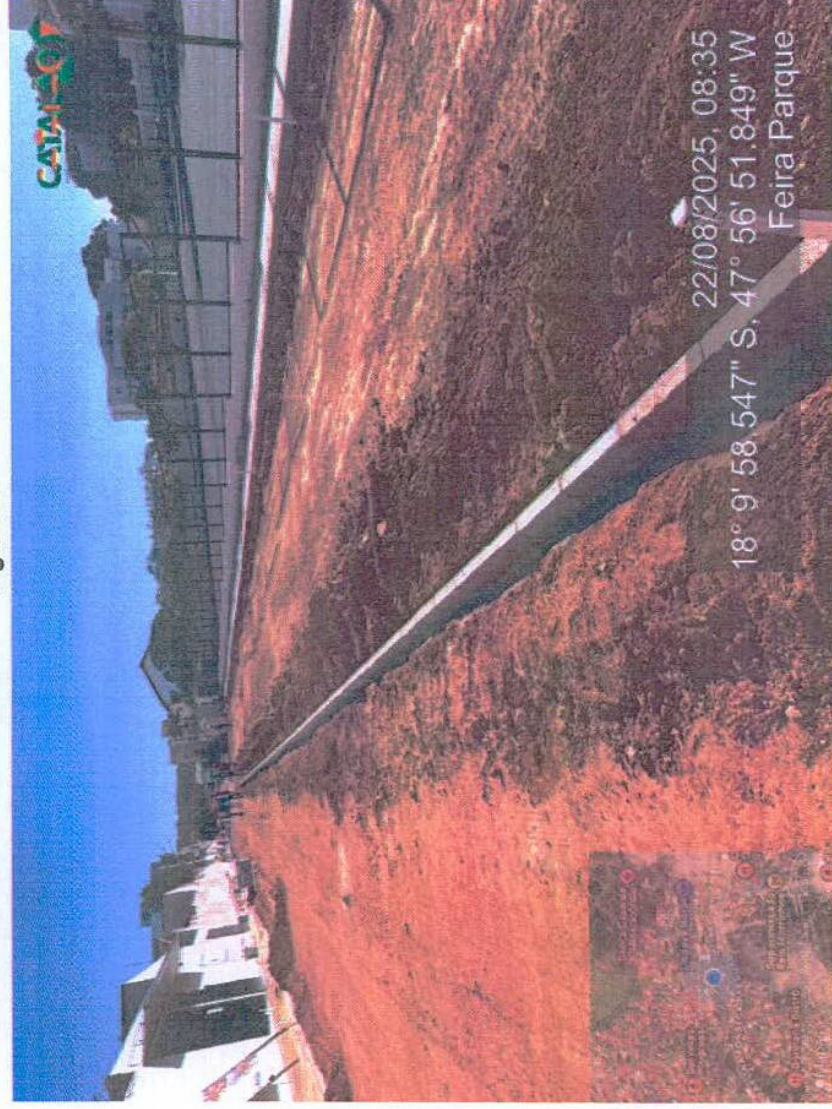


Figura 3

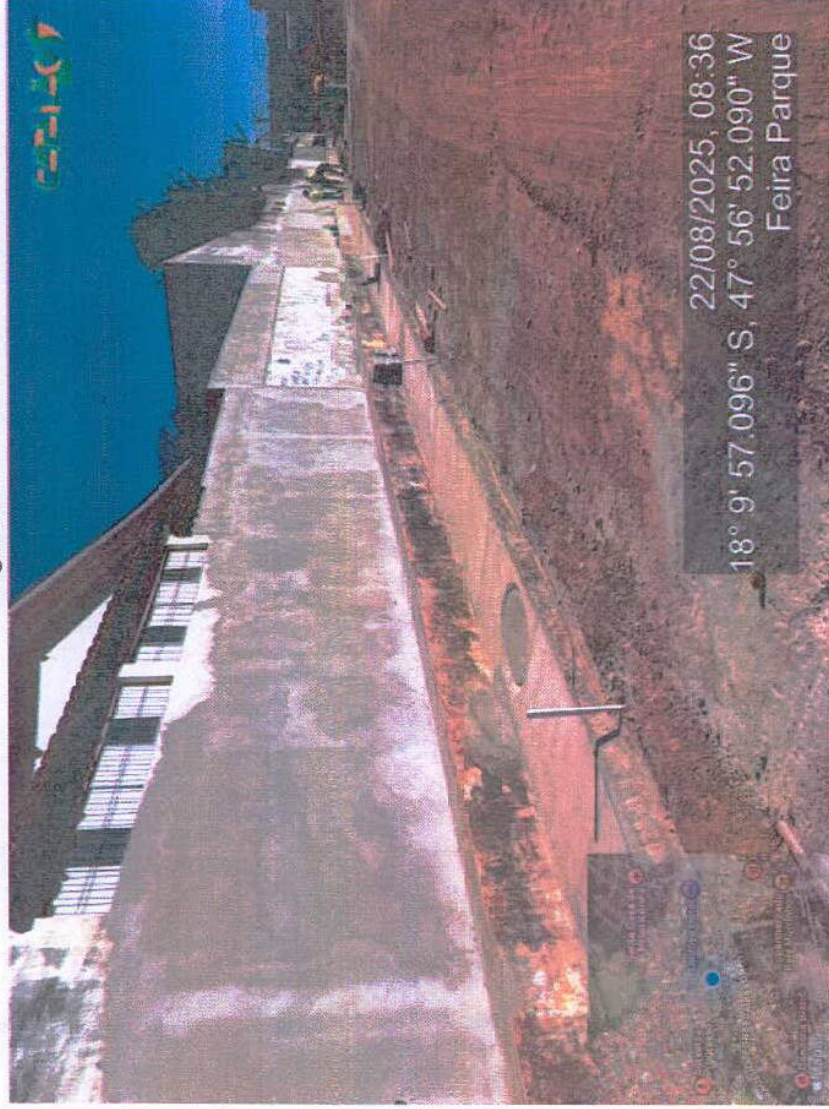

Secretaria de Obras

📍 Rua Nassim Agel, nº 505, Centro - 75701050

📞 (64) 3441-5039

✉️ obras@catalao.go.gov.br

🌐 www.catalao.go.gov.br

Adriano de Oliveira
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Figura 4

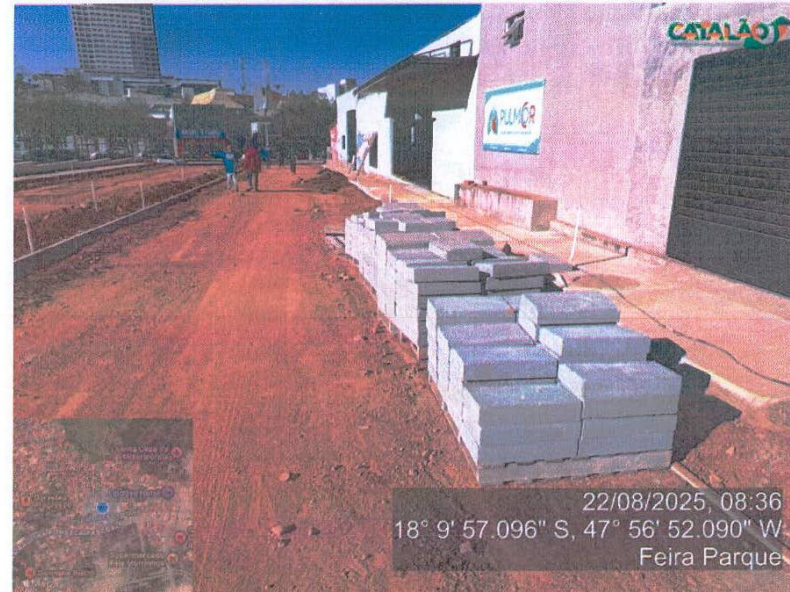


Figura 5



Engenheiro **Thomas de Oliveira**
Assessor Especial de Engenharia
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras

Secretaria de Obras

Figura 6

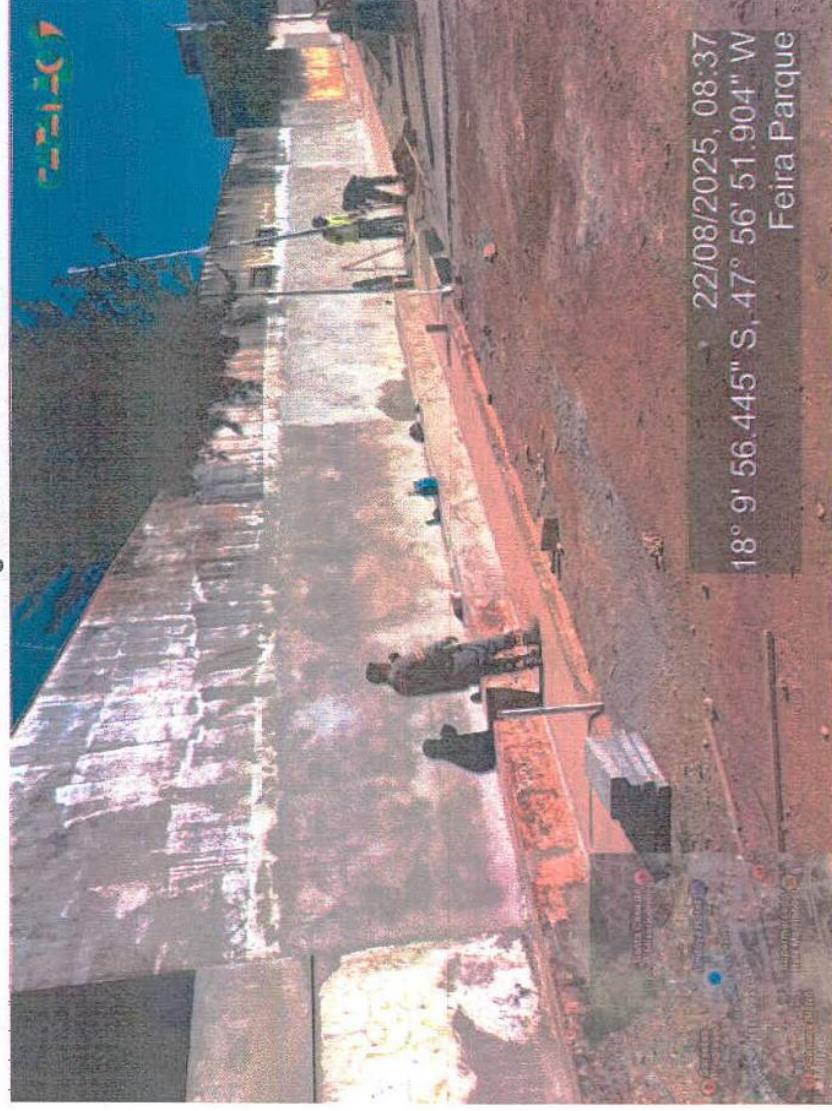


Figura 7


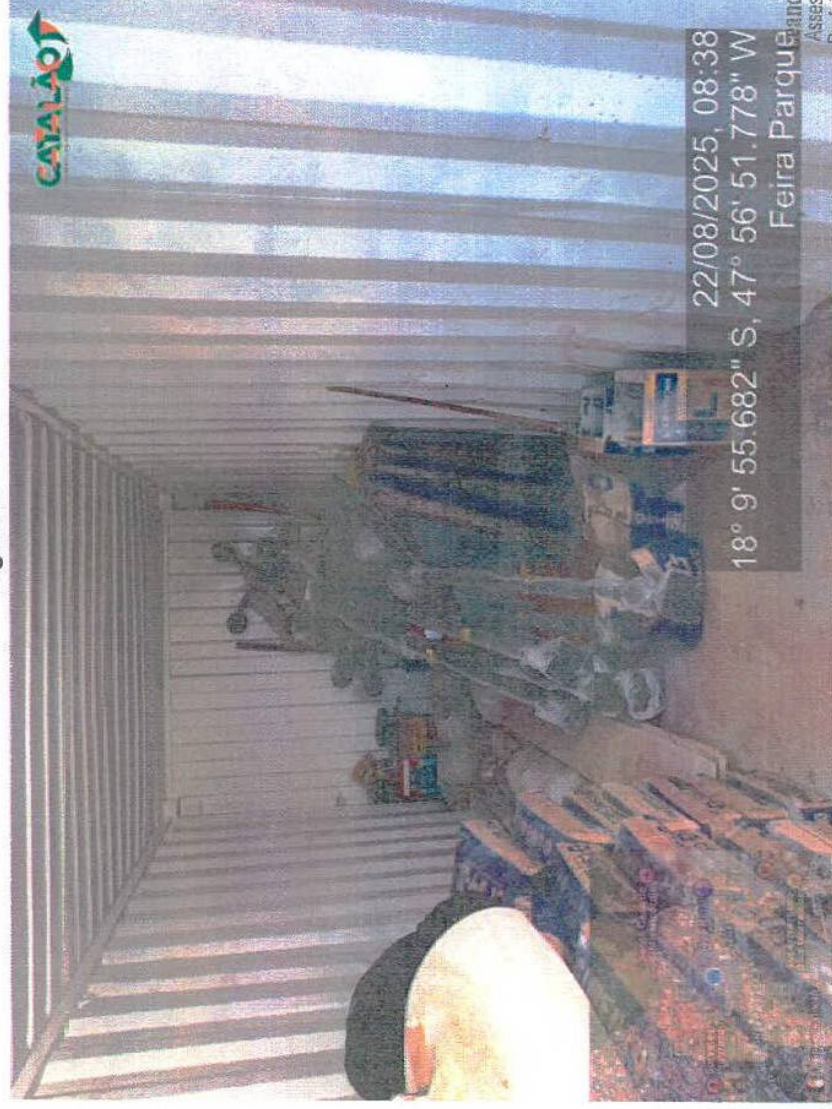


Figura 8

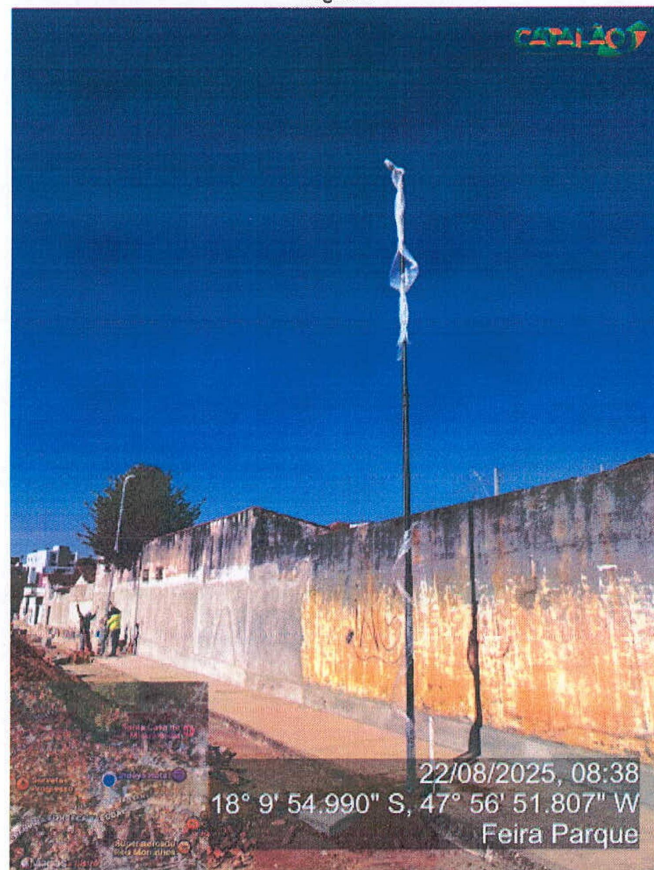

Catalão (GO), 27 de agosto de 2025.


Leandro Damas de Oliveira
Diretor de Obras
Secretaria Municipal de Obras
