


## 5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

**FOTOS 1 E 2 – JUNTA A:** Lajes concretadas, pilares e formas de reservatório executados, sendo levantado a platibanda.




*João Marques*

**FOTOS 3 E 4 – JUNTA B: Finalização da montagem da laje por cima e por baixo**

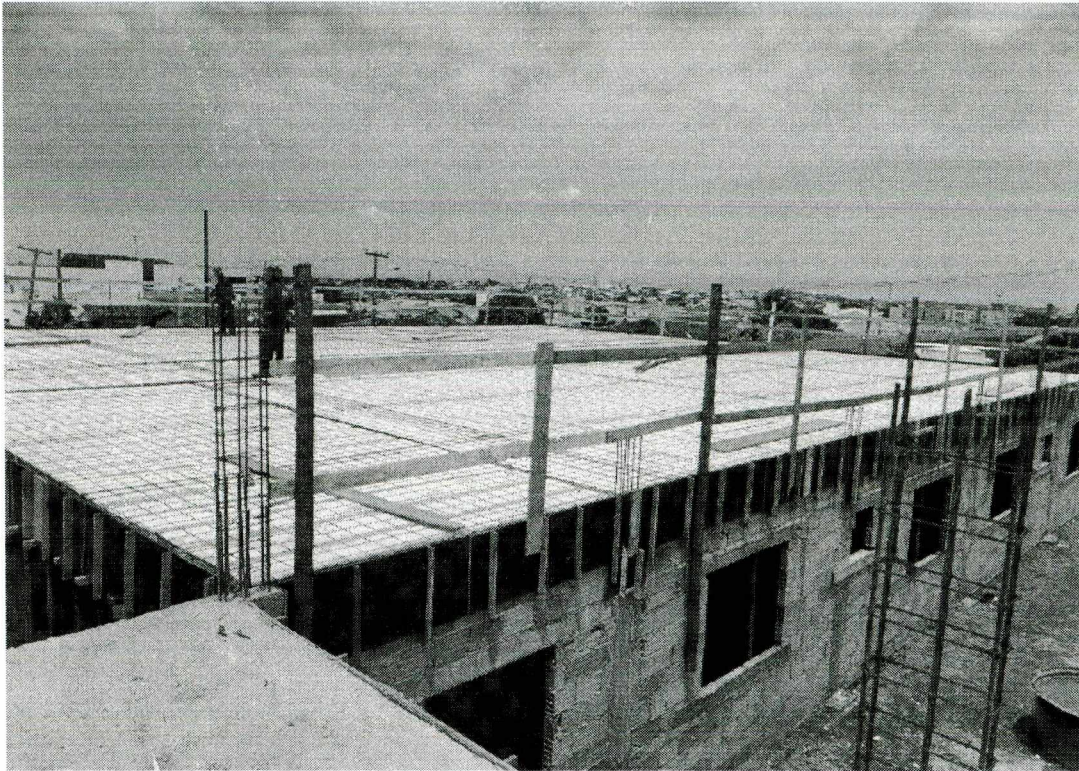

*Leon Marques*

**FOTOS 5 – JUNTA C: Conclusão de alvenaria montagem de formas de pilares.**

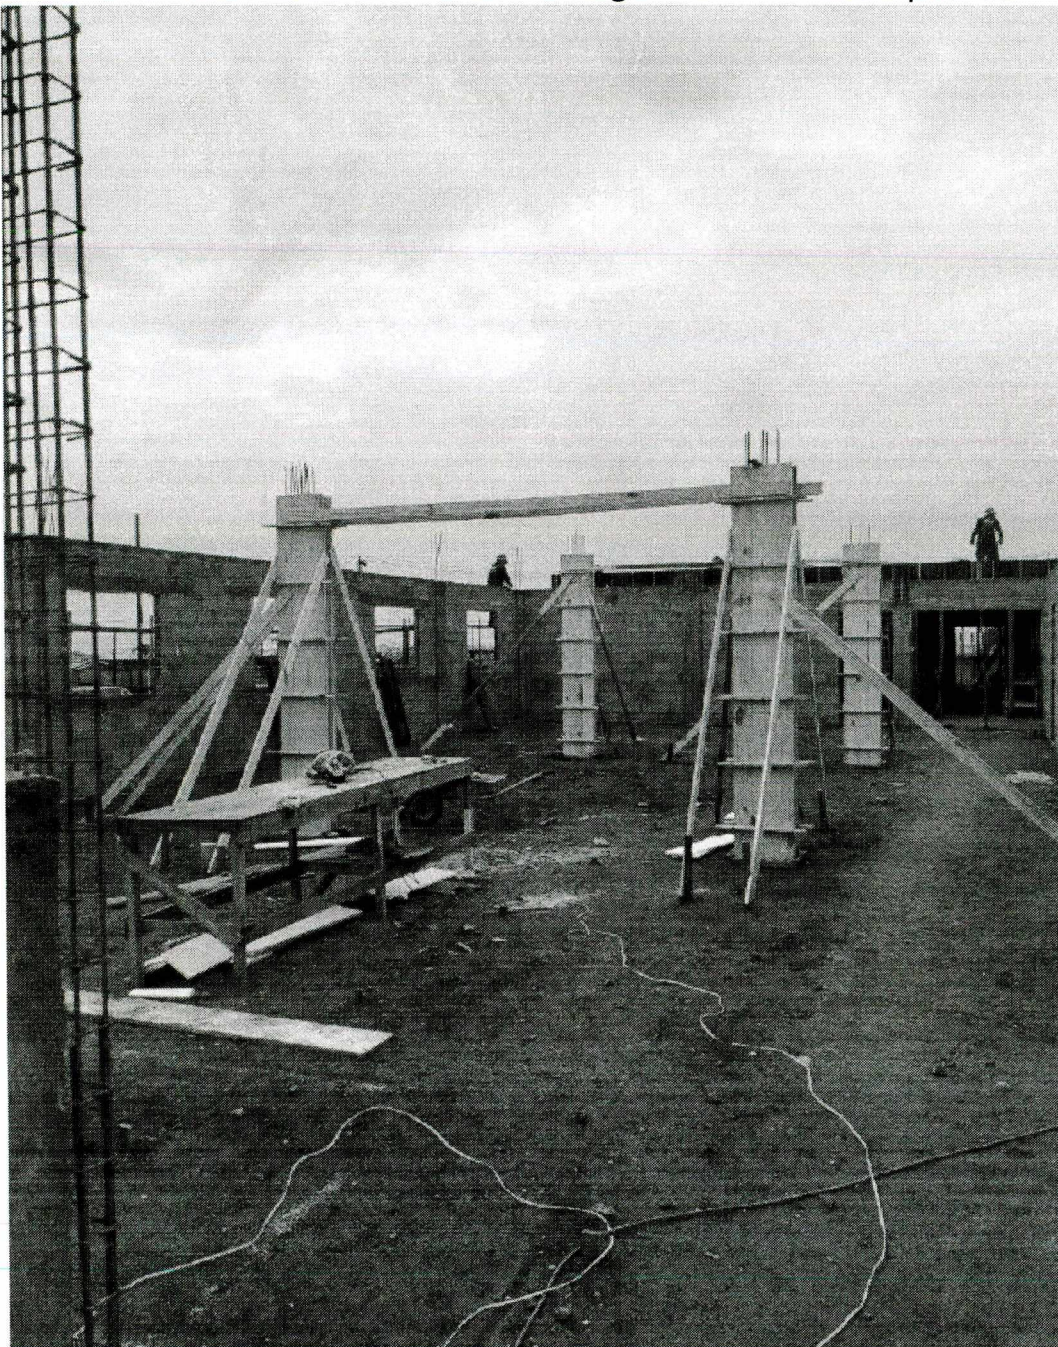

*Igor Marques*

CNPJ: 02.500.304/0001-43


OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO

**FOTOS 6 – JUNTA D: Montagem de alvenaria**



*Igor Marques*

**FOTO 7 – JUNTA E: Concretagem de baldrame.**

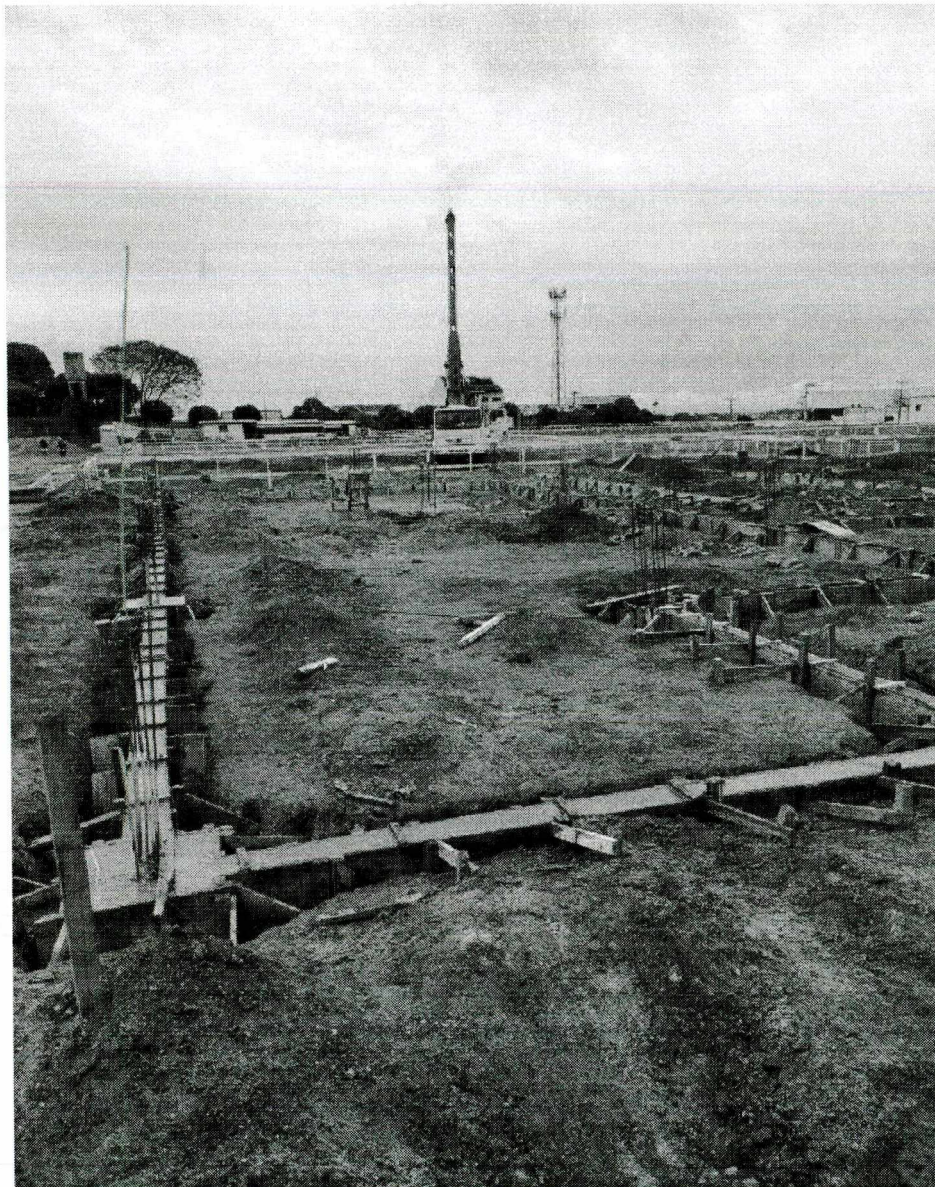

*Igor Marques*

**FOTO 8 – JUNTAS F, G, H, I, J, K, L: Estacas finalizadas**



**FOTO 9 – JUNTAS N, O, P, R: Estacas perfuradas. Juntas: M, Q, S: Aguardando perfuração.**



*João Marques*

CNPJ: 02.500.304/0001-43

OBRA: Hospital Regional de Catalão, Catalão - GO
