

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 089/2024

PROCESSO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 012/2024

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MORRINHO DO SÃO JOÃO

ENDEREÇO: MORRINHO DO SÃO JOÃO

CONTRATADA: ECA ENGENHARIA LTDA-ME

1. Apresentação

Este laudo de medição refere-se ao acompanhamento dos serviços de reforma e revitalização Do Morrinho do São João, localizado no Bairro Ipanema, no intuito de corroborar os valores apresentados no 4º (quarto) boletim de medição de serviços realizados pela contratada.

2. Laudo técnico

2.1. Serviços executados

Segue abaixo os serviços executados e que foram contemplados no 4º boletim de medição analisado:

- Serviços preliminares: No período referente a esta medição, foram executados 5,39% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange à demolição manual de meio fio, locação de container e proporcionalmente os consumos de água e energia, chegando assim o grupo em um total de 100,00%.
- Transporte: No período referente a esta medição, foram executados 9,85% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange o transporte de entulho em caçamba estacionária, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.
- Serviços em terra: No período referente a esta medição, os serviços executados referentes a este grupo já foram completamente executados.

- Instalações elétricas: No período referente a esta medição, foram executados 37,14% dos serviços relacionados a este grupo, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.
- Esquadrias metálicas: No período referente a esta medição, foram executados 100,00% dos serviços relacionados a este grupo, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.
- Vidros: No período referente a esta medição, foram executados 100,00% dos serviços relacionados a este grupo, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.
- Revestimento de paredes: Conforme indicado nos boletins anteriores, os serviços relacionados a este grupo já foram 100,00% concluídos.
- Revestimento de piso: Conforme indicado nos boletins anteriores, os serviços relacionados a este grupo já foram 100,00% concluídos.
- Ferragens: No período referente a esta medição, foram executados 100,00% dos serviços relacionados a este grupo, chegando o grupo em um total de 100,00% já executado.
- Pintura: No período referente a esta medição, foram executados 50,72% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange à execução de pintura látex acrílicos, pintura poliesportiva, pintura com tinta esmalte para esquadrias de ferro, pintura PVA látex e o aluguel mensal de andaime metálico. Diante do exposto, o total acumulado chega a 100,00% dos serviços previstos.
- Diversos: No período referente a esta medição, foram executados 27,77% dos serviços relacionados a este grupo, no que tange à execução de banco floreira, deck, balanço, placa de inauguração, mudas, abertura de cavas, limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria, instalação de lixeira metálica, resina para área de pedras, plaquinhas, floreira, limpeza com ácido muriático, torneiras e placa de entrada. Diante do exposto, o total acumulado chega a 100,00% dos serviços previstos.
- Administração – mensalistas: No período desta medição foi contabilizado o pagamento da administração equivalente aos serviços executados. Desta forma, o percentual total medido é de 30,98% chegando a um acumulado de 100,00%.

Diante do exposto, conclui-se 100,00% dos serviços previstos para obra.

3. Relatório Fotográfico

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6




Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Figura 11

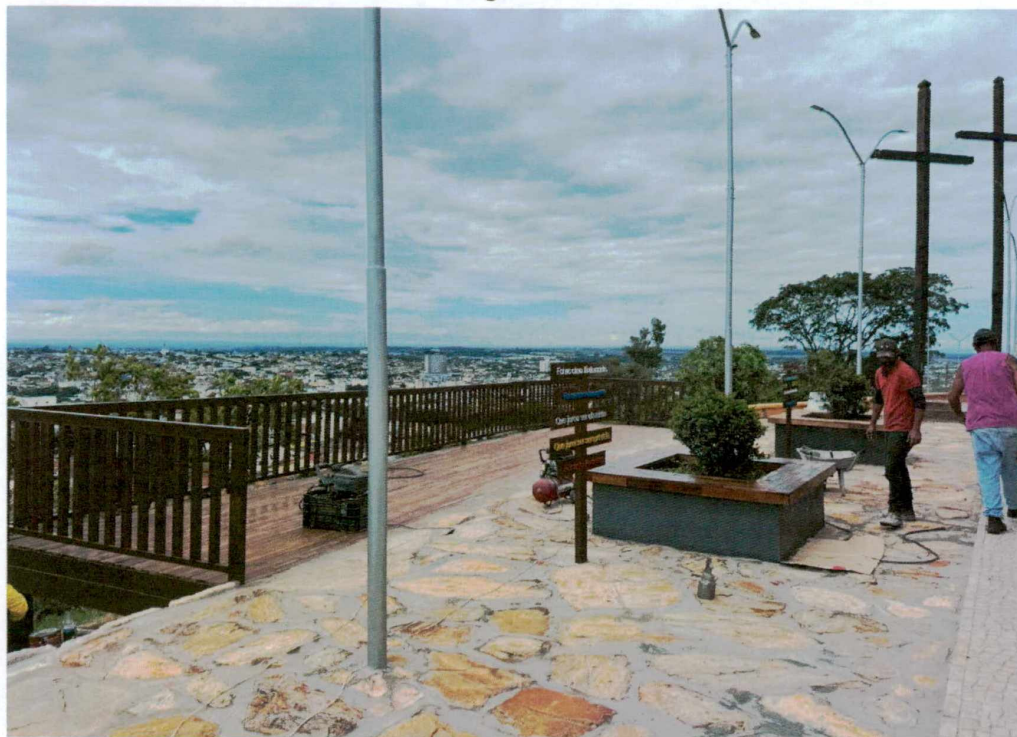


Figura 12



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Figura 13

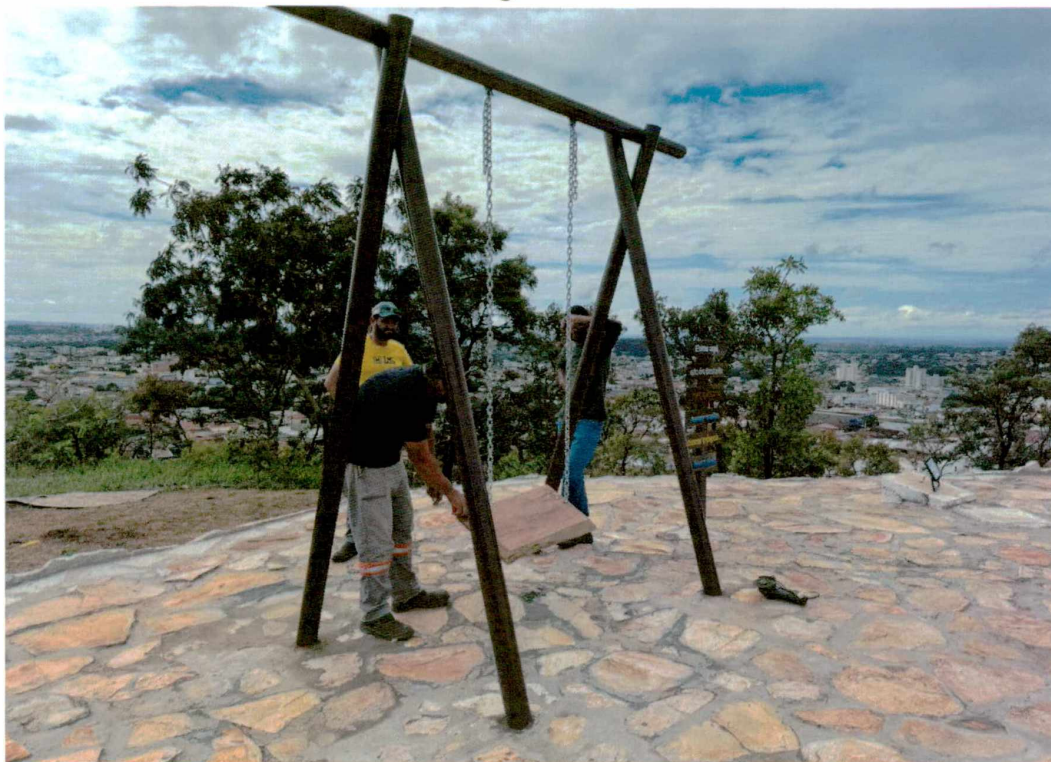


Figura 14




Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Figura 15



Catalão, 03 de dezembro de 2024.


Leonardo Martins
Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Obras
Engenheiro Civil
